



Ibagué Evolucionó.

Secretaría de Infraestructura
Informe de Gestión 2020 – 2023



ANDRÉS



IBAQUE



Secretaría Infraestructura



Introducción

La Secretaría de Infraestructura en el cumplimiento de sus funciones misionales pone a disposición el presente documento el cual describe la gestión realizada, los principales logros y resultados obtenidos durante las vigencias 2020 – 2023, que dan cumplimiento a los objetivos estratégicos trazados en el Plan de Desarrollo "Ibagué Vibra 2020-2023". Igualmente se deja plasmado las obras que vienen en ejecución y las metas que no se alcanzaron.

Esta labor no se hubiera alcanzado sin la asignación de los recursos financieros, el acompañamiento del personal que hace parte de la Secretaría de Infraestructura y del personal de apoyo contratado para el desarrollo de los diferentes proyectos a cargo de esta dependencia.



Cra 2. 17-20
Postal 730006
Teléfono: 2618553 Ext: 208
desarrollosocial@ibague.gov.co





Secretaría Infraestructura



Metodología

El informe de gestión es un documento reglamentado por la Ley 951 de 2005, que tiene como objetivo que la ciudadanía y el equipo del gobierno entrante cuenten con información precisa y oportuna sobre las problemáticas relevantes, el estado de avance de los planes y programas que ejecutó la administración saliente.

En este sentido, y acorde a las directrices dadas por el Departamento Nacional de Planeación y la Función Pública, se realiza el presente informe de gestión de la Secretaría de Infraestructura.

Los contenidos que se proponen asumen el proceso de transición de gobierno y garantizan el desarrollo de los tres momentos propuestos para tal fin, como son: el informe de gestión, la rendición de cuentas donde se integra al proceso de diálogo, y un tercer momento, en el que los insumos del informe de gestión se usan durante cada una de las fases del proceso de empalme, entre la administración saliente y la administración entrante.



Cra 2. 17-20
Postal 730006
Teléfono: 2618553 Ext: 208
desarrollosocial@ibague.gov.co




Aspectos Administrativos

Misión.

Orientar y liderar la formulación y seguimiento de políticas que permitan gestionar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura, contribuyendo a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible del municipio de Ibagué

Organigrama de la Secretaría.

Gráfico 01 Estructura Orgánica Secretaría de Planeación



Fuente: Secretaría de Infraestructura Ibagué

Funciones.

Secretaría de Infraestructura

1. Coordinar de acuerdo con las políticas nacionales, departamentales, el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal, la ejecución de obras de infraestructura y obras públicas en el municipio de Ibagué
2. Ejecutar la construcción, el mantenimiento y conservación de obras de infraestructura y obras públicas que permitan mejorar la movilidad, la recreación, la cultura, la educación y el desarrollo social en el municipio.

3. Vincular a la empresa privada, a las empresas de transporte público y en general, a todos los estamentos interesados en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad, para que conduzcan a un desarrollo social, integral y equitativo, a través de la construcción de nuevas infraestructuras y obras públicas
4. Coordinar con las demás dependencias municipales o entidades públicas y privadas, la ejecución de planes, programas y proyectos que adelante la Secretaría para el cumplimiento de su Misión
5. Elaborar los estudios de factibilidad técnica y económica que deban adelantarse, para el cumplimiento de los objetivos que ocupen a la Secretaría, dentro del Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Ordenamiento Territorial
6. Ejecutar las políticas de inversión en infraestructura y de obras públicas: construcción, rehabilitación y mantenimiento vial, construcción y/o mantenimientos de establecimientos educativos, de salud, recreativos, culturales y sociales, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Inversiones
7. Definir estrategias para implementar programas de Infraestructura vial y obra pública para el municipio de Ibagué
8. Planear, elaborar y validar los aportes técnicos de los análisis del sector, estudios previos, pliegos de condiciones y presupuestos de obra para la contratación, tanto de estudios y diseños, asesorías e interventorías, como de ejecución de obras de Infraestructura y Obra Pública
9. Elaborar proyectos para ser registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, Departamental y Nacional, de acuerdo a la metodología requerida para tal fin
10. Elaborar, revisar, validar y aprobar los estudios y diseños de los proyectos integrales de Infraestructura y Obras Públicas, verificando que los mismos incluyan componentes técnicos, arquitectónicos, urbanísticos, paisajísticos, socioambiental y tráfico, requeridos para la ejecución de los mismos.
11. Adelantar la revisión y actualización de las especificaciones técnicas tanto para estudios y diseño, como para la construcción de proyectos de Infraestructura y Obras Públicas
12. Producir informes relacionados con el seguimiento, control y recepción de las obras y proyectos de infraestructura del espacio público para la movilidad ejecutados por urbanizadores y/o terceros particulares y públicos
13. Establecer, implementar, coordinar, optimizar, ejecutar, reconstruir y evaluar el desarrollo de los proyectos necesarios para la construcción de la infraestructura física del espacio público como son andenes, separadores, sardineles, alamedas y la infraestructura física de los corredores alternativos denominados ciclo rutas en atención a los planes estratégicos de la Administración.
14. Ejercer la interventoría o supervisión de todas las obras públicas y de infraestructura que se ejecuten en el municipio
15. Coordinar con la Empresa de Servicios Públicos la programación de la ejecución de las obras, con el objeto de optimizar la aplicación de los recursos
16. Llevar el control del inventario, debidamente actualizado, de todos los proyectos de infraestructura y obra pública elaborados y ejecutados en el municipio de Ibagué
17. Ejecutar la construcción, el mantenimiento y conservación de obras de infraestructura y obras públicas que permitan mejorar la movilidad, la recreación, la cultura, la educación y el desarrollo social en el municipio

18. Elaborar e implementar la política de gestión integral de vivienda en articulación con las Secretarías de Planeación, Gobierno y Ambiente y Gestión del Riesgo, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal
19. Conocer y decidir de los recursos de apelación contra las decisiones proferidas por los inspectores de policía y/o corregidores en el curso del procedimiento verbal abreviado en lo que tiene que ver con las materias a su cargo, conforme a lo señalado en el Decreto 1000-0801 de 2018

Dirección Técnica

1. Formular y definir la política de construcción, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de Infraestructura: Malla vial urbana y rural y Obra Pública: Equipamientos Urbano y Rural y Hábitat que requiera el Municipio
2. Apoyar la formulación de la política de construcción, mejoramiento, mantenimiento y conservación de las obras públicas y de infraestructura que requiera el Municipio
3. Planear y definir estrategias para ejecutar programas de construcción, mejoramiento, mantenimiento y conservación de las obras publicas y de infraestructura del Municipio
4. Elaborar los diagnósticos, estudios y diseños necesarios para la construcción de obras públicas Infraestructura
5. Adelantar la elaboración de estudios, ensayos de laboratorio, análisis de suelo, levantamiento topográfico y demás estudios que se requieran para el desarrollo de proyectos de infraestructura y obras publica
6. Dirigir y coordinar la elaboración de estudios técnicos para la consecución de recursos económicos ante las diferentes entidades del orden territorial, nacional e internacional
7. Identificar y formular proyectos de inversión para la construcción, mejoramiento, mantenimiento y conservación de la Infraestructura y Obra Pública que requiera el Municipio
8. Elaborar los análisis del sector y estudios previos para la contratación de diagnósticos, estudios, diseños, construcción, mejoramiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura y las obras publicas que requiera el Municipio
9. Promover y apoyar programas y proyectos de hábitat - vivienda de interés prioritario y saneamiento básico, de conformidad con los criterios de focalización reglamentados por el gobierno nacional.
10. Apoyar en la evaluación de procesos contratación de diagnósticos, estudios, diseños, construcción, mejoramiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura y obras públicas que requiera el Municipio
11. Establecer con las demás entidades, las políticas y propósitos que condicionan los proyectos de infraestructura y obras públicas en materia técnica, ambiental y arquitectónica.
12. Supervisar la ejecución de los contratos de consultoría relacionados con infraestructura y obra Publica

Dirección Operativa

1. Ejecutar la construcción, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y conservación de infraestructura, malla vial urbana y rural y de obra pública: equipamientos urbano, rural y hábitat del municipio de Ibagué
2. Ejercer la supervisión de los contratos de obra pública e Infraestructura que celebre el municipio con el fin de garantizar la calidad según las condiciones técnicas de los contratos
3. Administrar y controlar los recursos físicos, maquinaria, equipo y materiales destinados a la construcción y mantenimiento de obras públicas e infraestructura con el fin de obtener un uso óptimo de los mismos
4. Ejecutar y controlar los planes y programas de construcción, conservación y mantenimiento de las obras públicas y de infraestructura municipales
5. Impulsar programas de pavimentación con participación comunitaria, para lo cual podrá celebrar los contratos y/o convenios que sean necesarios, en los términos de las delegaciones que haga el Alcalde
6. Elaborar el plan de mantenimiento del parque automotor del municipio tanto liviano como pesado destinado a las obras de infraestructura y obra pública
7. Elaborar el plan de construcción y/o mantenimiento de las obras públicas y de infraestructura del municipio (malla vial, establecimientos educativos y de salud, inspecciones, edificaciones o espacios públicos).
8. Dirigir, coordinar y responder por los asuntos relacionados con la construcción, mejoramiento, mantenimiento y conservación de las obras públicas y de infraestructura que requiera el Municipio
9. Impulsar programas de pavimentación con la participación de instituciones municipales, privadas y comunitarias, para lo cual podrá celebrar los contratos y/o convenios que sean necesarios, en los términos de las delegaciones que haga el Alcalde
10. Administrar los equipos asignados a la Secretaría para la atención de sus funciones, apoyando cuando se requiera casos de reubicaciones de asentamientos, recuperación física del espacio público, restitución de bienes del Municipio, emergencias y demoliciones

Relación de planta de personal (Despacho y Direcciones).

Tabla 01 Funcionarios de Planta Secretaría de Infraestructura

Área	Secretario o Director	Auxiliares		Técnico		Profesional		Profesional E		Asesores	Total		
		Provis.	Provis.	Carrera	Provis.	Carrera	Provis.	Libre	Carrera	Provis.	Libre		
Despacho	1	1		3					4		3	1	5
Dirección Técnica	1		3	5	1						5	4	1
Dirección Operativa	1		2		2	2					2	4	1
Total	3	1	5	8	3	2	0	4	10	9	7		

Fuente: Secretaría de Infraestructura Ibagué

Cra 2. 17-20

Postal 730006

Teléfono: 2618553 Ext: 208

desarrollosocial@ibague.gov.co

Además de los funcionarios de planta y acorde con los proyectos que desarrolla la actual administración se ha contado con personal contratista de apoyo, distribuidos en los diferentes proyectos que adelanta la Secretaría de Infraestructura.

Nota: No se cuentan con novedades de personal de contrato que se encuentren en estado de embarazo

Cumplimiento del Programa de Gobierno

Tabla 02 Propuestas Plan de Gobierno Vs Resultados obtenidos

PROGRAMA DE GOBIERNO IBAGUÉ VIBRA 2.020-2.023	
PROPUESTAS	RESULTADOS OBTENIDOS
Construcción de 8 escenarios deportivos	SE LOGRO LA CONSTRUCCION DE 4 ESCENARIOS DEPORTIVOS: COLISEO DE COMBATE, COMPLEJO DE RAQUETAS, PISTA BMX Y COLISEO MAYOR SE ENCUENTRAN EN EJECUCION, TEJODROMO, COMPLEJO DE PISCINAS DE LA 42, COLISEO MENOR, COMPLEJO DE PISCINAS RECREODEPORTIVAS.
Mejoramiento de 13 espacios deportivos y recreativos mejorados	A LA FECHA SE HA LOGRADO EL MEJORAMIENTO DE 2 ESCENARIOS DEPORTIVOS: ESTADIO MANUEL MURILLO TORO Y CUBIERTA POLIDEPORTIVO EL PEDREGAL SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN , EL MEJORAMIENTO DE 8 POLIDEPORTIVOS MAS, CON LA CONSTRUCCION DE SUS CUBIERTAS
Construcción y/o mejorar y/o rehabilitar 20.000 metros cuadrados y andenes de la red urbana	SE LOGRO LA CONSTRUCCION DE 28.981 MTS ² EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD
Mejorar y/o construir 300.000 M2 de malla vial urbana (Cód KPT 2402114)	SE LOGRO LA CONSTRUCCION DE 200.490 MTS ² DE MALLA VIAL EN TODAS LAS COMUNAS DE LA CIUDAD
Rehabilitar 300.000 M2 de la vía urbana	SE LOGRO LA REHABILITACION DE 184.705 MTS ² DE MALLA VIAL EN TODAS LAS COMUNAS DE LA CIUDAD
Mantener 4 puentes peatonales en la zona urbana	SE REALIZO MANTENIMIENO AL SECTOR PEATONAL DEL PUENTE CRA 5TA CON CALLE 83

PROGRAMA DE GOBIERNO IBAGUÉ VIBRA 2.020-2.023	
PROPUESTAS	RESULTADOS OBTENIDOS
Construir y/o mejorar 2 puentes peatonales en la zona urbana	SE LOGRO LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES BOX COULVERT DE LA FLORIDA II, Y PUENTE PEATONAL SECTOR CAÑAVERAL
Construir y/o mejorar 2 puentes vehiculares en la zona urbana	SE LOGRO LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BOX COULVERT DE LA FLORIDA II, Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA CRA 5TA CON CALLE 60
Mantener 3 puentes vehiculares en la zona urbana	SE LOGRO REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CINCO PUNTES VEHICULARES EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ: PUENTE CALLE 103 CON AV AMBALA PUENTE CALLE 37 CON AV GUABINA PUENTE CALLE 19 CON CRA 5TA PUENTE RIO CHIPALO CON 5TA PUENTE CRA 5TA CON CALLE 83
Realizar la construcción y/o mantenimiento a 4KM de Ciclo infraestructura urbana (Cód KPT 2402094)	SE LOGRO LA CONTRUCCION DE 7,6 KILOMETROS DE CICLOINFRAESTRUCTURA URBANA UBICADA EN: CICLORUTA CAÑAVERAL 1,7 KM CICLORUTA EL ZORRO PLAN PARCIAL 1KM CICLORUTA COMPLEJO PARQUE DEPORTIVO 4,9 KM
Realizar 1 estudios de pre inversión para sistemas alternativos de transporte	ADJUDICADA LA CONSULTORIA, EN TRAMITE EL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE PUBLICACIÓN
Realizar obras de infraestructura para la mitigación del riesgo (550 mts2)	SE LOGRO LA CONSTRUCCION DE 320 MT3 DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN LOS SECTORES: CAMBULOS DEL VERGEL 200 M3 BOX COULVERT DE LA FLORIDA II 120 M3

PROGRAMA DE GOBIERNO IBAGUÉ VIBRA 2.020-2.023	
PROPUESTAS	RESULTADOS OBTENIDOS
Mejorar y/o adecuar 11 Equipamientos Urbanos.	SE LOGRO 4 INTERVENCIONES REALIZADAS POR GESTORA URBANA E INFIBAGUÉ: INTERVENCION CAM DE LA POLA CENTRO COMERCIAL ANDRES LOPEZ DE GALARZA ADECUACIONES EN LA PERMANENTE CENTRAL DE IBAGUE INTERVENCION DE LA CUBIERTA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL JARDIN EN JECUCION LA INTERVENCION DE 5 PLAZAS DE MERCADO ENTRE INFRAESTRUCTURA E INFIBAGUE, CON RECURSOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Intervenir y mejorar 1816 viviendas urbanas	A LA FECHA SE HA LOGRADO EL MEJORAMIENTO DE 1.688 VIVIENDAS 1.604 DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA 84 EN GESTION COMPARTIDA "SUMANDO SUEÑOS" POR EJECUTARSE EL CONVENIO CON EL DPS BARRIO EL TEJAR CON 287 VIVIENDAS MAS
Gestionar la construcción de 300 viviendas nuevas	SE LOGRÓ GESTIONAR LA CONSTRUCCION DE 308 VIVIENDAS NUEVAS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: GESTION DEL PROGRAMA DE CONTRUCCION 158 VIVIENDAS NUEVAS PROYECTO HATO DE LA VIRGEN GESTION DEL CONVENIO FIRMADO CON LA UNGRD PROGRAMA DE CONTRUCCION 150 VIVIENDAS NUEVAS PROYECTO BALTAZAR
Realizar la construcción y/o mejoramiento Y/o mantenimiento 20 salones comunales	A LA FECHA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL HA REALIZADO LA INTERVENCION DE 14 SALONES COMUNALES ASÍ: 6 REALIZADOS POR INFRAESTRUCTURA, LA CIMA, JORDAN IV ETAPA, EL BUNDE, CANTABRIA, TOLIMA GRANDE, LAS VEGAS 8 REALIZADOS POR LA GESTORA URBANA URB CANTABRIA COMUNA 7; BARRIO LA VEGA COMUNA 7; BARRIO TIERRA GRATA, BARRIO URIBE URIBE; BARRIO JARDIN COMUNEROS; BARRIO GAITAN; ARKAMBUCO; ABIKAIMA. PENDIENTE DE INTERVENIR CON UN NUEVO CONTRATO 18 SALONES COMUNALES POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA. PENDIENTE PROCESOD E INTERVENTORIA Y 7 SALONES COMUNALES MÁS A TRAVES DE CONVENIOS SOLIDARIOS CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL.






Fuente: Secretaría de Infraestructura Ibagué

Aspectos Estratégicos y Misionales

A continuación, se describe los resultados obtenidos en cada uno de las metas de producto definidas en el Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría de Infraestructura, por Dirección.

Dirección Técnica

Tabla 03 Ejecución Física Metas de Producto

ODS	Descripción Meta Producto	Meta Cuatrienio	Ejecutado 2020 - 2023
	Construcción de escenarios deportivos	8	4
	Mejoramiento de espacios deportivos y recreativos mejorados	13	2
	Mejorar y/o adecuar 11 Equipamientos Urbanos.	11	4
	Intervenir y mejorar 1816 viviendas urbanas. (Cód KPT 4001015)	1816	1.688
	Gestionar la construcción de 300 viviendas nuevas (Cód KPT 4001014)	300	308
	Realizar la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento 20 salones comunales	20	14

Fuente: Secretaría de Infraestructura Ibagué

Dimensión: Ibagué Socio Cultural

Sector: El Deporte y la Recreación vibran con Oportunidad y Bienestar

Programa: Formación y Preparación de Deportistas

Subprograma: Formación y Preparación de Deportistas

1. Meta: Construcción de escenarios deportivos

Resultados obtenidos: 50% de ejecución, correspondiente a 4 escenarios deportivos como lo son: COLISEO DE COMBATE, COMPLEJO DE RAQUETAS, PISTA BMX Y COLISEO MAYOR

Que no se alcanzó a desarrollar:

- **PISCINAS DE LA 42 (EN EJECUCIÓN)**

Escenario Deportivo	Avance Obra %
PISCINAS 42	49.47%

ACCIONES DESARROLLADAS

- Soldadura de vigas y trampolín en la piscinas de clavados.
- Aplicación de cromato de zinc azul 2 planta liga combate
- Perforaciones de anclajes escalera punto fijo #2
- Amarre de acero y encoframiento de escaleras punto fijo#2
- Aplicación de sikadur 32 y sikarepair 220
- Aplicación de sikadur 32 y sikarepair 220 piscinas olimpicas
- Terminado de impermeabilizacion sika piscinas olimicas
- Amarre de acero de dados de refuerzo
- Fundida de dado de refuerzo concreto 4,000 PSI
- Amarre de acero de dado de pantalla eje 9B
- Encoframiento dado, vigas (vc-1,vc-5) eje 9B
- Amarre de acero de losa placa del eje 7B a 8B
- Encoframiento y amarre de acero de vigueta V-1
- Fundidad de concreto 4,000 PSI placa losa
- Fundida de vigueta V-1 concreto 4,000 PSI
- Demolición de muro existente eje 2 pantalla
- Fundida de muro rompe olas piscinas olímpicas
- Desmonte de andamos y parales zona pasarela
- Limpieza bobcat zona gradería
- Encoframiento escalera punto fijo dos.
- Fundida de concreto 4,000 PSI escaleras.
- Anclajes y amarre de acero de escaleras punto fijo dos.
- Descalificación de pared zona baños doping.
- Adherencia de enchape baños zona doping.
- Aplicación de sika piscinas olímpicas
- Fundida de concreto rompe olas piscinas olímpicas
- Nivelación y soldadura de vigas estructura acceso deportistas
- encoframiento pantalla del eje 9B
- Amarre de acero, encoframiento de viga guadera corte 6B - 6A
- Fundida de concreto 4,000 PSI viga guadera corte 6B - 6A
- Fundida de concreto 4,000 PSI vigueta VT-4 entre eje 7 y 8

- Agrietamiento de material B/200 punto fijo #2
- Lleno y compactación de material B/200
- Limpieza de graderías nuevas
- Aplicación de sikadur 32 y sikarepair 220, reparación de fisuras
- Perforaciones, anclajes y amarre de acero escalera punto fijo #2
- Encoframiento y fundida concreto 4.000 PSI escaleras punto fijo #2
- Resoldado de estructura metálica plataforma de clavados
- Resoldado de estructura cubierta acceso deportistas
- Formaleta para placa de cierre estructura clavados
- Compactación de suelo, amarre de acero zona pasarela
- Enchape de baldosa baños zona liga combate segunda planta
- Pruebas de densidad zona gradería
- Armado de andamios y amarre de acero viga gualdera corte B-A eje 7
- Encoframiento y fundida concreto 4.000 PSI viga gualdera corte (B-A) eje 7
- Amarre de acero viga gualdera eje 9
- Encoframiento y fundida de concreto 4.000 PSI viga gualdera eje 9
- Encoframiento y fundida de concreto 4.000 PSI vigueta (V-1)
- Fundida de vigueta (VT-4) conexión de eje 7 a 8
- Fundida de viga de cimentación (VC-5) conexión de dados eje 9
- Anclajes de ménsula eje 3
- Demolición de muro existente liga combate segunda planta
- Descalificación de muros laterales piscinas olímpicas
- Fundida de escalones zona pasarela
- Encoframiento de vigueta (VT-5) eje 7 a 8
- Fundida y tallado de vigueta (VT-5)
- Encofrado de vigas (VP-1, VP-2) eje 8B a 9B
- Fundida de vigas (VP-1, VP-2) eje 8B a 9B
- Armado de cofres para escalones zona gradería
- Excavación manual viga de cimentación eje 9C
- Soldadura de rompe vientos estructura metálica
- Demolición de malla eslabonada zona deportistas
- Descalificación de pared zona acceso deportistas
- Pañete de muro contención zona liga combate
- Excavación manual dado de refuerzo eje 10C
- Armado de formaletas placa losa eje 8B a 9B



Registro Fotográfico





INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
19/09/2023 15:09:26



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
19/09/2023 15:09:26



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
22/09/2023 15:30



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
15/09/2023 15:48:41



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
25/09/2023 10:27:00



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
25/09/2023 14:37:30









INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
28/09/2023 10:32:34



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
29/09/2023 08:33:37



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
29/09/2023 10:00:00



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
29/09/2023 15:00:28



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
26/09/2023 11:00:30



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
27/09/2023 15:31:51





INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
28/09/2023 11:44:24



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
16/09/2023 08:48



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
27/09/2023 10:21:47



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
29/09/2023 09:06:33



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
04/10/2023 15:31:40




INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
04/10/2023 15:51:05







INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
05/10/2023 10:29:07

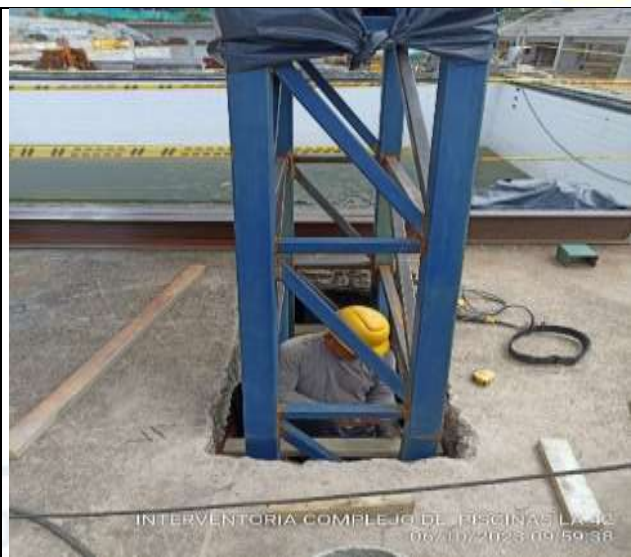

INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
05/10/2023 09:59:38



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
06/10/2023 10:13:52



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
05/10/2023 09:30:51



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
05/10/2023 09:41:09



INTERVENTORIA COMPLEJO DE PISCINAS LA 42
05/10/2023 09:31:14








• **TEJODROMO (EN EJECUCIÓN)**

Escenario Deportivo	Avance Obra %
TEJODROMO	85%

ACCIONES DESARROLLADAS

Semana 70 del 18 al 23 de septiembre de 2023


Durante la semana número 70 se desarrollaron las siguientes actividades:

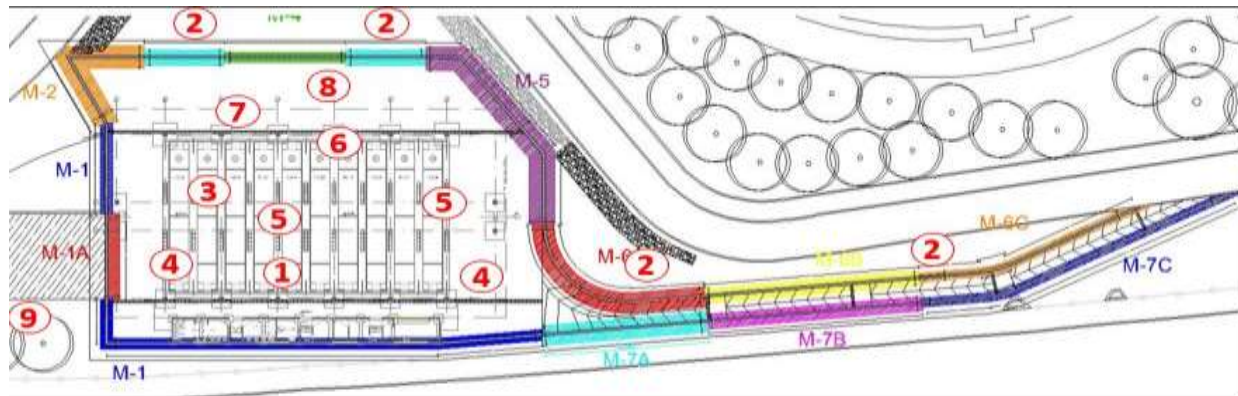

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Fabricación de canal en lámina galvanizada 2. Siembra de césped en taludes 3. Montaje de cubierta en teja UPVC 4. Montaje de arriostramiento para estructura metálica 5. Aplicación de pintura en estructura metálica | <ol style="list-style-type: none"> 6. Fabricación de módulos para soporte de celoscreen 7. Instalación de canal ACO 8. Conformación y compactación de subrasante para placas de contrapiso 9. Siembra de árboles en talud occidental |
|--|--|

Semana 71 del 25 al 30 de septiembre de 2023

Durante la semana número 71 se desarrollaron las siguientes actividades:

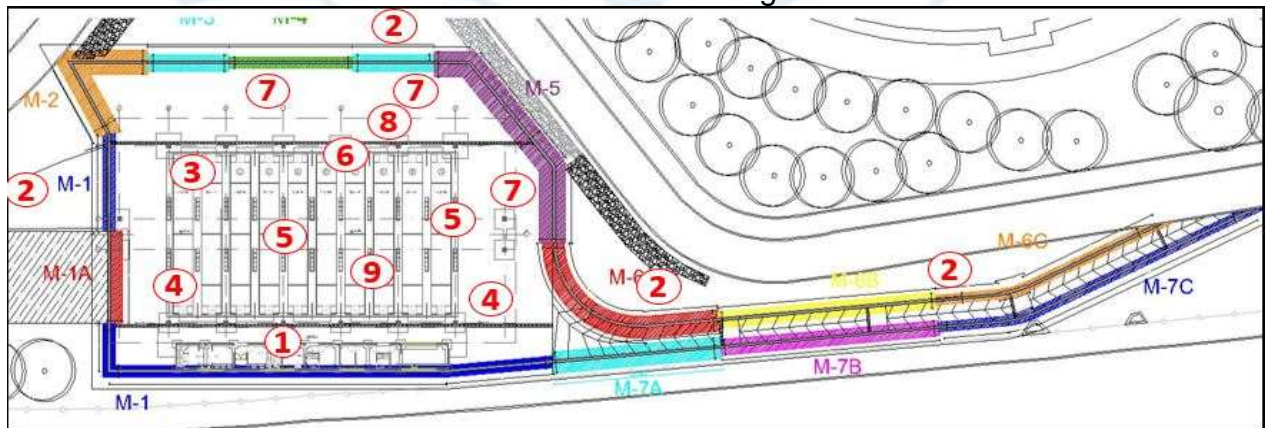


- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instalación de canal en lámina galvanizada 2. Siembra de césped en taludes 3. Aplicación de anticorrosivo en estructura para celoscreen 4. Montaje de vigas para estructura metálica 5. Aplicación de pintura en estructura metálica | <ol style="list-style-type: none"> 6. Fabricación de módulos para soporte de celoscreen 7. Fundida de placa de contrapiso 8. Conformación y compactación de subrasante para placas de contrapiso 9. Instalación de red de iluminación de escenario principal |
|---|--|





Semana 72 del 2 al 7 de octubre de 2023


Durante la semana número 72 se desarrollaron las siguientes actividades:

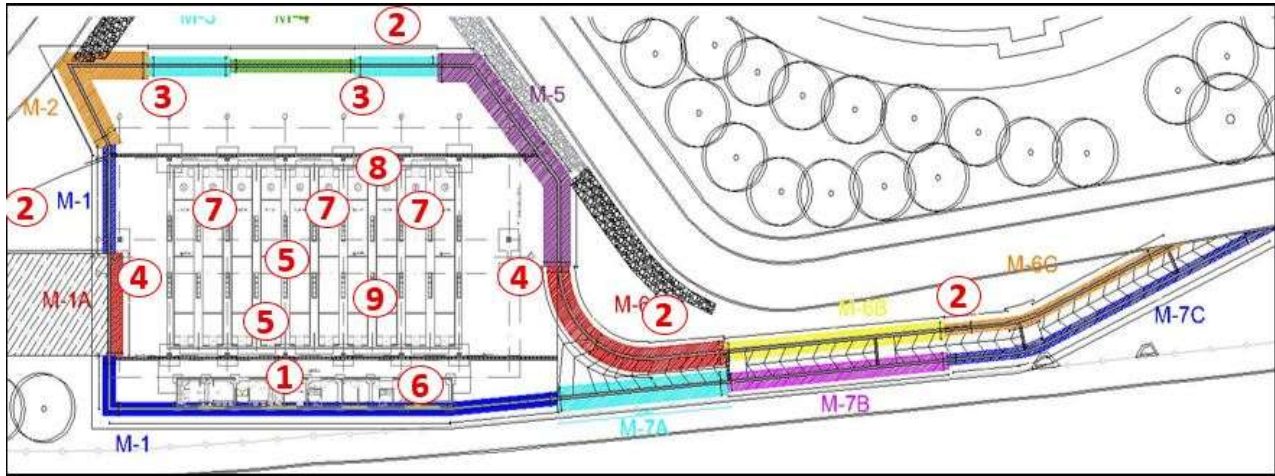

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instalación de canal en lámina galvanizada 2. Siembra de césped en taludes 3. Montaje de estructura de soporte para celoscreen 4. Montaje de vigas para estructura metálica 5. Aplicación de pintura en estructura metálica | <ol style="list-style-type: none"> 6. Instalación de reja en cafetería 7. Fundida de placa de contrapiso 8. Conformación y compactación de subrasante para placas de contrapiso 9. Instalación de red de aguas lluvias |
|--|--|

Semana 73 del 9 al 14 de octubre de 2023

Durante la semana número 73 se desarrollaron las siguientes actividades:

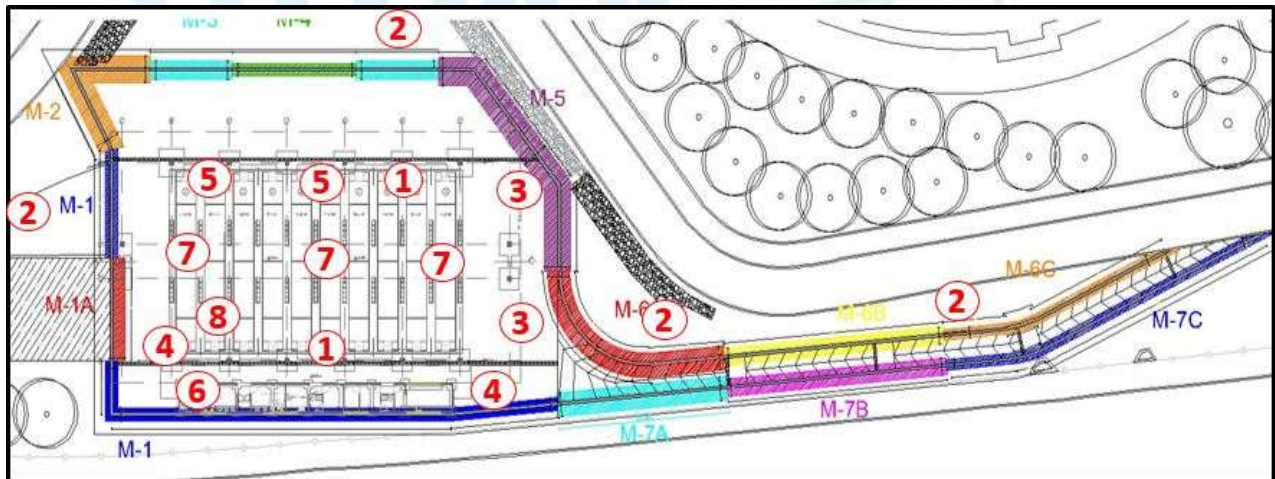

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instalación de tubos metálicos para cerramiento de canchas 2. Siembra de césped en taludes 3. Montaje de estructura de soporte para celoscreen 4. Aplicación de pintura en estructura metálica y pérgola 5. Corte de juntas en placas de contrapiso | <ol style="list-style-type: none"> 6. Instalación de divisiones en acero inoxidable 7. Fundida de placa de contrapiso 8. Conformación y compactación de subrasante para placas de contrapiso |
|--|---|





Registro Fotográfico



Imagen 1: Fabricación e instalación de canal en lamina galvanizada.

Imagen 2: Fabricación e instalación de módulos para soporte de Celoscreen



Imagen 3: Conformación y compactación de base granular.

Imagen 4: Placas de contrapiso en área de competencia.



Imagen 5: Aplicación de pintura en baranda perimetral



Imagen 6: Siembra de césped en taludes.



Imagen 7: sistema de red de Iluminación en el área de competencia.



Imagen 8: Instalación de reja principal de cafetería.

Los Proyectos que se relacionan a continuación se encuentran en desarrollo por parte de la Gobernación del Tolima – Secretaría de Infraestructura y Habidad.

- **COLISEO MENOR (EN EJECUCION)**

Escenario Deportivo	Avance Obra %
COLISEO MENOR	51,8%

- **COMPLEJO DE PISCINAS RECREODEPORTIVAS (EN EJECUCION)**

Escenario Deportivo	Avance Obra %
COMPLEJO DE PISCINAS RECREODEPORTIVAS	82%





2. Meta: Mejoramiento de espacios deportivos y recreativos mejorados

Resultados obtenidos: 15% de ejecución, derivado del mejoramiento del Estadio Manuel Murillo Toro y el Pedregal.

Que no se alcanzó a desarrollar:

- **PARQUE SACUDETE**

Nombre del Indicador de la meta de producto	Avance Obra %
PROYECTO SACUDETE	20,43%

El Proyecto SACUDETE al parque tipo 2, opción 1 ubicado en la comuna 3 del municipio de Ibagué departamento del Tolima, a la fecha se encuentra suspendido desde el 01 de marzo del 2023, donde y conforme a lo reportado por la interventoría CONSORCIO INTER SACUDETE 2022 presenta una ejecución del 20,43%.

Se suscribió el acta de adición No 1, en la cual se justifica un ajuste económico del 39.79% respecto al valor inicial del contrato equivalente a SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$798.956.995) M/CTE) y prórroga No 2, por un término de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de terminación de la prórroga No1.

Se suscribió el acta de reinicio para el contrato de obra No 2396-2022 y para el contrato de interventoría No 2407-2022 con fecha del 16 de agosto de 2022

Este proyecto consta de dos componentes:

- **COMPONENTE 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS**

PORCENTAJE EJECUTADO	100%
----------------------	------

- **COMPONENTE 2: CONSTRUCCIÓN**

PORCENTAJE EJECUTADO	20,43%
PORCENTAJE POR EJECUTAR	79,57%





ACCIONES DESARROLLADAS:

- Relleno y compactación en recebo común en edificación.
- Armado y figurado de acero para vigas de enlace.
- Fundida de vigas de cimentación 0.3 x 0.3 m de 3000 PSI
- Mampostería en bloque estructural para gradas de cancha inferior.
- Losa en concreto graderías 3000 PSI e =0.1m grada 4 y 5 de cancha múltiple.
- Compactación de recebo para cancha múltiple.
- Refuerzo malla electrosoldada.
- Fundida de 8 módulos de losa para cancha múltiple.
- Relleno y compactación en recebo común en edificación.
- Fundida de vigas de cimentación 0.3 x 0.3 m de 3000 psi eje e y d
- Suministro y figurado de acero de flejes para columnas.
- Refuerzo malla electrosoldada para losa cancha múltiple
- Fundida de 4 módulos de placa para cancha múltiple.
- Dilatación o corte en concreto con máquina de disco
- Fundida de placa de contrapiso concreto de 3000 PSI
- Instalación hidráulica

Registro Fotográfico









- **REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ**





NO	BARRIO	COMUNA/CORREGIMIENTO
1	ONZAGA	4
2	TULIO VARON	8
3	SAN JUAN DE LA CHINA	11
4	VILLA RESTREPO	8
5	CIUDELA COMFENALCO	9
6	LOS ANGELES	6
7	TOLIMA GRANDE	7
8	VILLA DEL SOL	8

Objeto del proyecto	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto Oficial (pesos incluido IVA)	Lugar(es) de ejecución del Contrato
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS	DOCE MIL MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS (\$12.000.852.202)	Ciudad de Ibagué

Objeto del proyecto	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto Oficial (pesos incluido IVA)	Lugar de Ejecución
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"	CINCO (5) MESES	MIL NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$1.009.566.250) M.CTE. INCLUIDO IVA	MUNICIPIO DE IBAGUÉ






Teniendo en cuenta que el proceso de obra se adjudicó mediante Resolución No. 2300-000158 del 25 de agosto de 2023 y la interventoría mediante Resolución No. 2300-00208 del 25 de octubre de 2023.

A la fecha se está realizando los tramites de legalización por parte de los contratistas y de esta manera suscribir el Acta de Inicio.

- **REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ACUÁTICO RECREODEPORTIVO UBICADO EN EL PARQUE DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE**

- Plazo estimado Ejecución en Meses: CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO
- Presupuesto: \$ 12.603.555.313,00
- Proyecto: El deporte y la recreación vibran con oportunidad y bienestar.
- Ubicación: Parque Deportivo
- Región: Centro sur amazonia
- Departamento: Tolima
- Municipio: Ibagué
- Centros poblados: casco urbano
-

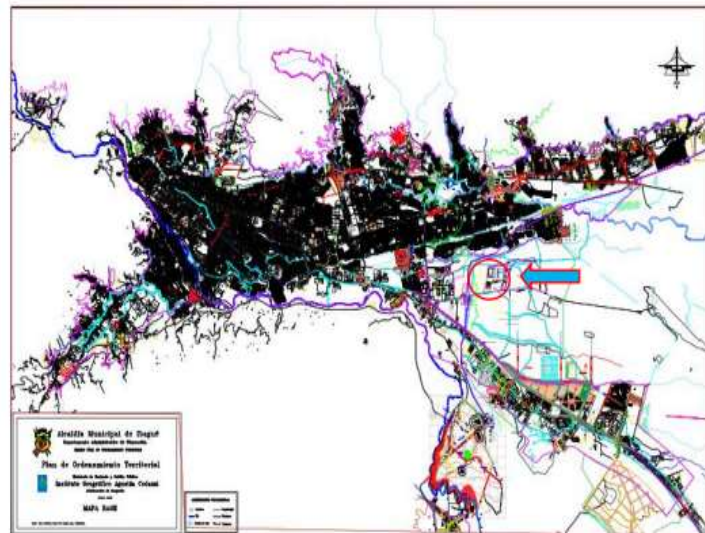



El proyecto a desarrollar que tiene por objetivo las REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO ACUATICO RECREODEPORTIVO UBICADO EN EL PARQUE DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, se encuentra ubicado en la entrada de la vía que comunica la calle Pedro Tafur con el aeropuerto municipal. Este escenario recreativo contó con diferentes piscinas infantiles que dotaban la ciudad, con un uso destinado al ocio, el juego y la recreación sin la exigencia de la competitividad; pero por el deterioro progresivo del mismo, suspendieron actividades, generando una pérdida de esta dotación para la ciudad.

El proyecto desarrolla ejecuciones de orden civil de construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y adecuación de infraestructura, la particularidad de las intervenciones se describe de la siguiente manera:

- ✓ Construcción de edificación para servicios y funcionamiento.
- ✓ Obras de remodelación, mantenimiento y adecuación de infraestructura existente.
- ✓ Construcción de piscinas recreo deportivas.
- ✓ Mejoramiento y adecuación de piscinas recreo deportivas.
- ✓ Construcción de urbanismo y paisajismo.
- ✓ Dotación de mobiliario y adecuaciones generales.

CONCLUSIONES:

Con el objetivo de adelantar los tramites de los estudios y diseños la Secretaría de Infraestructura solicito ante la Curaduría Urbana Uno la licencia de construcción para cumplir con las exigencias a nivel normativo del proyecto, además que para iniciar la estructuración del proceso de licitación pública es necesario contar con la documentación exigida por el Decreto 1469 de 2010. Por lo anterior, dicha curaduría expide Resolución Número 73001-1-23-0416 del 01 de septiembre de 2023.

En ese sentido, el proyecto a la fecha se cuenta con toda la documentación requerida de manera técnica y jurídica, pero en vista que para iniciar con el proceso de licitación pública se requiere de un tiempo prudencial, adicionalmente que también se requiere de iniciar proceso de manera paralela de Concurso de Méritos Abiertos para adjudicar la interventoría, no ha sido posible adelantar lo anteriormente mencionado toda vez que estamos en un panorama incierto con respecto al tiempo que queda para la culminación del año 2023, debido a que dichos procesos son objeto de muchas observaciones y presentación de muchas ofertas, lo que ocasiona que los tiempos estipulados en el SECOP II se alarguen y estemos en riesgo de pasar la vigencia.





- **ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ**



Zona 1: Bajos del Centenario (Eventos culturales, musicales, etc.)

Zona 2: Medios del Centenario (Concha Acústica, Servicios, Circuito de Trote, zonas de permanencia, etc.)

Zona 3: Altos del Centenario (Zona deportiva y lúdica para niños)

Se evidencia, el deterioro que presenta el Parque Centenario y no permite el uso total de los diversos usuarios, el cual es un espacio del que se han apropiado tradicional y culturalmente los Ibaguerenses

Por lo tanto, el Proyecto está enfocado en la rehabilitación y adecuaciones locativas de las 3 Zonas expuestas anteriormente; sin necesidad de hacer una intervención agresiva ambiental (tala de arboles), la cual no tendría fundamento técnico para la ejecución y/o desarrollo del proyecto.

El proyecto “Adecuación Y Mejoramiento Del Urbanismo Y Paisajismo Del Parque Centenario En La Ciudad De Ibagué” dentro de su presupuesto presenta:





- Adecuación y mejoramiento de Zona 3 (Deportiva y Lúdica, avistamiento de aves, etc.)
- Accesos del Parque Centenario
- Adecuación y rehabilitación de Zona 2 (Circuito de trote, zonas de permanencia, rampas de acceso, senderos, servicios, etc.) y Zona 1 (Espacios para actividades culturales, musicales etc.)
- Rehabilitación de la Concha Acústica y sus camerinos.
- Componente Eléctrico
- Obras de Mitigación y contención en zonas afectadas de acuerdo a estudio especializado de Consultoría
- Adecuación del Puente de Calle 10 (Elementos verticales, circulación y flujo del Túnel)

PRESUPUESTO OBRA: \$7.006.977.136
PRESUPUESTO INTERVENTORIA: \$675.249.964
TOTAL : \$7.682.227.100

CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta la necesidad que presenta el parque centenario, la Administración municipal "Ibagué Vibra 2020 — 2023", Adelanto las gestiones administrativas, técnicas, jurídicas y presupuestales con el fin de efectuar las adecuaciones pertinentes a las construcciones existentes en el sector del parque centenario que presentan mayor necesidad de intervención por falta de mantenimiento

En cumplimiento a la labor que desempeña la secretaria de Infraestructura Municipal, Dentro de este plan de desarrollo " 2020 - 2023", existe el sector 5. EL DEPORTE Y LA RECREACION VIBRAN CON OPORTUNIDAD Y BIENESTAR quien a su vez cuenta con el PROGRAMA 1 Formación y preparación de Deportistas, SUBPROGRAMA 1. Formación y preparación de Deportistas, Dimensión: Ibagué Socio Cultural.

Ahora bien, teniendo como objetivo principal realizar el mejoramiento estético de las instalaciones del parque centenario tales como, senderos, mobiliarios, entre otros aspectos, este despacho adelanto la etapa precontractual de la licitación pública, AL-LOP2452-2023, cuyo objeto contractual es "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO Y PAISAJISMO DEL PARQUE CENTENARIO DE LA CIUDAD DE IBAGUE" , mediante la elaboración del Análisis del Sector y Estudios Previos que originaron la viabilidad de la construcción del proyecto de Pliego de Condiciones en observancia de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Y el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015.

En ese orden de ideas a partir del día (02) de agosto de 2023, se dio Publicación del proceso en la Plataforma SECOP II del proyecto de pliego de condiciones y demás





documentos previos, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015. Así mismo, el día 04 de septiembre de 2023 mediante Resolución No. 165, se ordenó la apertura del proceso de licitación pública y fueron designados los profesionales adscritos a la secretaria de infraestructura que conforman el comité evaluador.

En ese orden de ideas, actuando conforme a derecho y en aras de dar tranquilidad a los observantes del proceso licitatorio AI-LOP-2452-2023, la Administración municipal — Secretaria de Infraestructura determino dar cumplimiento a las estipulaciones del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, específicamente a las disposiciones consagradas en el artículo No.93 , el cual determina en los numerales No1° y No, 2° , las causales de revocatoria al acto administrativo de apertura para este caso en concreto:

- ✓ Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley"
- ✓ "Cuando no estén conformes con e/ interés público o social, o atenten contra él"

Por lo antes dicho, este despacho analizo detenidamente el escenario de confusión originado en los argumentos facticos de los observantes que representan el interés público y social del proyecto "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO Y PAISAJISMO DEL PARQUE CENTENARIO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ" en el municipio de Ibagué y considero dar prevalencia y relevancia a las observaciones presentadas en el marco de la ejecución planeada en beneficio de los ibaguereños , realizando la revocatoria del acto administrativo con numero de Resolución 2300-000176 del 11 de septiembre de 2023, que dio apertura al proceso licitatorio AI-LOP-2452-2023, para que se evalúen las consideraciones que dieron alcance a las no conformidades puestas en conocimiento por parte de la ciudadanía a través de la plataforma SECOP II, para que se procedan a hacer las verificaciones correspondientes , en aras de prever un agravio injustificado.

En ese sentido, este despacho ha venido realizando distintas socializaciones con la Secretaría de Cultura dando como resultado el siguiente concepto:





MEMORANDO

1900- 042727

Ibagué,

PARA: SHARON DAYANA GUZMÁN GONZÁLEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DE: SECRETARIA DE CULTURA

ASUNTO: proyecto "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO Y PAISAJISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGÜE".

Respetada Secretaria,

Reciba un cordial saludo a través de la Secretaría de Cultura.

El motivo de la presente comunicación es para informar que una vez revisado proyecto denominado "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO Y PAISAJISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGÜE Y RECUPERACIÓN DEL ESCENARIO CONCHA ACUSTICA GARZON Y COLLAZOS". Se emite **concepto favorable** para la adecuación y mejoramiento del parque Centenario. Es clara la intervención a realizar en el Parque Centenario, según lo citado en el proyecto es un mantenimiento que no afectará ni involucrará tala de árboles, afectación del suelo o retiro de plantas de especies endémicas y según compromisos de la documentación aportada la Concha Acústica estará sujeta a solo a un mantenimiento básico que implica acciones correctivas y preventivas simples.

Es importante resaltar que la Secretaría de Cultura realizará el seguimiento a todo el proceso de intervención en pro de garantizar la salvaguarda y protección del Bien de Interés Cultural y el respeto por la zona de influencia del mismo. Este concepto se hará efectivo en armonía una vez sea emitido el concepto en estado



Calle 10 No. 4-55
Código Postal 730006
Teléfono: 261277
cultura@ibague.gov.co



www.ibague.gov.co

Página 1 | 5



**SECRETARIA DE CULTURA
DESPACHO**

favorable del consejo Departamental de Patrimonio, según artículo séptimo del Decreto 117 de 2018. Esto en concordancia al ser un bien en escala de mayor jerarquía municipal, departamental y nacional (Decreto municipal 116 del 2000).

Es importante que el contratista a cargo de la obra cuente dentro de su equipo de con personal profesional y técnico con experiencia en mantenimiento de Bienes de Interés Cultural Inmueble y así mismo con especialistas en manejo ambiental.

Igualmente es sugerencia de esta Secretaria antes de colgar unos documentos de estudios previos definitivos revisar el anexo emitido. Este anexo compila errores que no interfieren con la favorabilidad de concepto pues son de forma en cuanto a la presentación, si se realizan la revisión de los mismos puede expresar de maneja más clara el proyecto, agradecemos enviar copia a este despacho.

DIANA MARÍA LONDOÑO GÓMEZ
Secretaria de Cultura

Proyectó: Victoria Casabianca - Profesional Especializado





Como también actas de reunión del 10, 11 y 12 de octubre con la comunidad del sector, veedurías, ingenieros, arquitectos y demás personas interesadas del proyecto, con el objetivo de aclarar todas las dudas al proyecto.

Por último, el proyecto a la fecha se cuenta con toda la documentación requerida de manera técnica y jurídica, pero en vista que para iniciar con el proceso de licitación pública se requiere de un tiempo prudencial, adicionalmente que también se requiere de iniciar proceso de manera paralela de Concurso de Méritos Abiertos para adjudicar la interventoría, no ha sido posible adelantar lo anteriormente mencionado toda vez que estamos en un panorama incierto con respecto al tiempo que queda para la culminación del año 2023, debido a que dichos procesos son objeto de muchas observaciones y presentación de muchas ofertas, lo que ocasiona que los tiempos estipulados en el SECOP II se alarguen y estemos en riesgo de pasar la vigencia.

3. Meta: Mejorar y/o adecuar 11 Equipamientos Urbanos.

Resultados obtenidos: 36% de ejecución, correspondiente a 4 intervenciones adelantadas por parte de la Gestora Urbana e INFIBAGUE, entre las que se encuentran: Cam La Pola, C.C Andrés López de Galarza, Permanente Central, Plaza del Jardín

Que no se alcanzó a desarrollar:

Históricamente las plazas de mercado han tenido un valor enorme en los aspectos culturales y comerciales de la ciudad. Su desarrollo ha sido paulatino conforme al progreso y crecimiento de la ciudad iniciando desde las primeras comunas más al occidente con la plaza de la 14, 21 y 28 y aumentando su cobertura con equipamientos hacia el oriente de la ciudad con la consolidación de la plaza del Jardín y el salado. Ofreciendo un doble beneficio; pues provee a el sector rural de equipamientos que le permiten distribuir los productos que se originan en nuestro campo y a su vez ofrece a la cabecera municipal la posibilidad de adquirir excelentes productos a un precio favorable.

Dado lo anterior se determinan que la población beneficiada con las intervenciones no solo se reduce a los adjudicatarios de cada una de las plazas. El alcance las de las inversiones redunda en toda la población e incluso foráneos, por lo tanto, se estima un marco referencial de 543.555 personas que son potencialmente beneficiadas con las ejecuciones.

INFIBAGUE ejecuta con recursos de la Secretaría de Infraestructura intervenciones en las 5 plazas de mercado buscando que las mismas cuentan con mejoras ostensibles en su aspecto y funcionalidad La inversión se ha distribuido de una manera directamente proporcional acorde a la situación de deterioro, la mayor afluencia, y el marco referencial de necesidades, no obstante, lo anterior se procuró porque cada una de las plazas contara con intervenciones.





A partir de las necesidades palpables en los equipamientos comerciales se está realizando el siguiente contrato.

	OBRA	INTERVENTORIA
CONTRATO	350	002
	12 DE DICIEMBRE 2022	11 DE ENERO 2023
OBJETO	"Contratar el mantenimiento y adecuaciones locativas de las PLAZAS de Mercado del municipio de Ibagué"	"Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica para el contrato de mantenimiento y adecuaciones locativas de las PLAZAS de mercado del municipio de Ibagué"
VALOR	\$ 682'534.147 INICIAL \$ 0.00 ADICIONAL	\$ 32'918.052,51 INICIAL \$15'827.000 ADICION \$ 48'745.052,51 TOTAL
PLAZO	45 DIAS INICIAL 30 DIAS PRORROGA	60 DIAS INICIAL 30 DIAS PRORROGA
EMPLEOS GENERADOS	4 PROFESIONALES Y 15 TECNICOS.	3 PROFESIONALES
TERMINACION	suspendido	suspendido

El contrato reporta un avance del 80% y las actividades más representativas son pinturas al exterior e interior con énfasis en zonas manejo de alimentos como famas y restaurantes utilizando en estas, pinturas epoxicas de fácil limpieza y preparadas para evitar la formación de moho y hongos. Caja inspeccionable para recolección de escamas en la plaza de la 28 zona de lavadero de pescado, remplazo de portones que presentaban deficiencias técnicas, oxidación, suciedad, algunas cubiertas que contribuían a la humedad al interior de las plazas fueron reparadas y se reconstituyeron canales, se doto de pisos en zonas de cárnicos y pescaderías para propender por la asepsia, los depósitos de basuras recibieron especial atención con la reconstrucción de las placas contra piso en concreto y la pintura en material epóxico, se renovó la iluminación en zonas específicas de las 5 plazas. Entre otras actividades que requerían de atención técnica.

RECURSOS EN EJECUCION	\$761.090.567
FUENTE DE RECURSOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNA O CORREGIMIENTO	COMUNA 1,7,8,10
BARRIO O VEREDA	CENTRO, HIPODROMO, JARDIN, SALADO

4. Meta: Intervenir y mejorar 1816 viviendas urbanas. (Cód KPT 4001015)


Resultados obtenidos: 93% de ejecución, correspondiente a 1.688 Mejoramientos






- A través del El Programa Mejora Mi Casa se adelantó un total de 1.591 mejoramientos
- Adicionalmente a través de sumando sueños, método “Gestión Compartida” se busco beneficiar a cerca de 300 familias más. A la fecha se han beneficiado 97 familias
- El balance general acumulado de esta meta desde el año 2.020 al 31 de OCTUBRE de 2.023 es de 1.688.

Registro Fotográfico

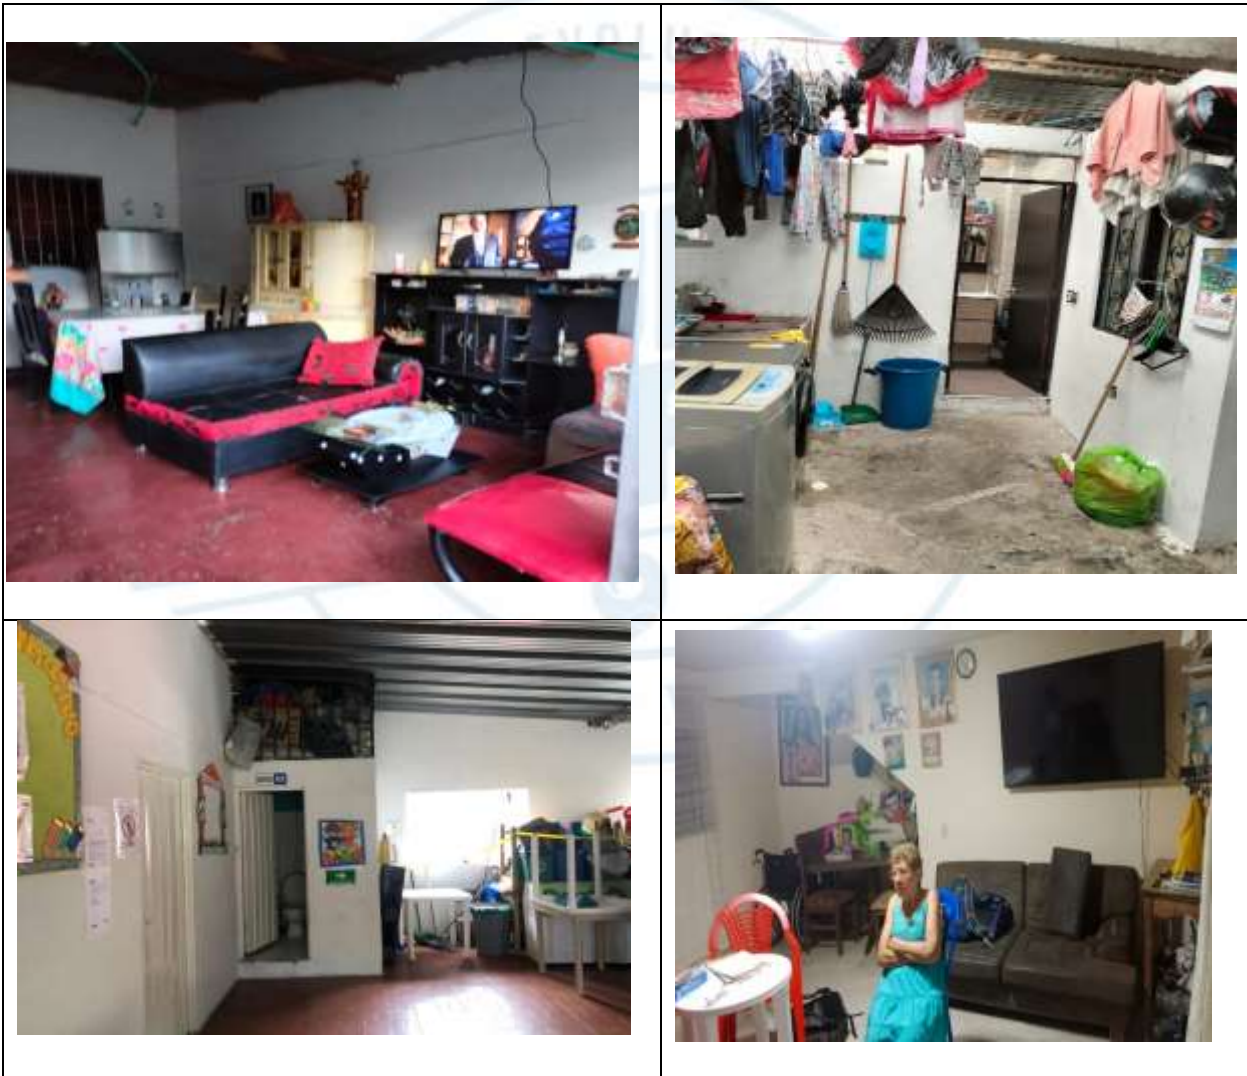

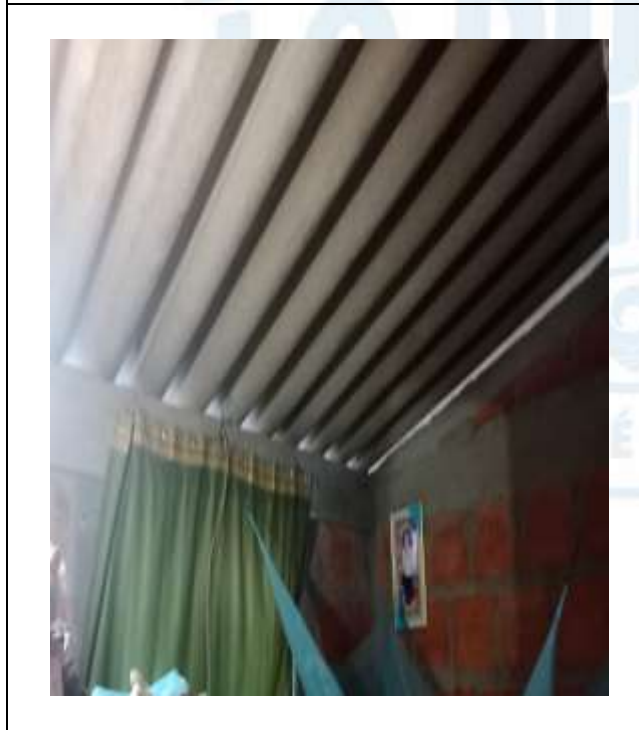



Que no se alcanzó a desarrollar

El municipio de Ibagué suscribió el 22 de julio de 2022, convenio interadministrativo con el DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ, “DPS -FIP”, el Convenio 568 FIP DE 2022, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y LA ENTIDAD TERRITORIAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO, para el mejoramiento de 247 viviendas en Terrazas del Tejar.

Convenio No.	568 FIP julio 22 de 2022
Entidad contratante:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
Nit:	900.039.533-8
Nombre del alcalde:	ANDRES FABIAN HURTADO BARRERA
Identificación:	C.C. 93.180.727
Entidad territorial	MUNICIPIO DE IBAGUE – TOLIMA
Nit:	800.113.389-7
Objeto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y LA ENTIDAD TERRITORIAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (VIS) FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, CONTRIBUYENDO A LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “CASA DIGNA VIDA DIGNA”, CON EL PROPÓSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE INGRESOS, LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS.
Plazo Inicial	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y será hasta el 31 de diciembre de 2022.
Prorroga No. 01	30 de junio de 2023.
Prorroga No. 02	31 de diciembre de 2023.
Valor del Convenio:	\$ 1.500'000.000 (Mil Quinientos Millones De Pesos M/Cte).





La entidad adjudicó la ejecución de las obras, mediante el contrato número 2216 de julio 11 de 2023, cuyo objeto es “CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIB DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA” por un valor de \$1.500.000.000 mc/te”

El Departamento para la Prosperidad Social, adjudicó a la empresa MEDINA & RIVERA INGENIEROS S.A.S, la interventoría del proyecto de mejoramiento de vivienda urbana, la cual inició las actividades y requerimientos previos a la suscripción del acta de inicio del contrato No.2216 de 11 de julio de 2023

Que el día 2 de noviembre de 2023, a las 9:00 am. Se realizó el sorteo, en presencia de las entidades convocadas, quedando a la espera del consolidado de los potenciales beneficiarios seleccionados, que permita suscribir el acta que oficializa el listado de las familias con las cuales se puede dar inicio del contrato de obra No.2216 de 11 de julio de 2023, con un plazo de (04) cuatro meses.

Una vez suscrita el acta de inicio, el contratista deberá empezar con la fase de preconstrucción, labor que consiste en la elaboración de los diagnósticos, de las posibles intervenciones en las unidades habitacionales, desarrollada de manera concertada con los potenciales beneficiarios, avalado por la interventoría y aprobada por la supervisión de Prosperidad Social y el Municipio de Ibagué, actividad que tiene prevista su ejecución en un término de un (01) mes

Una vez surtida y aprobada esta fase de reconstrucción, se da inicio a la fase de construcción de los mejoramientos, actividad, que se tiene prevista desarrollar en (3) tres meses.

Así las cosas, se estima que una vez quede en firme el acto administrativo que aprueba los potenciales beneficiarios derivados del sorteo, se debe contar con (4) cuatro meses para la ejecución de la fase de preconstrucción y construcción, lo que nos lleva a superar la presente vigencia y dos meses más, es decir hasta el 02 de marzo de 2024. Fecha que igualmente tiene de vigencia el contrato de obra número 2216 de julio 11 de 2023, cuyo objeto es “CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIB DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA” por un valor de \$1.500.000.000 mc/te”





5. Meta: Gestionar la construcción de 300 viviendas nuevas (Cód KPT 4001014)

Resultados obtenidos: 100% de ejecución.

1. En la vigencia del año 2023, se consolidó la gestión para la construcción de 308 viviendas tanto unifamiliares (158) como multifamiliares (150).
2. Las soluciones gestionadas en altura beneficiaran a igual número de familias ubicadas a la rivera del río Combeima especialmente en el barrio Baltazar de la ciudad.

✓ CONVENIO 9677-TPAL001-636-2022 (BALTAZAR)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Conforme a la declaratoria de calamidad, y al censo de familias afectadas establecido en el Registro Único de Damnificados – RUD, se definió un total de 150 familias cuyas viviendas resultaron afectadas y/o que se encuentran ubicadas en zona de riesgo, las cuales serán objeto del proceso de reubicación de sus viviendas en el proyecto, suman un total de 150 hogares que serán beneficiarios de una vivienda nueva.

CONVENIO N°:	9677-TPAL001-636-2022
VALOR CONVENIO:	\$17.469.212.203.
APORTES EN DINERO	\$14.445'000.000, FNGRD
APORTES EN ESPECIE	\$ 3.024'212.203, TODOS LOS COOPERANTES

PLAZO CONVENIO: (36) TREINTA SEIS MESES

COOPERANTES:

- FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
- MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
- MUNICIPIO DE IBAGUÉ
- GESTORA URBANA (PREDIO)

OBJETO: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos, jurídicos, y financieros para ejecutar el proyecto para la construcción de viviendas en beneficio de la comunidad damnificada y afectada por las fuertes lluvias presentadas en el municipio de Ibagué en el marco de la declaratoria de Situación de Calamidad Pública N°1000-0008 del 12 de enero de 2021 con Decreto de retorno a la normalidad N°1000-0564 del 6 de octubre de 2021 y la declaratoria de situación de Calamidad Pública Decreto N°1000-0545 del 24 de septiembre de 2021 y los demás actos que lo modifiquen.”


ALCANCE DEL OBJETO: “Coordinar actividades técnicas, administrativas, logísticas, jurídicas y financieras entre el FNGRD, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el





Municipio de Ibagué, y la Gestora Urbana de Ibagué, necesarios para desarrollar el objeto del presente convenio en beneficio de la reubicación de las familias afectada.”

LOCALIZACION DEL PROYECTO

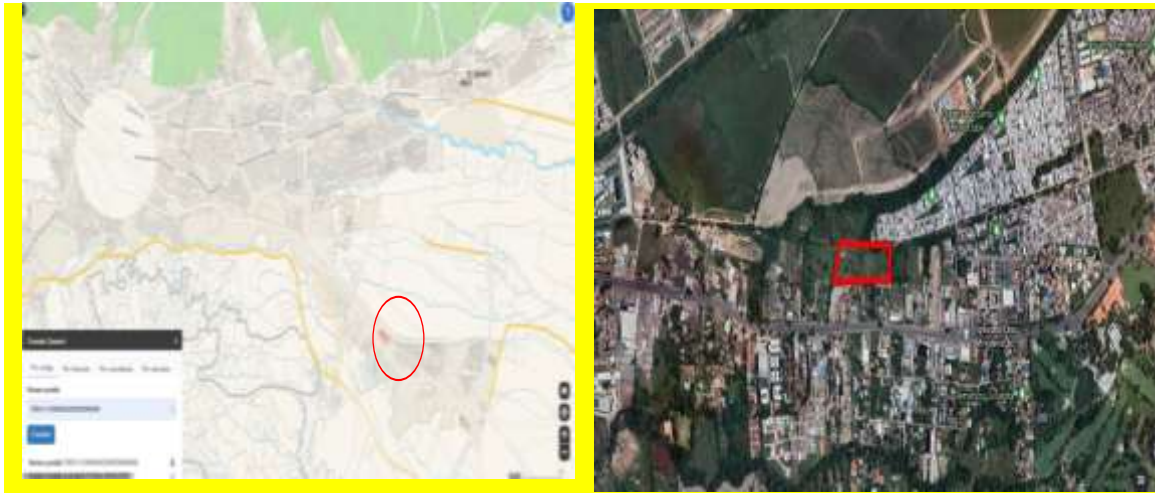

AVANCES DEL PROYECTO

El 18 de marzo de 2022, los supervisores designados por cada entidad suscribieron el acta de inicio del Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-636-2022.

El 24 de mayo de 2022, se realizó el Acta de Reunión de la - Convocatoria Comité Técnico-Administrativo, al Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-636-2022, en la cual la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en la cual exponen el proceso de selección y la declaratoria de “FALLIDO”

“32. DECLARATORIA DE FALLIDO

"(...) Serán causales de declaratoria de fallido de la invitación a cotizar, las siguientes:

A Ninguno de los invitados presentó cotización dentro del horario y fecha indicada en la invitación.

B. Ninguno de los invitados a cotizar cumplió con los requisitos establecidos en la presente invitación.

Ante la declaratoria de fallido, se procederá a revisar el contenido de la invitación a cotizar y los requerimientos técnicos para identificar las causas que dieron motivo a tal circunstancia y hará los ajustes necesarios para realizar una nueva invitación. (...)"



En atención a las consideraciones anteriores, el 24 de mayo se remitió correo electrónico a DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DYCO SAS, por medio del cual se comunicó el resultado de la verificación técnica, financiera y jurídica y se informa que se recomienda declarar el proceso fallido.

Con base en los resultados, desde la UNGRD se informa a los asistentes que de acuerdo al procedimiento PR-104-GCON-19 por medio del cual se definen los lineamientos para la estructuración y celebración de contratos por invitación privada, para la fase de respuesta y recuperación en el marco de emergencias que constituyan calamidad pública "(...) si ninguno de los cotizantes cumple con los requisitos establecidos en la justificación para el contrato que se requiera suscribir, se deberá dejar constancia de ellos en el documento consolidado de verificación definitiva señalando por parte del comité como FALLIDA la etapa de cotización, y tendrá que dar inicio a un nuevo proceso con nuevos invitados (...)" .

En consecuencia se informa que se solicitarán las nuevas firmas a las partes, para constituir el listado de firmas a invitar a cotizar en el nuevo proceso. Así mismo, se solicita a las partes revisar los documentos precontractuales (anexo técnico y justificación) que fueron estructurados de manera conjunta, con el fin de que se realicen recomendaciones frente a modificación que estimen pertinentes realizar.

Finalmente se aclara que para la nueva convocatoria se deben presentar nuevas firmas de acuerdo a lo mencionado anteriormente, para lo cual desde la UNGRD/FNGRD se remitirá oficio nuevamente, solicitando la postulación.

GESTORA URBANA DE IBAGUÉ:

- Se consulta si es posible que alguna de las firmas ya invitadas en la primera convocatoria se presenten bajo la figura de unión temporal o consorcio a lo cual la Arq. María Fernanda responde que en el procedimiento solo se establece que deben ser invitadas a cotizar nuevas firmas, y no se menciona imposibilidad que tengan estas nuevas firmas para presentarse en consorcio o uniones temporales.
- Solicitan que para la nueva convocatoria se incorporen las observaciones financieras que se realizaron durante el proceso.

MINISTERIO DE VIVIENDA:

- Proponen que se amplíe el tiempo de presentación de la convocatoria, a lo cual se indica que presenten la propuesta de modificación a la justificación con ese ajuste y los demás que consideren pertinentes.

Finaliza el comité quedando el compromiso de que por las partes se realice el anexo técnico y justificación para nueva reunión el 31 de mayo, con el fin de poner en conocimiento de las partes las sugerencias de ajustes que se requieran."

De acuerdo con el compromiso expresado en la anterior acta, la secretaria de infraestructura vía correo electrónico, remitió las nuevas firmas constructoras, a la dependencia encargada de realizar nuevamente la convocatoria.





Derivado de la demora de la UNGRD para iniciar nuevamente la convocatoria, y ante nuestras constantes consultas UNGRD, manifestó que con el cambio del director, por el cambio de presidente, deberíamos esperar a la nueva directriz de la actual dirección.

Con el oficio 1000-051347 fechado en agosto 10 de 2023, el señor Alcalde de Ibagué, solicitó el informe del estado actual de los avances que se han realizado y fechas estimadas para la ejecución de las actividades que permitan el cumplimiento del convenio. También se solicitó informe de los posibles obstáculos que se han presentado en la ejecución del contrato y las medidas que se han tomado para superarlas.

De lo cual a la fecha la UNGRD, aún no emite respuesta, como se puede corroborar con el presente pantallazo tomado del Sistema de Seguimiento Correspondencia.

Que no se alcanzó a desarrollar:

Dentro de la presente vigencia, además de la Gestión, se están ejecutando las obras de urbanismo para 158 lotes en la urbanización el Reposo, en cumplimiento de la acción popular conocida como el Hato de la Virgen. Con un avance de ejecución de aproximadamente el 80%, incluida la obra adicional

- **PROYECTO HATO DE LA VIRGEN**

Se prorrogó por (01) un mes más la ejecución del contrato de obra N° 2452 del 19 de julio de 2022, cuyo objeto es Adelantar El Proceso Integral De Reubicación De Las Familias Asentadas En El Hato De La Virgen En Cumplimiento De La Acción Popular Radicado 73001-23-00-000-2001-01676-00, Con Resolución de Adopción 050 De Marzo 11 De 2.011, por un valor de (\$ 3.334.560.353) Tres Mil Trescientos Treinta Y Cuatro Millones Quinientos Sesenta Mil Trescientos Cincuenta y Tres Pesos M/CTE. Así como también se está desarrollando el contrato 2453 del 21 julio del 2022 de Interventoría, con igual prorroga en tiempo y una adición de \$84.000.000.

Es procedente mencionar que esta adelantando las gestiones necesarias para adición recursos y prorrogar 440 días, necesarios para la culminación de las obras de urbanismo, así como también para la interventoría

A la fecha este contrato tiene un porcentaje de ejecución de avance de obra del 80.%





Registro Fotográfico





- **PROYECTO BALTAZAR**

Como ya se había anunciado anteriormente, se suscribió el convenio interadministrativo N°:9677-TPAL001-636-2022 del 18 de febrero de 2022, por un valor de \$17.469.212.203, encuentra vigente, a la espera que la UNGRD, inicie la etapa contractual y aun sin novedad, con este convenio.

Sin embargo, como el indicador de la meta, es la gestión para la construcción de 300 viviendas nuevas, la forma de este convenio entre la alcaldía de Ibaque y la UNGRD, que tiene un plazo de ejecución hasta el año 2.025, se da por hecho que la acción de gestionar estas 1 50 viviendas se ha cumplido por parte de la administración municipal.

En constancia de la gestión de vivienda adelantada por la secretaria de Infraestructura, y en virtud de las metas comprometidas, se anexa a la presente copia del contrato de obra 2452 del 19 de julio de 2022, cuyo objeto es “ADELANTAR EL PROCESO INTEGRAL DE REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS ASENTADAS EN EL HATO DE LA VIRGEN EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR RADICADO 73001-23-00-000-2001-01676-00, CON RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN 050 DE MARZO 11 DE 2011”.



Así como también copia del contrato de interventoría 2423 de julio 21 de 2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO DE ESTUDIOS, DISEÑOS DEL PROYECTO ADELANTAR EL PROCESO INTEGRAL DE REUBICACION DE LAS FAMILIAS ASENTADAS EN EL HATO DE LA VIRGAN EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR RADICADO 73001-32-00-000-2001-01676-00, CON RESOLUCION DE ADOPCION 050 DE MARZO 11 DE 2011”

Igualmente, en constancia del cumplimiento de la meta de Gestión de Vivienda, anexamos copia del convenio el Convenio No. 9677-PPAL001-636-2022, entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres quien actúa a través de Fiduprevisora S.A.,

7. Meta: Realizar la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento 20 salones comunales

Resultados obtenidos: 70% de ejecución

Se realizaron por parte de la Secretaría de Infraestructura todas las actividades establecidas en las especificaciones técnicas necesarias para el Mantenimiento y mejoramiento de los salones comunales de los barrios LAS VEGAS, TOLIMA GRANDE, JORDAN IV ETAPA, LA CIMA, BUNDE Y CANTABRIA.

Se llevo a cabo las actividades preliminares de desmontes y demoliciones, del mismo modo se intervino pisos, cubiertas, acabados, instalaciones hidráulicas y eléctricas, carpintería y metálica.

En ese orden de ideas el Contrato 3474 del 01 de diciembre de 2021, se encuentra en resumen de intervención y financiero de la siguiente manera:

SALONES COMUNALES CTO 3474/01/12/21	VALOR ESTIMADO DE INVERSION	VALOR INVERTIDO	ESTADO
San simón	9.570.691.00		N/A
Jordán IV etapa	17.633.602.00	38.629.204.00	TERMINADO
Villa Norte	25.684.754.00		N/A
San diego	11.936.378.00		N/A
La Francia	14.031.610.00		N/A
Portal del oasis	20.198.354.00		N/A
Tolima Grande	33.120.980.00	60.316.678.47	TERMINADO
La Cima Centro comunitario	80.487.260.00	98.875.357.18	TERMINADO
Galarza	27.291.093.00		N/A
Cantabria	12.047.099.00	17.066.559.64	TERMINADO
Las vegas	11.656.362.00	20.724.485.23	TERMINADO
EL bunde	36.341.818.00	52.692.746.11	TERMINADO
Total	290.429.310.00	288.305.040,45	TERMINADO





A través de la Gestora Urbana se ha ejecutado en la Comuna 7; barrio Cantabria, la Vega, Ambikaima, Comuna 8; Jardín Comuneros, Comuna 11; Barrio Uribe Uribe, Comuna 4; Barrio Gaitán, Comuna 6; Barrio Arkambuco.

Registro Fotográfico

Salón Comunal Tolima Grande



Salón Comunal La Cima







Salón Comunal Jordán IV Etapa



Salón Comunal Cantabria





Salón Comunal Bunde



Salón Comunal las vegas





Que no se alcanzó a desarrollar:

Adicionalmente por parte de la Secretaría de Infraestructura para el mes de noviembre de 2023 se celebró los siguientes convenios solidarios para el mejoramiento de salones comunales:

NOMBRE CONTRATISTA	NIT DEL CONTRATISTA	COMUNA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL PROCESO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ARADO	900176475-5	11	AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO EL ARADO DEL MUNICIPIOS DE IBAGUÉ	\$25.195.265
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO POPULAR	800021083-3	11	AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO POPULAR DEL MUNICIPIOS DE IBAGUÉ	\$ 28.736.072
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN MARTINICA	809000145-4	13	AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN MARTINICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	\$56.252.284





NOMBRE CONTRATISTA	NIT DEL CONTRATISTA	COMUNA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL PROCESO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SAN CARLOS COMUNA 4	809001380-3	4	AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO SAN CARLOS COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	\$54.106.425
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SAN DIEGO	809002263-4	2	AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO SAN DIEGO DEL MUNICIPIOS DE IBAGUÉ	\$32.188.076
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA FRANCIA	800157320-9	10	AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LA FRANCIA DEL MUNICIPIOS DE IBAGUÉ	\$36.326.461
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO 2 JUNIO	901114100-7	8	AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO 2 DE JUNIOIA DEL MUNICIPIOS DE IBAGUÉ	\$63.869.470

Por último, para el cumplimiento de la meta este despacho realizó la estructuración del proceso AI-LOP-1968-2023 cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”

Objeto del proyecto	Plazo del contrato	Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)	Lugar(es) de ejecución del contrato
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO	\$2.261.518.917	Ciudad de Ibagué





	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-41-PRO-GC-001	
		Versión: 01	
	FORMATO: CLAUSULADO PROCESOS DE SELECCIÓN	Fecha: 05/08/2022	
		Página: 1 de 13	

Contrato No.	--2910--	Fecha:	31 OCT 2023
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		
Entidad contratante:	MUNICIPIO DE IBAGUÉ		
Nit:	800.113.389-7		
Rep. Legal:	HERNANDO SANABRIA LOZANO		
Identificación:	93.366.027 DE IBAGUÉ		
Razón Social:	CONSORCIO SALONES 2023		
Nit:	901.762.417-5		
N° PROCESO SECOP II	AI- LOP-1968- 2023		
<p>Entre los suscritos a saber: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE, con NIT. 800.113.389-7, representado por SHARON DAYANA GUZMÁN GONZÁLEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 65.782.223, expedida en Ibagué, en calidad de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL de conformidad con el DECRETO 1000 – 002 DEL 02 DE ENERO DEL 2023 delegada por el Decreto 1000- 0026 DEL 11 DE ENERO DEL 2023, para ejercer la función de Ordenadora del Gasto, quien se denominará, MUNICIPIO DE IBAGUÉ, por una parte y por la otra, HERNANDO SANABRIA LOZANO, identificado con cedula de ciudadanía No 93.366.027 DE IBAGUÉ en calidad de Representante Legal del CONSORCIO SALONES 2023, identificado con el Nit 901.762.417-5, quien se denominará EL CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se registrá por las siguientes:</p>			
CLÁUSULAS:			
1) Objeto:	El objeto del contrato de obra pública es: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
2) Plazo:	El contrato tendrá un plazo hasta el día CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO , contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.		

En ese sentido, a continuación, relaciono el resumen de los salones comunales que han sido ejecutados, que están en ejecución y los que no se ejecutaron.

MEJORAMIENTO SALONES COMUNALES			EJECUTADO/NO EJECUTADO/EN EJECUCION
Contrato 3474 del 01 de diciembre de 2021			
No.	BARRIO O VEREDA	COMUNA / CORREGIMIENTO	
1	San Simón	3	NO EJECUTADO
2	Jordán IV etapa	5	EJECUTADO
3	Villa Norte	8	NO EJECUTADO
4	San Diego	2	NO EJECUTADO
5	La Francia	10	NO EJECUTADO
6	Portal del Oasis	6	NO EJECUTADO
7	Tolima Grande	7	EJECUTADO





MEJORAMIENTO SALONES COMUNALES			EJECUTADO/NO EJECUTADO/EN EJECUCION
Contrato 3474 del 01 de diciembre de 2021			
No.	BARRIO O VEREDA	COMUNA / CORREGIMIENTO	
8	La Cima centro comunitario	8	EJECUTADO
9	Galarza	12	NO EJECUTADO
10	Cantabria	7	EJECUTADO
11	Las vegas	12	EJECUTADO
12	EL Bunde	8	EJECUTADO
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SALONES COMUNALES			EJECUTADO/NO EJECUTADO/EN EJECUCION
CONTRATO 2910 - 31 DE OCTUBRE 2023			
No.	BARRIO O VEREDA	COMUNA / CORREGIMIENTO	
1	BOYACA	10	EN EJECUCION
2	EL REFUGIO 2	11	EN EJECUCION
3	EL TRIUNFO	4	EN EJECUCION
4	MURILLO TORO	12	EN EJECUCION
5	VERSALLES	9	EN EJECUCION
6	YULDAIMA	12	EN EJECUCION
7	PRADERAS DEL SUR	12	EN EJECUCION
8	PRADO II	8	EN EJECUCION
9	LOS MARTIRES	11	EN EJECUCION
10	ASOJUNTAS	8	EN EJECUCION
11	PROTECHO SALADO	7	EN EJECUCION
12	VIVEROS	3	EN EJECUCION
13	LA LIBERTAD	11	EN EJECUCION
14	20 DE JULIO	2	EN EJECUCION
15	SANTA CRUZ	2	EN EJECUCION
16	AMERICA	10	EN EJECUCION
17	CIUDADELA SIMON BOLIVAR III	8	EN EJECUCION
18	VEREDA SANTA TERESA	CAY (9)	EN EJECUCION
CONSTRUCCION SALONES COMUNALES			EJECUTADO/NO EJECUTADO/EN EJECUCION
CONTRATO 2910 - 31 DE OCTUBRE 2023			
NO.	BARRIO O VEREDA	COMUNA / CORREGIMIENTO	
1	VILLA CLARA	7	EN EJECUCION
2	LA FLORESTA	7	EN EJECUCION
3	NAZARETH	7	EN EJECUCION





CONVENIO SOLIDARIO MEJORAMIENTO SALONES COMUNALES			EJECUTADO/NO EJECUTADO/EN EJECUCION
NO.	BARRIO O VEREDA	COMUNA / CORREGIMIENTO	
1	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL B/ EL ARADO	11	EN EJECUCION
2	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL B/ EL POPULAR	11	EN EJECUCION
3	JUNTA DE ACCIÓN COMUNALDE LA URB. MARTINICA	13	EN EJECUCION
4	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL B/ SAN CARLOS	4	EN EJECUCION
5	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL B/ SAN DIEGO	2	EN EJECUCION
6	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL B/ LA FRANCIA	10	EN EJECUCION
7	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL B/ 2 JUNIO	8	EN EJECUCION

Dirección Operativa





















De acuerdo a lo mencionado en el Plan de Desarrollo 2020-2023, el 58.51% de la infraestructura vial ya cumplió su vida útil, por falta de mantenimiento, por aumento en el parque automotor, que ayuda a generar desgaste en la estructura existente, por improvisación en las obras de instalación de redes por parte de los operadores de servicios públicos; cumplimiento de la vida útil de las redes Hidrosanitarias que afectan directamente la malla vial, por lo anterior La secretaria de Infraestructura implemento programas con el fin de mejorar, rehabilitar y construir vías mejorando así la movilidad de la ciudad adicional modernizando y así mismo generando alternativas de mantenimiento y recuperación de movilidad amigable con el ambiente.

Teniendo en cuenta que el Objetivo General es el de Construir, y/o mejorar y/o mantener la infraestructura de transporte en la ciudad, a través de las intervenciones en la malla vial urbana para mejorar las condiciones de movilidad de manera que se garantice el funcionamiento de la malla vial, vehicular y peatonal, así como el goce y disfrute del territorio por parte de sus habitantes, se desarrollaron las siguientes metas:





Tabla 04 Ejecución Física Metas de Producto

ODS		Descripción Meta Producto	Meta Cuatrienio	Ejecutado 2020 - 2023
		Construir y/o mejorar, y/o rehabilitar 20.000 m2 de Andenes de la red urbana (Cód KPT 2402121)	20.000	28.981
		Mejorar y/o construir 300.000 M2 de malla vial urbana (Cód KPT 2402114)	300.000	200.490
		Rehabilitar 300.000 M2 de la vía urbana	300.000	184.705
		Mantener 4 puentes peatonales en la zona urbana	4	1
		Construir y/o mejorar 2 puentes peatonales en la zona urbana (Cód KPT 2402119)	2	2
		Construir y/o mejorar 2 puentes vehiculares en la zona urbana (Cód KPT 2402119)	2	1
		Mantener 3 puentes vehiculares en la zona urbana (Cód KPT 2402119)	3	5
		Realizar la construcción y/o mantenimiento a de Ciclo infraestructura urbana (Cód KPT	4	7.6
		Realizar estudios de preinversión para sistemas alternativos de transporte (Cód KPT	1	0
		Realizar obras de infraestructura para la mitigación del riesgo (550 mts 2) (Cód KPT 2402077)	550	320

Fuente: Secretaría de Infraestructura Ibagué

Dimensión: Ibagué Económica y Productiva

Sector: Las Vías vibran con Movilidad y Sostenibilidad

Programa: Infraestructura Red Vial Regional

Subprograma: Infraestructura Vial Vibrante y Sostenible

8. Meta: Construir y/o mejorar, y/o rehabilitar 20.000 m2 de Andenes de la red urbana (Cód KPT 2402121)

Resultados obtenidos: 28.981 M2, correspondiente al 100% de ejecución





Aun que se supero el 100 % de ejecución; sin embargo, se encuentra pendiente el recibo de las demás estructuras de andenes, en el marco del Contrato No. 1979 de 2023 y los Andenes derivados del recibo de la Calle 100 para los Planes Parciales la Samaria y Santa Cruz

9. Meta: Mejorar y/o construir 300.000 M2 de malla vial urbana (Cód KPT 2402114)

Resultados obtenidos: 200.490 M2, equivalente al 67% de ejecución

Que no se alcanzó a desarrollar:

A la fecha está pendiente para dar cumplimiento a la meta en 99.510 M2, dentro de los motivos del porque no se alcanzó a desarrollar, tenemos que en la vigencia 2020 y 2021, por efecto de la pandemia, no se pudo laborar al 100%, teniendo en cuenta que se generó estado emergencia impidiendo esto que se trabajara de una manera ágil. reduciéndose así la capacidad de cumplimiento. También podemos indicar que el factor climático, así como diferentes situaciones con redes de servicios públicos, fue retrasando los procesos. Queda pendiente reportar el porcentaje de ejecución del Contrato de Obra No. 1979 de 2023, así como lo pendiente por entregar a cargo de los Planes Parciales de santa Cruz y Samaria sobre toda la Calle 100. Por otro lado, el Sistema estratégico de transporte esta pendiente por entregar lo Mejorado sobre la Carrera 5ª y Avenida Ambala.

10. Meta: Rehabilitar 300.000 M2 de la vía urbana

Resultados obtenidos: 184.705 M2, equivalente al 62% de ejecución

Que no se alcanzó a desarrollar:

Al presente corte (31/10/23) está pendiente para dar cumplimiento a la meta 115.295 M2, dentro de los motivos del porque no se alcanzó a desarrollar, tenemos que en la vigencia 2020 y 2021, por efecto de la pandemia, no se pudo laborar al 100%, teniendo en cuenta que se generó estado emergencia impidiendo esto que se trabajar de una manera ágil. reduciéndose así la capacidad de cumplimiento. También podemos indicar que el factor climático, así como diferentes situaciones con redes de servicios públicos, fue retrasando los procesos. Queda pendiente reportar el porcentaje de ejecución del Contrato de Obra No. 1979 de 2023. Por otro lado, el Sistema estratégico de transporte está pendiente por entregar la rehabilitación sobre la Carrera 5ª y Avenida Ambala entre otras.





11. Meta: Mantener 4 puentes peatonales en la zona urbana

Resultados obtenidos: 1 Puente, el cual obedece al 25% en ejecución de la meta.
Reporte dado por Ibagué Limpia.

Que no se alcanzó a desarrollar:

No se alcanzó a desarrollar el proyecto denominado EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PUENTES URBANOS EN LA CIUDAD DE IBAGUE, radicado a la Oficina de Contratación mediante Memorando 2300-037012 de 29 de agosto de 2023, pero que por falta de recursos actualmente de esta dependencia no logro llegar a feliz término y continuar con el proceso licitatorio de menor cuantía El presente proyecto inicialmente contemplaba el mantenimiento y recuperación de aproximadamente 4 puentes.

12. Meta: Construir y/o mejorar 2 puentes peatonales en la zona urbana (Cód KPT 2402119)

Resultados obtenidos: Meta cumplida al 100%

2 Puentes Peatonales: 1 ubicado en el sector de la Florida, en el marco del Contrato de Obra 2455 de 2022 y 1 en el sector de la Cicloruta del Vergel, ejecutado a través del Contrato 2874 de 2018. Obras adelantadas por la Secretaria de Infraestructura

13. Meta: Construir y/o mejorar 2 puentes vehiculares en la zona urbana (Cód KPT 2402119)

Resultados obtenidos: 50% alcanzada

1 Puente correspondiente a la CONSTRUCCION BOX CULVERT CARRERA 28ª SUR ENTRE CALLES 22 Y 23 QUEBRADA LA VOLCANA BARRIO LA FLORIDA VARIANTE SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Contrato de Obra No. 2455 de 2022 de esta dependencia.

Que no se alcanzó a desarrollar:

Por un lado, se celebró Contrato de Obra No. 1312 de 19 de abril de 2023 que tiene por objeto REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS NECESARIAS PARA FASE I (CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE ELEVADO SOBRE LA CARRERA 5a E INTERCONEXIONES) QUE PERMITA LA CONSOLIDACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA DESARROLLO DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 5° CON CALLE 60, por valor de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$39.146.376.591,00), el cual contempla la Construcción de 1 puente en la carrera 5ª haciendo cruce por la Calle 60. Asimismo, se celebró contrato de Interventoria





No. 1313 de 19 de abril de 2023, que tiene por objeto la INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO "REALIZAR RECIOS UNITARIOS LAS OBRAS NECESARIAS PARA FASE I (CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE ELEVADO SOBRE LA CARRERA 5 E INTERCONEXIONES) QUE PERMITA LA CONSOLIDACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 5a CON CALLE 60", por valor de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS (\$2.997.938.430) M/CTE. Actualmente el Proyecto tiene un porcentaje de ejecución del 5% de avance en obra.

Así mismo, no se logró la realización de varios de estos puentes, teniendo en cuenta que el Proyecto denominado ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES, PEATONALES Y MEDIDAS DE CONTENCIÓN EN LA CIUDAD DE IBAGUE, radicado ante la oficina de Contratación mediante Memorando 2300 - 040029 de fecha 12 de Septiembre de 2023, no llegó a feliz término, teniendo en cuenta que este no contaba con el recurso primordial para continuar con el proceso licitatorio o concurso de méritos, debido a diferentes traslados concertados con la Secretaria de Hacienda. Para el presente caso contemplaba una cantidad de 4 puentes vehiculares que inicialmente requerían sus estudios y diseños para luego ser contratado el proyecto de obra.

14. Meta: Mantener 3 puentes vehiculares en la zona urbana (Cód KPT 2402119)

Resultados obtenidos: Meta cumplida al 100%

Esta dependencia realizo actividades en:

Calle 37 con Avenida Guabinal

Rio Chipalo entre la Avenida Ambala y la Carrera 5

A través de Ibagué Limpia, se adelantó mantenimiento a los siguientes puentes:

Calle 19 con Carrera 5

Calle 103 con Avenida Ambala

Carrera 5 con Calle 83

15. Meta: Realizar la construcción y/o mantenimiento a de Ciclo infraestructura urbana (Cód KPT 2402094)

Resultados obtenidos: Meta cumplida al 100%

7.62 Km a través del Contrato, 2874 de 2018 de la Secretaría de Infraestructura, Planes parciales e IMDRI

16. Meta: Realizar estudios de preinversión para sistemas alternativos de transporte (Cód KPT 2408024)



Resultados obtenidos: 0%





Que no se alcanzó a desarrollar:

Para el cumplimiento de la meta este despacho realizó la estructuración del proceso AI-CMA-2204-2023 cuyo objeto es “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA DE MOVILIDAD ALTERNATIVO DE CABLE AÉREO PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ.” Y que por medio de resolución No. 2300-000168 del 06 de septiembre de 2023 se adjudica dicho proceso y que a la fecha está en trámite para la adjudicación de la interventoría.

	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-41-PRO-OC-001	
	FORMATO: CLAUSULADO PROCESOS DE SELECCIÓN	Versión: 01	
		Fecha: 05/08/2022	
		Página: 1 de 9	

Contrato No.	- 2727 -	Fecha:	17 SEP 2023
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE CONSULTORIA		
Entidad contratante:	MUNICIPIO DE IBAGUÉ		
Nit:	800113389-7		
Rep. Legal:	BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ ✓		
Identificación:	C.C. 53.084.679 de Bogotá D.C. ✓		
Razón Social:	CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S		
Nit:	901355586-6 ✓		
N° PROCESO SECOP II	AI- CMA-2204-2023 ✓		
<p>Entre los suscritos a saber: ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ, con NIT, 800113389-7, representado por SHARON DAYANA GUZMAN GONZALEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 65.782.223, expedida en Ibagué, en calidad de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL de conformidad con el DECRETO 1000 – 007 DEL 02 DE ENERO DEL 2023 delegada por el Decreto 1000- 0026 DEL 11 DE ENERO DEL 2023, para ejercer la función de Ordenador del Gasto, quien se denominará, MUNICIPIO DE IBAGUÉ, por una parte y por la otra, BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 53.084.679 de Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S identificado con el Nit 901355586-6, quien se denominara EL CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se registrá por las siguientes:</p>			
CLAUSULAS:			
1) Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA DE MOVILIDAD ALTERNATIVO DE CABLE AÉREO PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ		
2) Plazo:	El contrato tendrá un plazo de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato		
3) Lugar de ejecución:	La Alcaldía de Ibagué y donde lo requiera en desarrollo del objeto contractual.		

17. Meta: Realizar obras de infraestructura para la mitigación del riesgo (550 mts 2) (Cód KPT 2402077)

Resultados obtenidos: 58% de ejecución, correspondiente a 320 M2 derivados del Contrato 2874-2018

Que no se alcanzó a desarrollar:

Cabe destacar que a la fecha está pendiente para dar cumplimiento a la meta 229.80 m2, dentro de los motivos del porque no se alcanzó a desarrollar, tenemos que en la vigencia 2020 y 2021, por efecto de la pandemia, no se pudo laborar al 100%, teniendo





en cuenta que se generó estado emergencia impidiendo esto que se trabajara de una manera ágil. reduciéndose así la capacidad de cumplimiento.

No obstante, a la fecha se cuenta con el contrato de Obra No. 2939 de 09 de noviembre de 2023, que tiene por objeto CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA EL CONTROL DE EROSION, CORRECCION Y PROTECCION DEL CAUCE ORILLA DE LA QUEBRADA CRISTALES SECTOR CONJUNTO FENIX, BARRIO CALAMBEO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR No. 73-001-23-33-004-2017-00572-00, celebrado con el CONSORCIO FENIX POPILAR Por valor de \$.1610.263.273. A la fecha el Proyecto no tiene porcentaje de ejecución, dado que se esta adelantado actualmente la legalización y compra de estampillas por parte del contratista y no se cuenta aun con acta de inicio.

Aspectos Financieros

La Secretaría de Infraestructura dentro del cuatrienio ha manejado recursos correspondientes a RECURSOS PROPIOS ICLD, RECURSOS DE CREDITO INTERNO, SGP OTROS PROPOSITOS LIBRE INVERSION, R.B. SGP - PROPOSITO GENERAL - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION, CONVENIOS, PLUSVALIA y TASA PRODEPORTE.

A continuación se muestral el desempeño presupuestal de la dependencia en este lapso de tiempo:

Gráfico 02 Ejecución Presupuestal 2020- 2023 (31 Oct)

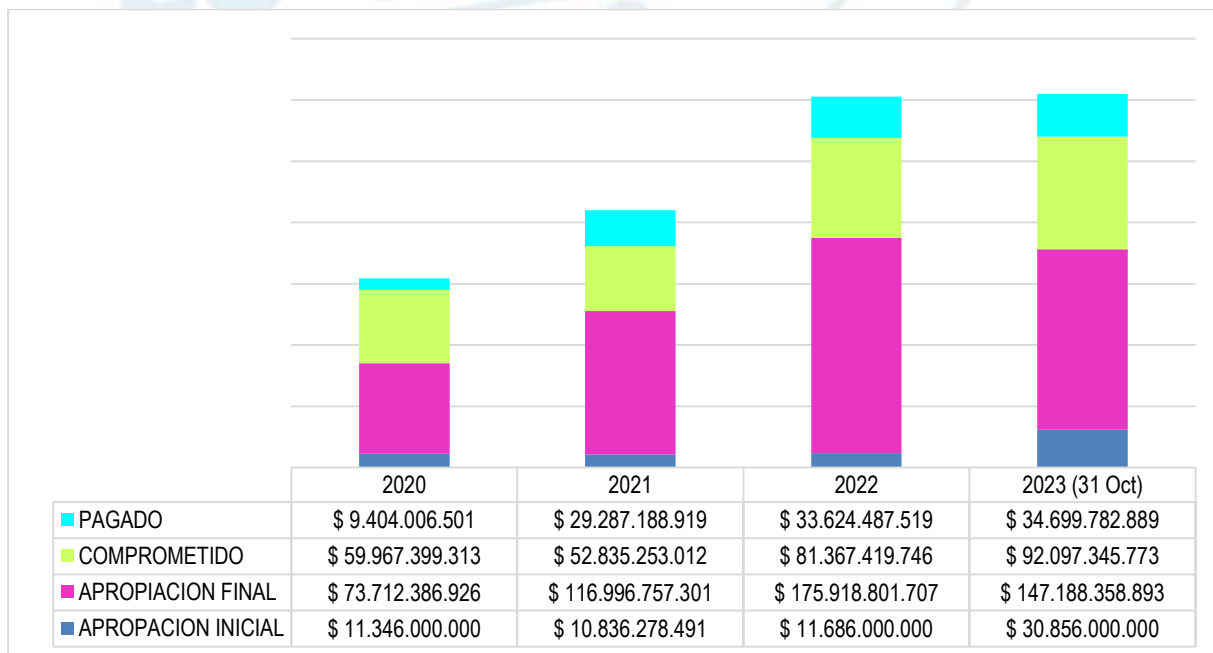




Gráfico 03 Ejecución Reserva Presupuestal 2020- 2023 (31 Oct)
Recursos del Crédito

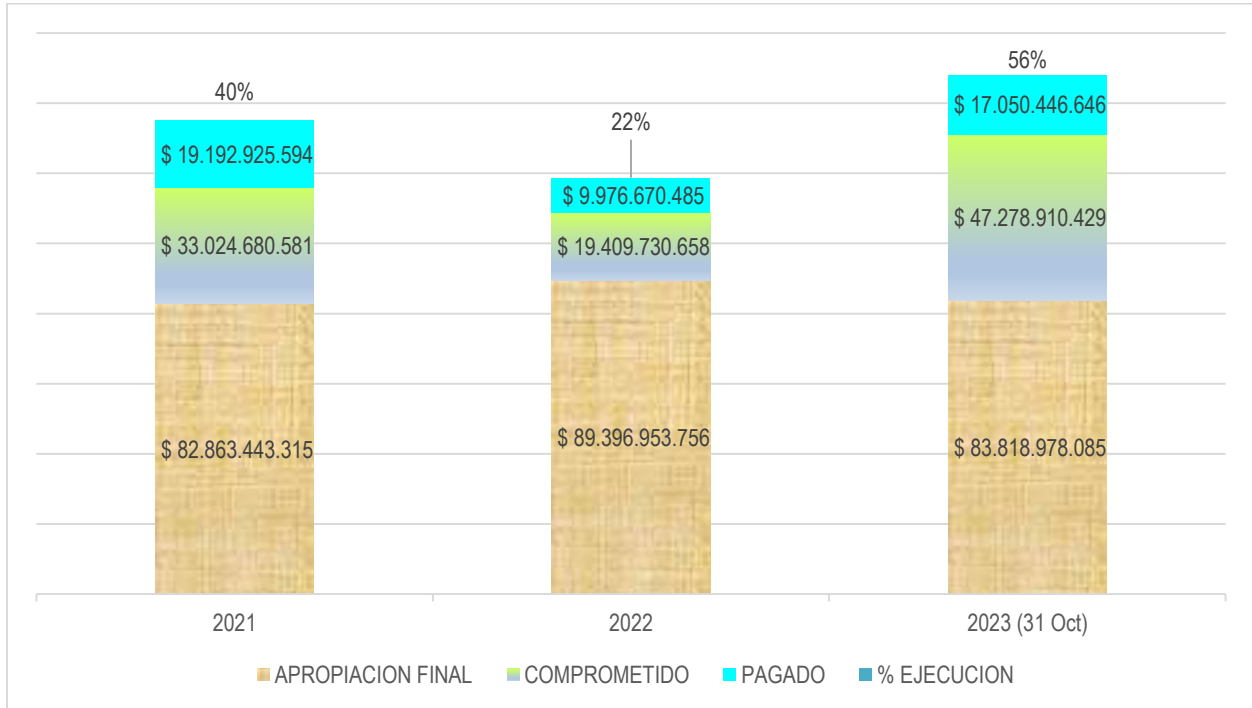


Gráfico 04 Ejecución Reserva Presupuestal 2020- 2023 (31 Oct)

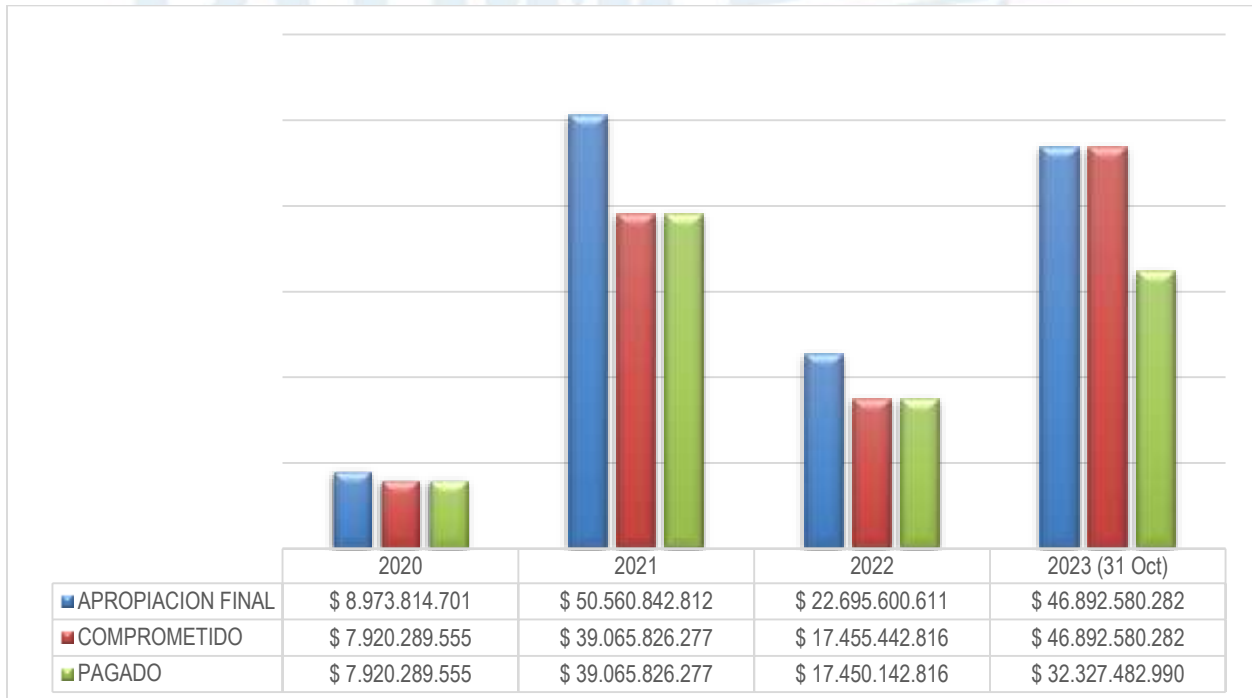




Tabla 05 Vigencias Expiradas

CTO/ CONV	FECHA	DETALLE	CONTRATISTA	SALDO	RECURSOS	PROGRAMA
2458	22/09/2021	ESTRUCTURACIÓN DEL BOULEVARD DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 19 A LA 44 EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, VIBRANTE Y SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	GESTORA URBANA DE IBAGUE	\$95.385.028	RECURSOS PROPIOS ICLD	INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL

Nota: Al 31 de octubre, por parte de la Gestora Urbana no se ha adelantado entrega del proyecto a la Secretaría de Planeación para viabilidad, como lo estipula el contrato en el numero 5 Forma de Pago Literal D.

Participación en juntas directivas y comités

Desde la Secretaría de Infraestructura se participa en la siguientes Juntas, Comites y Consejos

- ✓ Participación en los Consejos de Gobierno según convocatoria del despacho de la Alcaldía.
- ✓ Participación en los comites de Atención al Riesgo según convocatoria ante las necesidades de contención de eventos de atención y desastres convocados por la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo.
- ✓ Comité coordinación control interno – Convoca Oficina de Control Interno
- ✓ Comité institucional de Gestión y Desempeño – Convoca Secretaría de Planeación
- ✓ Consejo Directivo –Convoca INFIBAGUE
- ✓ Audiencias de Control Político – Convoca El concejo Municipal de Ibagué.
- ✓ Audiencias y convocatorias de entes de Control - Convoca Procuraduría, Contraloría Nacional, Contraloría Regional.

Aspectos Jurídicos

En ocasión al Proceso de Empalme con la Administración 2024 -2027, se realiza la presentación del informe correspondiente a la Línea Base de las acciones tramitadas, en aras de que se evidencien los requerimientos radicados del ámbito legal, por cuanto se hace entrega del diagnóstico actual de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias registrados por la **PLATAFORMA INTEGRADA DE SISTEMAS ALCALDIA MUNICIPAL**





DE IBAGUE, así como de los procesos judiciales en contra de la entidad durante los años 2020 – 2021 – 2022 y 2023.

En el entendido de lo anterior, la Secretaría de Infraestructura tiene dentro de las funciones comunes del nivel jerárquico proyectar y/o revisar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias enviadas por los ciudadanos, relacionadas con su área y funciones y firmar cuando corresponda, así como atender requerimientos de los entes internos y externos de control, los cuales consisten en atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes periódicos.

Dando cumplimiento a lo anterior, se ponen en conocimiento las actuaciones realizadas en el cuatrienio 2020 – 2023 de la siguiente forma:

1. PRESENTACION P.Q.R.S.

Atendiendo las pautas establecidas en la guía de empalme de la función pública y de la estructura Administrativa y jurídica de la secretaria de infraestructura en correspondencia interna y externa, se relacionan las estadísticas documentales de la Dirección Operativa, Dirección Técnica y Despacho general.

INFORME DE TRAMITES DESARROLLADOS POR LA DIRECCION OPERATIVA

Vigencia 2020

DOCUMENTO	Total
ACCIONES POPULARES	1
DERECHO DE PETICION-DE INTERES GENERAL	54
DERECHO DE PETICION-DE INTERES PARTICULAR	5
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE COPIAS	1
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INF. ENTRE ENTIDADES	7
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INFOR.	16
REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	5
TRAMITE-PERMISO ROTURA PAVIMENTO	10
TRAMITES JUDICIALES	1
TUTELA	1
Total	101





Vigencia 2021

DOCUMENTO	Total
ACCIONES POPULARES	1
DERECHO DE PETICION-DE INTERES GENERAL	14
DERECHO DE PETICION-DE INTERES PARTICULAR	7
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE COPIAS	1
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INF. ENTRE ENTIDADES	3
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INFOR.	7
INCIDENTES Y DESACATOS	1
REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	12
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES	1
TRAMITE-ESTRATIFICACION	1
TRAMITE-PERMISO ROTURA PAVIMENTO	1
TUTELA	1
Total	50

Vigencia 2022

DOCUMENTO	Total
ACCIONES POPULARES	3
DERECHO DE PETICION-DE INTERES GENERAL	101
DERECHO DE PETICION-DE INTERES PARTICULAR	19
DERECHO DE PETICION-RECLAMOS	5
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE COPIAS	4
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INF. ENTRE ENTIDADES	7
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INFOR.	46
INCIDENTES Y DESACATOS	3
LICENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO	13
RECURSO DE REPOSICION Y APELACION	1
REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	44
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES	1
TRAMITE-PERMISO ROTURA PAVIMENTO	25
TRAMITES JUDICIALES	11
TUTELA	12
Total	295





Vigencia 2023

DOCUMENTO	Total
ACCIONES POPULARES	5
DERECHO DE PETICION-DE INTERES GENERAL	135
DERECHO DE PETICION-DE INTERES PARTICULAR	28
DERECHO DE PETICION-QUEJAS	1
DERECHO DE PETICION-RECLAMOS	11
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE COPIAS	5
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INF. ENTRE ENTIDADES	14
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INFOR.	74
INCIDENTES Y DESACATOS	1
LICENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO	6
REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	94
TRAMITE-LICENCIA DE INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO	4
TRAMITE-PERMISO ROTURA PAVIMENTO	7
TRAMITES JUDICIALES	10
TUTELA	13
Total	408

RESULTADO ESTADISTICO: De acuerdo a los cuadros de control relacionados se tiene que, el despacho de la secretaria de Infraestructura – Dirección Operativa, efectuó el trámite pertinente a fecha del día 7 de noviembre del 2023 de 854 radicaciones, sin contar con aquellas cuyo estado son de invitación, informativos y/o varios, los cuales se encuentran debidamente discriminados por tipo de documento y año de gestión.

INFORME DE TRAMITES DESARROLLADOS POR LA DIRECCION TECNICA

Vigencia 2020

DOCUMENTO	Total
ACCIONES POPULARES	3
DERECHO DE PETICION-CONSULTAS	4
DERECHO DE PETICION-DE INTERES GENERAL	13
DERECHO DE PETICION-DE INTERES PARTICULAR	21
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE COPIAS	4





DOCUMENTO	Total
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INF. ENTRE ENTIDADES	3
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INFOR.	18
INCIDENTES Y DESACATOS	2
REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	16
TRAMITES JUDICIALES	3
TUTELA	4
Total	91

Vigencia 2021

DOCUMENTO	Total
ACCIONES POPULARES	2
DENUNCIAS	1
DERECHO DE PETICION-CONSULTAS	1
DERECHO DE PETICION-DE INTERES GENERAL	27
DERECHO DE PETICION-DE INTERES PARTICULAR	66
DERECHO DE PETICION-MANIFESTACIONES	1
DERECHO DE PETICION-QUEJAS	2
DERECHO DE PETICION-RECLAMOS	2
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE COPIAS	13
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INF. ENTRE ENTIDADES	32
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INFOR.	66
INCIDENTES Y DESACATOS	1
REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	109
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES	1
TRAMITES JUDICIALES	13
TUTELA	7
Total	344

Vigencia 2022

DOCUMENTO	Total
ACCIONES POPULARES	1
DENUNCIAS	1
DERECHO DE PETICION-DE INTERES GENERAL	24
DERECHO DE PETICION-DE INTERES PARTICULAR	35
DERECHO DE PETICION-RECLAMOS	2
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE COPIAS	6





DOCUMENTO	Total
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INF. ENTRE ENTIDADES	41
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INFOR.	33
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD INF. POR CONGRESISTAS	1
INCIDENTES Y DESACATOS	1
REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	130
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES	1
TRAMITE-PERMISO ROTURA PAVIMENTO	2
TRAMITES JUDICIALES	11
TUTELA	14
Total	303

Vigencia 2023

DOCUMENTO	Total
ACCIONES POPULARES	5
DERECHO DE PETICION-CONSULTAS	1
DERECHO DE PETICION-DE INTERES GENERAL	34
DERECHO DE PETICION-DE INTERES PARTICULAR	37
DERECHO DE PETICION-RECLAMOS	4
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE COPIAS	7
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INF. ENTRE ENTIDADES	31
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INFOR.	65
INCIDENTES Y DESACATOS	2
REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	144
TRAMITE-PERMISO ROTURA PAVIMENTO	1
TRAMITES JUDICIALES	7
TUTELA	18
Total	356

RESULTADO ESTADISTICO: De acuerdo a los cuadros de control relacionados se tiene que, el despacho de la secretaria de Infraestructura – Dirección Técnica, efectuó el trámite pertinente a fecha del día 7 de noviembre del 2023 de 1094 radicaciones, sin contar con aquellas cuyo estado son de invitación, informativos y/o varios, los cuales se encuentran debidamente discriminados por tipo de documento y año de gestión.





INFORME DE TRAMITES DESARROLLADOS POR DESPACHO GENERAL

Vigencia 2020

DOCUMENTO	No. OFICIOS
ACCIONES POPULARES	11
DERECHO DE PETICION-CONSULTAS	15
DERECHO DE PETICION-DE INTERES GENERAL	335
DERECHO DE PETICION-DE INTERES PARTICULAR	93
DERECHO DE PETICION-MANIFESTACIONES	1
DERECHO DE PETICION-QUEJAS	1
DERECHO DE PETICION-RECLAMOS	3
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE COPIAS	11
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INF. ENTRE ENTIDADES	19
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INFOR.	77
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD INF. POR CONGRESISTAS	1
INCIDENTES Y DESACATOS	13
REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	57
TRAMITE-NIVELES Y PARAMENTOS	1
TRAMITE-PERMISO ROTURA PAVIMENTO	83
TRAMITES JUDICIALES	63
TUTELA	58
Total	842

Vigencia 2021

DOCUMENTO	No. OFICIOS
ACCIONES POPULARES	8
DERECHO DE PETICION-DE INTERES GENERAL	17
DERECHO DE PETICION-DE INTERES PARTICULAR	21
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE COPIAS	1
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INF. ENTRE ENTIDADES	5
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INFOR.	23
INCIDENTES Y DESACATOS	4
REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	34
TRAMITE-CONCEPTO COMPATIBILIDAD DE USO	1
TRAMITE-NIVELES Y PARAMENTOS	1
TRAMITE-PERMISO ROTURA PAVIMENTO	8
TRAMITES JUDICIALES	14
TUTELA	16
Total	153





Vigencia 2022

DOCUMENTO	No. OFICIOS
ACCIONES POPULARES	19
DENUNCIAS	1
DERECHO DE PETICION-CONSULTAS	1
DERECHO DE PETICION-DE INTERES GENERAL	249
DERECHO DE PETICION-DE INTERES PARTICULAR	70
DERECHO DE PETICION-RECLAMOS	14
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE COPIAS	19
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INF. ENTRE ENTIDADES	64
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INFOR.	121
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD INF. POR CONGRESISTAS	1
INCIDENTES Y DESACATOS	19
LICENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO	12
RECURSO DE REPOSICION Y APELACION	2
REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	318
TRAMITE-CONCEPTO SANITARIO PISCINA	1
TRAMITE-NIVELES Y PARAMENTOS	1
TRAMITE-PERMISO ROTURA PAVIMENTO	67
TRAMITES JUDICIALES	90
TUTELA	90
Total	1159

Vigencia 2023

DOCUMENTO	No. OFICIOS
ACCIONES POPULARES	32
DERECHO DE PETICION-DE INTERES GENERAL	52
DERECHO DE PETICION-DE INTERES PARTICULAR	27
DERECHO DE PETICION-RECLAMOS	3
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE COPIAS	7
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INF. ENTRE ENTIDADES	20
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INFOR.	49
DERECHO DE PETICION-SOLICITUD INF. POR CONGRESISTAS	1
INCIDENTES Y DESACATOS	32
LICENCIA DE INTERVENCION Y OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO	7
REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	268
TRAMITE-CONCEPTO SANITARIO PISCINA	1
TRAMITE-INSTALACION ANTENAS	1
TRAMITE-LICENCIA DE INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO	3
TRAMITE-PERMISO ROTURA PAVIMENTO	42





DOCUMENTO	No. OFICIOS
TRAMITES JUDICIALES	109
TUTELA	127
Total	781

RESULTADO ESTADISTICO: De acuerdo a los cuadros de control relacionados se tiene que, el despacho de la secretaria de Infraestructura – Despacho general, efectuó el trámite pertinente a fecha del día 7 de noviembre del 2023 de 2.935 radicaciones, sin contar con aquellas cuyo estado son de invitación, informativos y/o varios, los cuales se encuentran debidamente discriminados por tipo de documento y año de gestión.

Conforme a lo anterior es necesario precisar que, se evidencia un comportamiento de crecimiento exponencial y/o aumento de las radicaciones objeto de tramite , pues es importante aclarar que , durante el periodo de las anualidades 2020 y 2021 , fueron presentadas pocas solicitudes , debido a los limitantes determinados por la pandemia del coronavirus COVID -19 , frente a las condiciones técnicas exigidas con imposibilidad de ejecución por las diversas acciones preventivas establecidas por el gobierno nacional.

En ese orden de ideas, se tiene que, a la fecha de presentación de este documento, la secretaria de infraestructura en articulación con las direcciones adscritas a la dependencia dio tramite a 4.883 requerimientos.

2. TRAMITES JUDICIALES PRIORIZADOS

ACCIONES POPULARES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Vigencia 2020

No.	No. RAD PISAMI	FECHA RADICACION	ENTIDAD JUDICIAL
1	2020-013334	19/02/2020	JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUE
2	2020-016093	28/02/2020	JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO
3	2020-026454	13/05/2020	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
4	2020-046107	4/09/2020	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE IBAGUE





No.	No. RAD PISAMI	FECHA RADICACION	ENTIDAD JUDICIAL
5	2020-056526	25/10/2020	JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUE
6	2020-057399	28/10/2020	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
7	2020-060183	11/11/2020	DESPACHO 2 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
8	2020-062443	23/11/2020	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
9	2020-063338	25/11/2020	JUZGADO SEXTO ADTIVO DEL CIRCUITO
10	2020-065975	7/12/2020	JUZGADO OCTAVO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

Vigencia 2021

No.	No. RAD PISAMI	FECHA RADICACION	ENTIDAD JUDICIAL
1	2021-014669	9/03/2021	JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUE
2	2021-014688	9/03/2021	JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
3	2021-014918	10/03/2021	juzgado noveno administrativo oral del circuito judicial de Ibagué
4	2021-016710	17/03/2021	JUZGADO OCTAVO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUE
5	2021-016827	17/03/2021	JUZGADO OCTAVO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
6	2021-020976	7/04/2021	Juzgado noveno administrativo oral del circuito
7	2021-020981	7/04/2021	JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
8	2021-020991	7/04/2021	JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL
9	2021-021100	8/04/2021	juzgado noveno administrativo
10	2021-022370	13/04/2021	juzgado noveno administrativo oral del circuito de Ibagué
11	2021-022373	13/04/2021	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
12	2021-022399	13/04/2021	JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUE
13	2021-035374	8/06/2021	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO





No.	No. RAD PISAMI	FECHA RADICACION	ENTIDAD JUDICIAL
14	2021-038188	22/06/2021	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
15	2021-038599	23/06/2021	Juzgado sexto administrativo del circuito de Ibagué
16	2021-039084	25/06/2021	Juzgado sexto administrativo del circuito de Ibagué
17	2021-043538	15/07/2021	JUZGADO OCTAVO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
18	2021-048472	3/08/2021	JUZGADO SÁPTIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
19	2021-050108	9/08/2021	JUZGADO NOVENO ORAL DEL CIRCUITO D EIBAGUE
20	2021-057279	6/09/2021	JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
21	2021-066940	12/10/2021	juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito
22	2021-067134	12/10/2021	JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUE
23	2021-067488	13/10/2021	JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUE
24	2021-067517	13/10/2021	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
25	2021-070984	28/10/2021	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
26	2021-071908	3/11/2021	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUE
27	2021-076685	22/11/2021	JUZGADO OCTAVO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

Vigencia 2022

No.	No. RAD PISAMI	FECHA RADICACION	ENTIDAD JUDICIAL
1	2022-004257	25/01/2022	JUZGADO OCTAVO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUE
2	2022-005138	28/01/2022	JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO





No.	No. RAD PISAMI	FECHA RADICACION	ENTIDAD JUDICIAL
3	2022-008574	10/02/2022	JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUE
4	2022-011283	21/02/2022	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
5	2022-016201	10/03/2022	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUE
6	2022-021114	29/03/2022	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO
7	2022-021269	30/03/2022	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUE
8	2022-021500	30/03/2022	Juzgado 02 Administrativo - Tolima
9	2022-021652	30/03/2022	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO
10	2022-022272	1/04/2022	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. ES.P. OFICIAL
11	2022-025099	18/04/2022	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
12	2022-031821	12/05/2022	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
13	2022-036160	27/05/2022	JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
14	2022-038807	6/06/2022	JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE IBAGUE
15	2022-052082	27/07/2022	Juzgado Once Administrativo del Circuito
16	2022-054772	5/08/2022	JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
17	2022-055810	9/08/2022	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
18	2022-056614	12/08/2022	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
19	2022-080658	11/11/2022	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO





Vigencia 2023

No.	No. RAD PISAMI	FECHA RADICACION	ENTIDAD JUDICIAL
1	2023-008807	8/02/2023	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
2	2023-011036	15/02/2023	JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCULO DE IBAGUE
3	2023-012164	20/02/2023	JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO.
4	2023-013304	23/02/2023	JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
5	2023-017300	7/03/2023	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
6	2023-018763	13/03/2023	JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
7	2023-023931	28/03/2023	JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL
8	2023-033007	2/05/2023	JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL
9	2023-035108	9/05/2023	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
10	2023-035268	9/05/2023	JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUE
11	2023-039870	25/05/2023	JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL IBAGUE TOLIMA
12	2023-044687	8/06/2023	JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUE
13	2023-049016	23/06/2023	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
14	2023-052837	7/07/2023	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
15	2023-056659	19/07/2023	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
16	2023-056663	19/07/2023	PERSONERIA MUNICIPAL DE IBAGUE
17	2023-056846	19/07/2023	GOBERNACION DEL TOLIMA
18	2023-057556	24/07/2023	JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUE





No.	No. RAD PISAMI	FECHA RADICACION	ENTIDAD JUDICIAL
19	2023-062825	10/08/2023	Juzgado 01 Administrativo - Tolima - Ibagué
20	2023-062826	10/08/2023	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
21	2023-063317	13/08/2023	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
22	2023-065089	18/08/2023	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO
23	2023-076390	22/09/2023	JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
24	2023-076412	22/09/2023	LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
25	2023-081870	10/10/2023	JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUE
26	2023-081976	10/10/2023	JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
27	2023-082138	11/10/2023	JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
28	2023-082254	11/10/2023	JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUE
29	2023-083167	13/10/2023	JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUE
30	2023-086286	24/10/2023	LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
31	2023-087591	30/10/2023	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE IBAGUE
32	2023-089277	5/11/2023	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

3. INCIDENTES DE DESACATO

Vigencia 2020

No. RADICACION	FECHA RADICACION	TIPO_DOCUMENTO	ESTADO
2020-031272	18/06/2020	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2020-031957	25/06/2020	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR





No. RADICACION	FECHA RADICACION	TIPO_DOCUMENTO	ESTADO
2020-034328	8/07/2020	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2020-045400	2/09/2020	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2020-046281	4/09/2020	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2020-047326	10/09/2020	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2020-048391	15/09/2020	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2020-048459	15/09/2020	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2020-049969	23/09/2020	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2020-052240	2/10/2020	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2020-054429	14/10/2020	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2020-056753	26/10/2020	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2020-059786	10/11/2020	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR

Vigencia 2021

No. RADICACION	FECHA RADICACION	TIPO_DOCUMENTO	ESTADO
2021-003778	26/01/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	EN TRAMITE
2021-003912	26/01/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	EN TRAMITE
2021-005179	31/01/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2021-005648	2/02/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2021-005675	2/02/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR





No. RADICACION	FECHA RADICACION	TIPO_DOCUMENTO	ESTADO
2021-018960	25/03/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2021-023823	19/04/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2021-024444	20/04/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2021-024492	20/04/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2021-025167	22/04/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2021-029414	12/05/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2021-029890	14/05/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2021-035552	9/06/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2021-064077	30/09/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2021-066776	11/10/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2021-074681	11/11/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	EN TRAMITE
2021-078754	30/11/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2021-080036	4/12/2021	INCIDENTES Y DESACATOS	RADICADO

Vigencia 2022

No. RADICACION	FECHA RADICACION	TIPO_DOCUMENTO	ESTADO
2022-003880	24/01/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2022-014681	4/03/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2022-015533	8/03/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2022-050955	25/07/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	EN TRAMITE





No. RADICACION	FECHA RADICACION	TIPO_DOCUMENTO	ESTADO
2022-055280	8/08/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	RADICADO
2022-058987	22/08/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	EN TRAMITE
2022-059392	23/08/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	EN TRAMITE
2022-070650	5/10/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	EN TRAMITE
2022-073346	18/10/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	RADICADO
2022-073699	19/10/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	RADICADO
2022-079104	8/11/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	EN TRAMITE
2022-079533	9/11/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	EN TRAMITE
2022-079660	9/11/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	EN TRAMITE
2022-080722	15/11/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	EN TRAMITE
2022-082724	22/11/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	EN TRAMITE
2022-082737	22/11/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2022-085219	30/11/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	EN TRAMITE
2022-086442	5/12/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2022-090998	27/12/2022	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR





Vigencia 2023

No. RADICACION	FECHA RADICACION	TIPO_DOCUMENTO	ESTADO
2023-018516	10/03/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-018570	11/03/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-033487	3/05/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-039806	25/05/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-044777	8/06/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-046420	14/06/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-050055	27/06/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-050074	27/06/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	RESUELTO
2023-051831	5/07/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-052191	6/07/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-052492	6/07/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	RESUELTO
2023-058213	25/07/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-060631	2/08/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-061402	6/08/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-061632	8/08/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-062819	10/08/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-062862	10/08/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-064401	16/08/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-065389	18/08/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-065391	18/08/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-068424	30/08/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-069170	31/08/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-075358	19/09/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-075443	20/09/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-076731	23/09/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR





No. RADICACION	FECHA RADICACION	TIPO_DOCUMENTO	ESTADO
2023-077149	25/09/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	PENDIENTE FINALIZAR
2023-081994	10/10/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	RADICADO
2023-082347	11/10/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	RADICADO
2023-085318	21/10/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	EN TRAMITE
2023-086140	24/10/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	EN TRAMITE
2023-088686	2/11/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	RADICADO
2023-088938	2/11/2023	INCIDENTES Y DESACATOS	EN TRAMITE

Ahora bien, con el ánimo de contribuir al proceso de cambio entre una administración y otra, este despacho ha adelantado acciones de seguimiento y control sobre casos concretos que representan riesgos de sanción, en el propósito de poner a disposición de los mandatarios salientes y entrantes un instrumento que permita llevar a buen término el traspaso de los asuntos territoriales, o proceso de empalme entre la actual administración territorial y la nueva autoridad electa.

PROCESOS PENDIENTES PARA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PUEBLES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

PUEBLES POR PROCESO DE CONSULTORIA – PENDIENTE DE ADJUDICACION.

PRIORIZACION CONSULTORIA PUEBLES Y MEDIDAS DE CONTENCIÓN POR M2							
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUEBLES VEHICULARES - PEATONALES Y MEDIDAS DE CONTENCIÓN EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ (VALOR CONSULTORIA+INTERVENTORIA)						631.636.315,80	
LOCALIZACION	VEHICULAR	PEATONAL	LARGO	ANCHO	DIMENSION M2	VALOR x M2	OBSERVACIONES
NECESIDADES DE PUEBLES							
Calle 24 Sur Nº 2-30 Límites entre el Barrio El Palmar -Arado parte baja y el Barrio Santofimio	X		25,00	9,00	225,00	68.625.000,00	
RINCON DE PEDREGAL La calleja del vergel N° 69-83.		X	12,00	2,50	30,00	11.700.000,00	NO HAY INFORME, CONFORME AL CUADRO REQUIERE DISEÑO ES UN PUENTE IMPROVISADO
PUEBTE DE LA CALLE 94 ENTRE SECTOR LA SAMARIA Y CIUDADELA SIMON BOLIVAR	X	X	94,00	8,00	752,00	229.360.000,00	
PUEBTE ENTRE BARRIO LA GAVIOTA Y ASENTAMIENTO URBANO ECOPARAISO	X		14,00	7,00	98,00	29.890.000,00	PILAS INCORPORAR DENTRO DE LOS PRODUCTOS ESTUDIO DE AVENIDAS TORRENCIALES
PUEBTE ENTRE BARRIO CIUDAD LUZ Y BARRIO ALFONSO URIBE BADILO CALLE 66 CON CARRERA 2a Y 1a HATO DE LA VIRGEN	X	X	20,00	7,00	140,00	42.700.000,00	
PUEBTE CALLE 103 SOBRE RIO CHIPALO SEGUNDA CALZADA (AJUSTE)	X		15,00	6,50	97,50	29.737.500,00	
		X	15,00	2,50	37,50	14.625.000,00	
PUEBTE CALLE 103 SOBRE QUEBRADA HATO DE LA VIRGEN ENTRE CIUD. SIMON BOLIVAR Y TOLIMA GRANDE	X	X	25,00	9,00	225,00	68.625.000,00	
PUEBTE EL LIMON (LIMITE PERIMETRO URBANO EL SALADO) SOBRE LA CALLE 144 SECTOR CALUCAIMA	X	X	15,00	9,00	135,00	41.175.000,00	LA ESTRUCTURA EXISTENTE NO CUMPLE CON LA NORMA DE SISMORESISTENCIA COMO TAMPOCO CONTIENE ANCHOS SUFICIENTES PARA 2 CARRILES DE ALTO RIESGO PARA LA COMUNIDAD Y MAQUINARIA AGRICOLA
					1.740,00	536.437.500,00	VALOR TOTAL CONSULTORIA PUEBLES





MUROS DE CONTENCIÓN – PENDIENTE ADJUDICACION PROCESO DE CONSULTORIA

LOCALIZACION	ACCESO VEHICULAR	ACCESO PEATONAL	LARGO	ALTO o ANCHO	DIMENSION M2	VALOR x M2	OBSERVACIONES
JAZMIN Calle 18 con carrera 28 bis sur y 30 sur			42,00	6,50	273,00	54.600.000,00	PRIORITARIO
Muro de contención alledaño a Las Viviendas Ubicadas sobre la Parte Alta de Cerro Gordo, Accion Popular Jose Maria Leyton			57,00	5,00	285,00	57.000.000,00	PRIORITARIO
Muro de Contencion ubicado a un costado del Puente Peatonal y la Quebrada El Tejar Barrio san isidro.			20,00	4,50	90,00	18.000.000,00	PRIORITARIO
Obras de Estabilizacion para la Calle 14 B entre Carreras 9 y Autopista Sur Barrio Ricaurte Parte Alta			95,00	1,50	142,50	28.500.000,00	PRIORITARIO
Talud natural (Ladera), situado en la calle 24 entre la carrera 2 y la avenida Ferrocarril Barrio Estación			20,00	10,00	200,00	40.000.000,00	PRIORITARIO
					2.469,00	198.100.000,00	VALOR TOTAL CONSULTORIA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN
CANTIDADES , AREA DEFINITIVA Y VALOR DE CONSULTORIA ACUMULADO					4.209,00	734.537.500,00	





Anexos

A continuación se relaciona la contratación de personal durante las vigencias 2020-2023 (31/10/23), de acuerdo a Proyecto de Inversión. En los soportes digitales la información está ampliada con los datos que corresponden a objetos, valores y rubros presupuestales.

Anexo 01: Listado de Contratistas 2023 (31 Oct)

Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
EQUIPAMIENTOS	587	10/03/2023	ALEXIS RAMIREZ PRIETO
EQUIPAMIENTOS	588	10/03/2023	ARISTOBULO JUSTINICO
EQUIPAMIENTOS	629	14/03/2023	IVON JAQUELINE CARDONA DIAZ
EQUIPAMIENTOS	712	17/03/2023	CRISTIAN CAMILO QUEZADA
EQUIPAMIENTOS	713	17/03/2023	MAIRA VIVIANA LOZADA CRUZ
EQUIPAMIENTOS	717	17/03/2023	NURY XIOMARA GOMEZ GALINDO
EQUIPAMIENTOS	814	23/03/2023	INGMAR ALEXANDER CAMPOS CASTELLANOS
EQUIPAMIENTOS	816	23/03/2023	IVAN ANDRES CASTRO ORTIZ
EQUIPAMIENTOS	819	23/03/2023	RAFAEL ANDRES TOVAR MANJARRES
EQUIPAMIENTOS	846	24/03/2023	ALEXANDER CABRERA RAMOS
EQUIPAMIENTOS	1003	29/03/2023	MONICA TATIANA MORALES VILLANUEVA
EQUIPAMIENTOS	1004	29/03/2023	LEIDY ALEXANDRA GALINDO SANTOS
EQUIPAMIENTOS	1025	29/03/2023	BERNARDO VLADIMIR ILICH AVILA MORALES
EQUIPAMIENTOS	1039	29/03/2023	DIANA PAOLA SANTOS ROGRIGUEZ
EQUIPAMIENTOS	1087	30/03/2023	PAULA ANDREA GARCIA VERGARA
EQUIPAMIENTOS	1148	31/03/2023	SERGIO PENAGOS PARRA
EQUIPAMIENTOS	1153	31/03/2023	SAMUEL IGNACIO USECHE AYERBE
EQUIPAMIENTOS	1154	31/03/2023	CARLOS FABIAN SARMIENTO AROCA
EQUIPAMIENTOS	1151	31/03/2023	LUIS FELIPE PERDOMO QUINTERO
EQUIPAMIENTOS	1176	11/04/2023	JORGE RICARDO ANDRES ORTIZ CESPEDES
EQUIPAMIENTOS	1174	11/04/2023	GINA BRIYITH BEJARANO MAHECHA
EQUIPAMIENTOS	1336	21/04/2023	ANDRES FLEIPE PINEDA RIVEROS
EQUIPAMIENTOS	1337	21/04/2023	JOSE JULIAN RAMIREZ PALMA
EQUIPAMIENTOS	1270	18/04/2023	NATHALIA ESCOBAR CALDERON
EQUIPAMIENTOS	1269	18/04/2023	JUAN CAMILO LOZANO MONTOYA





Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
EQUIPAMIENTOS	1471	5/05/2023	PEDRO JULIAN GALLEGO QUINTANA
EQUIPAMIENTOS	1469	5/05/2023	GLORIA CECILIA HURTADO CARDONA
EQUIPAMIENTOS	1472	5/05/2023	CARLOS TOMAS ANGEL GONZALEZ
EQUIPAMIENTOS	1564	11/05/2023	PAULA ANDREA HERNANDEZ GARZON
EQUIPAMIENTOS	1577	12/05/2023	MONICA MARCELA MORALES FLOREZ
EQUIPAMIENTOS	1640	18/05/2023	OLGA MERCEDES CORDOBA
EQUIPAMIENTOS	1641	18/05/2023	LAURA DANIELA NIETO ZULUETA
EQUIPAMIENTOS	2271	14/06/2023	LADY KATHERINE RODRIGUEZ OSPINA
EQUIPAMIENTOS	2054	27/06/2023	LINA MARIA URQUIZA COLLAZOS
EQUIPAMIENTOS	2055	27/06/2023	KATHERYN ALEJANDRA RODRIGUEZ MOGOLLON
EQUIPAMIENTOS	2132	4/07/2023	HEIDY CONSTANZA FLORIDO POVEDA
EQUIPAMIENTOS	2495	8/08/2023	LEIDY PAOLA CALDERONO FANDIÑO
EQUIPAMIENTOS	2496	8/08/2023	ALDO FERNANDO ORTIZ MARIN
EQUIPAMIENTOS	2526	11/08/2023	JINETH ALEXANDRA BAHAMON SAENZ
EQUIPAMIENTOS	2635	25/08/2023	DANIELA CARDONA GARCIA
EQUIPAMIENTOS	2634	25/08/2023	HUGO ARMANDO BRINEZ RODRIGUEZ
EQUIPAMIENTOS	2749	18/09/2023	ALEJANDRA MARGARITA SANCHEZ JIMENEZ
EQUIPAMIENTOS	2766	22/09/2023	LEYDI YOHANA RODRIGUEZ GIRON
EQUIPAMIENTOS	2854	12/10/2023	ADRIAN ARLEX GUERRERO FERNANDEZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	626	14/03/2023	JUAN CARLOS CASTRO PARDO
ESCENARIOS DEPORTIVOS	628	14/03/2023	EVELIN DE LAS MERCEDES GARCIA JARA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	716	17/03/2023	CRISTHIAN GUILLERMO ALTURO ALDANA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	817	23/03/2023	PAULA ANDREA ESPINOSA GONGORA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	976	29/03/2023	ALEJANDRA ALVARADO MENESES
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1001	29/03/2023	EDWIN ANDRES NIÑO RODRIGUEZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1021	29/03/2023	LEIDY CAMILA HERNANDEZ CARRILLO
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1024	29/03/2023	ANGIE DANIELA PRADA CARVAJAL
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1038	29/03/2023	CARLOS ANDRES BASTO LOPEZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1100	30/03/2023	ANDRES MAURICIO VARON RAMIREZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1815	7/06/2023	JESUS ALBERTO ESPAÑA VARGAS
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1977	23/06/2023	JORGE LEONARDO HERMIDA VALENZUELA
MALLA VIAL	719	17/03/2023	DIEGO FERNANDO CORTES ORTEGON





Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
MALLA VIAL	769	22/03/2023	MANUEL GUILLERMO GUARNIZO SAAVEDRA
MALLA VIAL	842	24/03/2023	LUCY CAROLINA CASTRO PINZON
MALLA VIAL	843	24/03/2023	JENNIFER NATALIA CARRETERO CASTILLO
MALLA VIAL	844	24/03/2023	JHON ALEXANDER SOTO GARCIA
MALLA VIAL	845	24/03/2023	JOSE HERNAN RIOS RIAÑO
MALLA VIAL	1002	29/03/2023	DIEGO FERNEY CIFUENTES RINCON
MALLA VIAL	1006	29/03/2023	MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL
MALLA VIAL	1022	29/03/2023	RONALD ANEUDI JIMENEZ LOMBANA
MALLA VIAL	1023	29/03/2023	FAVIAN ENRIQUE SEGURA PRADO
MALLA VIAL	1026	29/03/2023	GERMAN GIOVANNY TORRES AVILA
MALLA VIAL	1027	29/03/2023	OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
MALLA VIAL	1040	29/03/2023	GUILLERMO RODRIGUEZ MACHADO
MALLA VIAL	1042	30/03/2023	JUAN CARLOS ARBELAEZ
MALLA VIAL	1099	30/03/2023	FREDY ANDRES RINCON POLANIA
MALLA VIAL	1108	30/03/2023	ANDRES FELIPE PEREZ CRUSCO
MALLA VIAL	1150	31/03/2023	ANDRES FABIAN RIVERA LOZANO
MALLA VIAL	1156	31/03/2023	JUAN CARLOS ALFONSO PEREZ
MALLA VIAL	1165	31/03/2023	MARIA ALEJANDRA PUYO BEDOYA
MALLA VIAL	1175	11/04/2023	MEILLYN ANDREA VIDALES MARTINEZ
MALLA VIAL	1400	26/04/2023	JAIME FELIPE SANZ ACOSTA
MALLA VIAL	1403	26/04/2023	BRAHYAN CAMILO RODRIGUEZ QUINTERO
MALLA VIAL	1470	5/05/2023	LAURA VALENTINA VEGA
MALLA VIAL	1578	12/05/2023	IVAN ANDRES AREVALO TRUJILLO
MALLA VIAL	1595	12/05/2023	MARIA DEL ROSARIO MONROY
MALLA VIAL	1762	30/05/2023	JORGE ESTEBAN LADINO
MALLA VIAL	1814	7/06/2023	JUANITA MAZUERA TRONCOSO
MALLA VIAL	2004	26/06/2023	HAROLD ANDRES LEAL LERMA
MALLA VIAL	2005	26/06/2023	MARIA JOSE BONILLA RAMIREZ
MALLA VIAL	2116	30/06/2023	MATEO CASAS MIRANDA
MALLA VIAL	2204	10/07/2023	EDGAR ALEX MUÑOZ GARCIA
MALLA VIAL	2219	12/07/2023	JUAN CAMILO MUÑOZ OLIVARES
MALLA VIAL	2220	12/07/2023	LUIS FELIPE SILVA CALDERON





Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
MALLA VIAL	2257	13/07/2023	YENI CAROLINA ANGARITA REYES
MALLA VIAL	2366	26/07/2023	MANUEL FERNANDO ZAPATA PARGA
MALLA VIAL	2412	27/07/2023	IDALI RODRIGUEZ AVILAN
MALLA VIAL	2509	9/08/2023	CARLOS ALBERTO SALDAÑA VILLAREAL
MALLA VIAL	2527	11/08/2023	YAURI IVAN DIAZ LOPEZ
MALLA VIAL	2584	18/08/2023	YERLY PATRICIA CARDONA MONTOYA
MALLA VIAL	2661	28/08/2023	CLAUDIA YICED ANGARITA REYES
MALLA VIAL	2708	5/09/2023	ANDRY YAID VALDERRAMA GONZALEZ
MALLA VIAL	2715	7/09/2023	ANDRES FELIPE CARDOZO CASTILLO
MALLA VIAL	2735	12/09/2023	CARLOS IVAN MARTINEZ CANTILLO
MALLA VIAL	2762	21/09/2023	LUIS ANTONIO CASTRO GOMEZ
MALLA VIAL	2802	29/09/2023	EDUARDO HUEPA PENAGOS
MALLA VIAL	2803	29/09/2023	JEFERSON ANDRES SEPULVEDA FIERRO
MALLA VIAL	2855	12/10/2023	CATALINA GARCIA MENDEZ
VIVIENDA	585	10/03/2023	JALBER JOHATS BERMUDEZ MARTIN
VIVIENDA	586	10/03/2023	KATERINE PAVA GONZALEZ
VIVIENDA	589	10/03/2023	JUAN DAVID ACOSTA LOZANO
VIVIENDA	627	14/03/2023	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ VILLALBA
VIVIENDA	630	14/03/2023	ISABEL CRISTINA ARBELAEZ JARAMILLO
VIVIENDA	714	17/03/2023	RUBY ESMERALDA PRADO VASQUEZ
VIVIENDA	715	17/03/2023	CARLOS ANDRES TAFUR URUEÑA
VIVIENDA	815	25/03/2023	JUAN JOSE RAMOS BELLOS
VIVIENDA	840	24/03/2023	DANIEL GERARDO CARO GUTIERREZ
VIVIENDA	841	24/03/2023	MARIA FERNANDA BERMUDEZ HERNANDEZ
VIVIENDA	1005	29/03/2023	NICAHELA ANDREA PINEDA HUERTAS
VIVIENDA	1088	30/03/2023	LAURA XIMENA MORENO GARCIA
VIVIENDA	1152	31/03/2023	DIANA MARCELA IPUS GARZON
VIVIENDA	1155	31/03/2023	DANIEL MAURICIO SANCHEZ HOYOS
VIVIENDA	1359	24/04/2023	NARLLY STEPHANNY GARZON REYES
VIVIENDA	1749	29/05/2023	CRISTIAN FERNANDO TORRES RODRIGUEZ
VIVIENDA	2035	27/06/2023	LUIS LEONARDO CAMPOS CERVERA
VIVIENDA	2053	27/06/2023	JUAN MANUEL MORA GARCIA
VIVIENDA	2131	4/07/2023	BORIS ANDRES RODRIGUEZ USECHE





Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
VIVIENDA	2416	27/07/2023	MARIO ALEJANDRO HUELGOS REYES





Anexo 02: Listado de Contratistas 2022

Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
EQUIPAMIENTOS	126	17/01/2022	EVELIN GARCIA JARA
EQUIPAMIENTOS	127	17/01/2022	JOHANA MARCELA FERNANDEZ
EQUIPAMIENTOS	129	17/01/2022	PEDRO JULIAN GALLEGO
EQUIPAMIENTOS	131	17/01/2022	JALBER JOHATS BERMUDEZ MARTIN
EQUIPAMIENTOS	135	17/01/2022	SHARON DAYANA GUZMÁN GONZÁLEZ
EQUIPAMIENTOS	136	17/01/2022	ANTONELLA GOMEZ QUIJANO
EQUIPAMIENTOS	204	17/01/2022	JORGE ANDRES ZAMBRANO
EQUIPAMIENTOS	206	17/01/2022	ALEJANDRA ALVARADO MENESES
EQUIPAMIENTOS	402	19/01/2022	ALEXIS RAMIREZ PRIETO
EQUIPAMIENTOS	549	19/01/2022	ALEX GIOVANNI VELEZ
EQUIPAMIENTOS	550	19/01/2022	FREDY MAURICIO PERALTA
EQUIPAMIENTOS	552	19/01/2022	IVAN MAURICIO VILLANUEVA
EQUIPAMIENTOS	578	20/01/2022	HAROL ROLANDO WILCHES MACHADO
EQUIPAMIENTOS	1.214	23/01/2022	JAIME ESTEBAN BENEVIDES
EQUIPAMIENTOS	1.346	24/01/2022	RUTH ECHEVERRIA
EQUIPAMIENTOS	1.348	24/01/2022	DIANA CONSTANZA RODIRUGEZ OVIEDO
EQUIPAMIENTOS	1.496	25/01/2022	ANDRES FELIPE PINEDA
EQUIPAMIENTOS	1.497	25/01/2022	JORGE GUILLERMO ORTEGA
EQUIPAMIENTOS	1.499	25/01/2022	MAURICIO YEZID CASTELLANOS
EQUIPAMIENTOS	1.500	25/01/2022	ANDRES FELIPE PEREZ CRUSCO
EQUIPAMIENTOS	1.672	26/01/2022	ARISTOBULO JUSTINICO
EQUIPAMIENTOS	1.685	26/01/2022	PAULA ANDREA REMOLINA





Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
EQUIPAMIENTOS	1.687	26/01/2022	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ VILLALBA
EQUIPAMIENTOS	1.850	26/01/2022	JORGE RICARDO ANDRES ORTIZ CESPEDES
EQUIPAMIENTOS	1.998	27/01/2022	MIGUEL POVEDA CASTAÑEDA
EQUIPAMIENTOS	2.014	27/01/2022	YONNY BAUTISTA CARDENAS
EQUIPAMIENTOS	2.015	27/01/2022	PAULA VIVIANA REYES
EQUIPAMIENTOS	2.016	27/01/2022	CAMILO FERNANDO CALDERON SUAZA
EQUIPAMIENTOS	2.240	27/01/2022	LEYDI ALEXANDRA GALINDO SANTOS
EQUIPAMIENTOS	2.709	19/09/2022	JALBER JOHATS BERMUDEZ MARTIN
EQUIPAMIENTOS	2.715	19/09/2022	ALEXIS RAMIREZ PRIETO
EQUIPAMIENTOS	2.716	20/09/2022	FREDY MAURICIO PERALTA
EQUIPAMIENTOS	2.717	20/09/2022	JOHANA MARCELA FERNANDEZ
EQUIPAMIENTOS	2.726	21/09/2022	EVELIN GARCIA JARA
EQUIPAMIENTOS	2.779	23/09/2022	JORGE RICARDO ANDRES ORTIZ CESPEDES
EQUIPAMIENTOS	2.784	23/09/2022	LEYDI ALEXANDRA GALINDO SANTOS
EQUIPAMIENTOS	2.825	26/09/2022	PAULA ANDREA REMOLINA
EQUIPAMIENTOS	2.869	28/09/2022	ARISTOBULO JUSTINICO
EQUIPAMIENTOS	2.901	28/09/2022	RAFAEL ANDRES TOVAR MANJARREZ
EQUIPAMIENTOS	2.926	29/09/2022	ALEX GIOVANNI VELEZ
EQUIPAMIENTOS	2.975	30/09/2022	YONNY BAUTISTA CARDENAS
EQUIPAMIENTOS	3.020	5/10/2022	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ VILLALBA
EQUIPAMIENTOS	3.127	10/10/2022	JORGE GUILLERMO ORTEGA
EQUIPAMIENTOS	3.527	26/10/2022	DANIEL GIOVANNI CAPERA MUÑOZ





Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
EQUIPAMIENTOS	4.335	28/11/2022	MONICA MARCELA MORALES
EQUIPAMIENTOS	981	22/01/2022	ALEJANDRO ERNESTO MILLAN OSPINA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2.785	23/09/2022	RUBY ESMERALDA PRADO
ESCENARIOS DEPORTIVOS	128	17/01/2022	OSCAR ANDRES RIVERA VILLANUEVA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	130	17/01/2022	EDWIN ANDRES NIÑO RODRIGUEZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	205	17/01/2022	ANGIE JULIETH ROJAS
ESCENARIOS DEPORTIVOS	234	18/01/2022	CARLOS ANDRES BASTO LOPEZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	324	18/01/2022	MEILLYN ANDREA VIDALES
ESCENARIOS DEPORTIVOS	570	20/01/2022	CRISTHIAN ALTURO ALDANA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2.718	20/09/2022	ANGIE JULIETH ROJAS
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2.780	23/09/2022	DANIEL GERARDO CARO GUTIERREZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2.809	26/09/2022	EDWIN ANDRES NIÑO RODRIGUEZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2.819	26/09/2022	PAULA ANDREA GARCIA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2.906	28/09/2022	LUIS FELIPE SILVA CALDERON
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2.907	28/09/2022	DIEGO FERNANDO CORTES ORTEGON
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2.969	30/09/2022	ANDRES FELIPE PINEDA RIVEROS
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2.973	30/09/2022	MEILLYN ANDREA VIDALES
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2.974	30/09/2022	OSCAR ANDRES RIVERA VILLANUEVA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	3.159	11/10/2022	SERGIO PENAGOS PARRA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	3.231	13/10/2022	OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
ESCENARIOS DEPORTIVOS	3.482	25/10/2022	DIDIER STEVEN ARANGO REYES
ESCENARIOS DEPORTIVOS	3.808	16/11/2022	NARLLY STEPHANY GARZON REYES
ESCENARIOS DEPORTIVOS	3.988	16/11/2022	LUCY CAROLINA CASTRO PINZON
ESCENARIOS DEPORTIVOS	800	21/01/2022	RUBY ESMERALDA PRADO
ESCENARIOS DEPORTIVOS	829	21/01/2022	PAULA ANDREA GARCIA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	841	21/01/2022	DANIEL GERARDO CARO GUTIERREZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	574	20/01/2022	JAVIER ANDRES BONILLA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	575	20/01/2022	JOSE JULIAN RAMIREZ PALMA





Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1.065	22/01/2022	DIEGO FERNANDO PICON
MALLA VIAL	577	20/01/2022	CHRISTIAN CAMILO AGUDELO RENGIFO
MALLA VIAL	580	20/01/2022	JOSE HERNAN RIOS
MALLA VIAL	581	20/01/2022	LUIS FELIPE SILVA CALDERON
MALLA VIAL	1.069	22/01/2022	ANDREA CAROLINA RESTREPO ALBARELLO
MALLA VIAL	1.072	22/01/2022	GERMAN GIOVANNY TORRES AVILA
MALLA VIAL	1.084	22/01/2022	MARIA ALEJANDRA PUYO BEDOYA
MALLA VIAL	1.117	23/01/2022	EMILIANO PARRAGA PARRA
MALLA VIAL	1.118	23/01/2022	MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL
MALLA VIAL	1.252	23/01/2022	FREDY ANDRES RINCON POLANIA
MALLA VIAL	1.365	24/01/2022	DIEGO FERNANDO CORTES ORTEGON
MALLA VIAL	1.501	25/01/2022	JUAN CAMILO MUÑOZ OLIVARES
MALLA VIAL	1.673	26/01/2022	ADRIAN FERNANDO PARRA RODRIGUEZ
MALLA VIAL	2.007	27/01/2022	JUAN CAMILO LOZANO MONTOYA
MALLA VIAL	2.262	28/01/2022	GUILLERMO RODRIGUEZ MACHADO
MALLA VIAL	2.278	28/01/2022	LAURA XIMENA MORENO GARCIA
MALLA VIAL	2.295	28/01/2022	GESTIONARTE CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS
MALLA VIAL	2.305	28/01/2022	HECTOR ANDRES GARCIA
MALLA VIAL	2.306	28/01/2022	ANDRES FELIPE JIMENEZ RODRIGUEZ
MALLA VIAL	2.307	28/01/2022	MILTON CAMILO FERNANDEZ CORTES
MALLA VIAL	2.368	28/01/2022	DIDIER STEVEN ARANGO REYES
MALLA VIAL	2.786	23/09/2022	FREDY ANDRES RINCON POLANIA
MALLA VIAL	2.787	23/09/2022	MARIA ALEJANDRA PUYO BEDOYA
MALLA VIAL	2.836	27/09/2022	MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL
MALLA VIAL	2.837	27/09/2022	ANDREA CAROLINA RESTREPO ALBARELLO
MALLA VIAL	2.868	28/09/2022	GERMAN GIOVANNY TORRES AVILA
MALLA VIAL	2.980	30/09/2022	JOSE HERNAN RIOS
MALLA VIAL	3.019	5/10/2022	GUILLERMO RODRIGUEZ MACHADO
MALLA VIAL	3.110	10/10/2022	HAROLD ANDRES LEAL LERMA





Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
MALLA VIAL	3.374	20/10/2022	ANDRY YAID VALDERRAMA GONZALEZ
MALLA VIAL	3.378	20/10/2022	CRISTIAN CAMILO ROJAS MASMELA
MALLA VIAL	3.379	20/10/2022	JOHANA CATALINA ORTIZ TRUJILLO
MALLA VIAL	3.399	21/10/2022	LAURA XIMENA MORENO GARCIA
MALLA VIAL	3.447	24/10/2022	JUAN CAMILO MUÑOZ OLIVARES
MALLA VIAL	3.505	25/10/2022	ANDRES MAURICIO VARON RAMIREZ
MALLA VIAL	3.526	26/10/2022	DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ OVIEDO
MALLA VIAL	3.595	28/10/2022	IVAN ANDRES CASTRO ORTIZ
MALLA VIAL	3.708	1/11/2022	JOSE JULIAN RAMIEZ PALMA
MALLA VIAL	3.724	1/11/2022	CARLOS ANDRES TAFUR URUEÑA
MALLA VIAL	3.812	4/11/2022	JUAN CAMILO LOZANO MONTOYA
MALLA VIAL	3.883	10/11/2022	MANUEL GUILLERMO GUARNIZO SAAVEDRA
MALLA VIAL	3.888	10/11/2022	OSCAR JAVIER BONILLA CASTAÑO
MALLA VIAL	3.894	10/11/2022	CRISTIAN CAMILO QUEZADA
MALLA VIAL	3.907	10/11/2022	CRISTHIAN GUILLERMO ALTURO ALDANA
MALLA VIAL	3.908	10/11/2022	JESUS ALBERTO ESPAÑA VARGAS
MALLA VIAL	3.914	10/11/2022	NICAHELA ANDREA PINEDA HUERTAS
MALLA VIAL	3.940	11/11/2022	HUGO ARMANDO BRIÑEZ RODRIGUEZ
MALLA VIAL	4.185	22/11/2022	LAURA VIVIANA LEON CARDENAS
MALLA VIAL	4.186	22/11/2022	CRISTIAN FERNANDO TORRES RODRIGUEZ
MALLA VIAL	4.214	23/11/2022	LADY KATHERINE RODRIGUEZ OSPINA
MALLA VIAL	4.317	26/11/2022	MIGUEL SANTIAGO LASSO WATSON
MALLA VIAL	4.320	26/11/2022	GUILLERMO REY ROJAS
MALLA VIAL	4.323	26/11/2022	MAYRA VIVIANA LOZADA RUI
MALLA VIAL	4.331	28/11/2022	SHIRLEY TATIANA CARREÑO CASTRO
MALLA VIAL	4.366	30/11/2022	LUIS FELIPE PERDOMO QUINTERO
MALLA VIAL	4.367	30/11/2022	PAULA ANDREA HERNANDEZ
MALLA VIAL	4.442	1/12/2022	DIEGO FDO PICON GUERRA
MALLA VIAL	4.494	2/12/2022	EDUARDO HUEPA PENAGOS





Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
VIVIENDA	576	20/01/2022	SERGIO PENAGOS PARRA
VIVIENDA	2.714	19/09/2022	JUAN DAVID ACOSTA LOZANO
VIVIENDA	2.797	26/09/2022	KATERINA PAVA GONZALEZ
VIVIENDA	2.834	27/09/2022	MARIA FERNANDA BERMUDEZ HERNANDEZ
VIVIENDA	2.835	27/09/2022	JHON ALEXANDER SOTO G
VIVIENDA	2.948	29/09/2022	FELIPE ALBERTO JAUREGUI VALLEJO
VIVIENDA	2.949	29/09/2022	ISABEL CRISTINA ARBELAEZ
VIVIENDA	3.163	11/10/2022	WILLIAM HAROLD ARIAS OSPINA
VIVIENDA	3.164	11/10/2022	JUAN JOSE RAMOS BELLOS
VIVIENDA	743	20/01/2022	JHON ALEXANDER SOTO G
VIVIENDA	1.073	22/01/2022	JUAN FELIPE CORTES RUIZ
VIVIENDA	1.110	22/01/2022	FELIPE ALBERTO JAUREGUI VALLEJO
VIVIENDA	1.111	22/01/2022	ISABEL CRISTINA ARBELAEZ
VIVIENDA	1.112	22/01/2022	MARIA FERNANDA BERMUDEZ HERNANDEZ
VIVIENDA	1.245	23/01/2022	MARCO ANTONIO VASQUEZ MEDINA
VIVIENDA	1.347	24/01/2022	LUISA FERNANDA BONILLA
VIVIENDA	1.494	25/01/2022	KATERINA PAVA GONZALEZ
VIVIENDA	1.495	25/01/2022	ANGELA INES ZABALA GONZALEZ
VIVIENDA	1.498	25/01/2022	JUAN JOSE RAMOS BELLOS
VIVIENDA	1.664	26/01/2022	ERASMO ALEJANDRO TAFUR
VIVIENDA	1.686	26/01/2022	PAULA ANDREA HERNANDEZ GARZON
VIVIENDA	1.688	26/01/2022	WILLIAM HAROLD ARIAS OSPINA
VIVIENDA	1.851	26/01/2022	JUAN DAVID ACOSTA LOZANO





Anexo 03: Listado de Contratistas 2021

Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
ESCENARIOS DEPORTIVOS	3450	1/12/2021	RUBY ESMERALDA PRADO VASQUEZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	3451	1/12/2021	PAULA ANDREA GARCIA VERGARA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	3218	18/11/2021	JALBER BERMUDEZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	3254	19/11/2021	OSCAR ANDRES RIVERA VILLANUEVA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	3232	17/11/2021	PEDRO JULIAN GALLEGUO QUINTANA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	3244	19/11/2021	JOSE JULIAN RAMIREZ PALMA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2894	21/10/2021	ALEX GIOVANNI VELEZ HERNANDEZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1747	30/06/2021	RUBY ESMERALDA PRADO
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1831	14/07/2021	CARLOS ANDRES BASTO LOPEZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2224	30/08/2021	ALEXIS RAMIREZ PRIETO
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1954	30/07/2021	JAVIER ANDRES BONILLA MORALES
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2223	30/08/2021	SHARON DAYANA GUZMAN GONZALEZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1955	30/07/2021	DANIEL GERARDO CARO GUTIERREZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2032	11/08/2021	EDWIN ANDRES NIÑO
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2015	10/08/2021	EVELYN DE LAS MERCEDES GARCIA JARA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1929	29/07/2021	JORGE ELMER DIAZ MORALES





Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1000	16/04/2021	ALEX GIOVANNI VELEZ HERNANDEZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	629	17/03/2021	ALEXIS RAMIREZ PRIETO
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1606	8/06/2021	CAMILO FERNANDEZ CABEZAS
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1746	30/06/2021	CRISTHIAN GUILLERMO ARTURO ALDANA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	297	25/02/2021	EVELYN DE LAS MERCEDES GARCIA JARA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2228	30/08/2021	GILBERTO LOZANO PEREZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	884	9/04/2021	IVAN MAURICIO VILLANUEVA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1132	27/04/2021	JALBER JOHATS BERMUDEZ MARTIN
ESCENARIOS DEPORTIVOS	976	15/04/2021	JOSE HERNAN RIOS RIAÑO
ESCENARIOS DEPORTIVOS	422	2/03/2021	JOSE JULIAN RAMIREZ PALMA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	920	13/04/2021	MONICA EUGENIA RINCON ROJAS
ESCENARIOS DEPORTIVOS	803	6/04/2021	PEDRO JULIAN GALLEGO QUINTANA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1953	30/07/2021	RAUL BARBOSA VIÑA
ESCENARIOS DEPORTIVOS	369	2/03/2021	SHARON DAYANA GUZMAN GONZALEZ
MALLA VIAL	3130	9/11/2021	GUILLERMO RODRIGUEZ MACHADO / MEILLYN ANDREA
MALLA VIAL	3447	1/12/2021	FREDY ANDRES RINCON POLANIA
MALLA VIAL	2895	21/10/2021	JOSE ELVER JIMENEZ A





Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
MALLA VIAL	3285	22/11/2021	ANGIE ROJAS MILLAN
MALLA VIAL	3296	22/11/2021	HAROLD ROLANDO WILCHES MACHADO
MALLA VIAL	3276	19/11/2021	JOSE HERNAN RIOS RIAÑO
MALLA VIAL	2030	11/08/2021	BEATRIZ GARAY MONTILLA
MALLA VIAL	2029	11/08/2021	MONICA TATIANA MORALES VILLANUEVA
MALLA VIAL	2291	6/09/2021	MARIA ALEJANDRA PUYO
MALLA VIAL	274	23/02/2021	MONICA TATIANA MORALES VILLANUEVA
MALLA VIAL	1646	11/06/2021	ALEJANDRO ERNESTO MILLAN
MALLA VIAL	979	15/04/2021	JHON ALEXANDER SOTO GARCIA
MALLA VIAL	443	5/03/2021	MARIA ALEJANDRA PUYO
MALLA VIAL	2928	22/10/2021	JENNY MADELEINE POMAR CASTAÑO
MALLA VIAL	295	25/02/2021	GILBERTO LOZANO PEREZ
MALLA VIAL	273	23/02/2021	JHOAN LUINI RINCON GONZALEZ
MALLA VIAL	2227	30/08/2021	MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL
MALLA VIAL	327	26/02/2021	MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL
MALLA VIAL	291	24/02/2021	JOHANA MARCELA FERNANDEZ ORTIZ
MALLA VIAL	918	13/04/2021	RONALD STEPHEN PEÑA ZAPATA





Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
MALLA VIAL	2086	17/08/2021	WILLIAM JAVIER RODRIGUEZ ACOSTA
MALLA VIAL	1630	9/06/2021	HUMBERTO GONZALEZ MOSQUERA
MALLA VIAL	2028	11/08/2021	MANUEL GUILLERMO GUARNIZO
MALLA VIAL	3241	18/11/2021	CARLOS CEBALLOS ORDOÑEZ
VIVIENDA	3128	9/11/2021	MARIA FERNANDA BERMUDEZ
VIVIENDA	3118	8/11/2021	ERASMO ALEJANDRO TAFUR GUTIERREZ
VIVIENDA	3284	22/11/2021	LUISA FERNANDA BONILLA
VIVIENDA	3140	9/11/2021	JUAN DAVID ACOSTA LOZANO
VIVIENDA	3139	9/11/2021	LUIS FELIPE SILVA CALDERON
VIVIENDA	3108	5/11/2021	SERGIO PENAGOS
VIVIENDA	2353	3/09/2021	JUAN FELIPE CORTES
VIVIENDA	2239	30/08/2021	MARCO ANTONIO VASQUEZ MEDINA
VIVIENDA	2225	30/08/2021	CARLOS ALFREDO HERNANDEZ
VIVIENDA	326	26/02/2021	MARCO ANTONIO VASQUEZ MEDINA
VIVIENDA	641	18/03/2021	MARIA FERNANDA BERMUDEZ
VIVIENDA	2838	14/10/2021	CHRISTIAN CAMILO AGUDELO RENGIFO
VIVIENDA	1167	28/04/2021	ERASMO ALEJANDRO TAFUR GUTIERREZ





Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
VIVIENDA	742	25/03/2021	JOSE LIBARDO HERRERA LORO
VIVIENDA	802	6/04/2021	JUAN DAVID CEBALLOS
VIVIENDA	642	18/03/2021	JUAN FELIPE CORTES
VIVIENDA	329	26/02/2021	CARLOS ALFREDO HERNANDEZ
VIVIENDA	899	12/04/2021	LUISA FERNANDA BONILLA
VIVIENDA	2226	30/08/2021	JORGE ANDRES ZAMBRANO
VIVIENDA	2504	24/09/2021	KATERINA PAVA GONZALEZ
VIVIENDA	2610	30/09/2021	MARIA MARGARITA MEDINA TRIANA
VIVIENDA	2231	30/08/2021	ALEJANDRA ALVARADO MENESES
VIVIENDA	1236	3/05/2021	LUIS FELIPE SILVA CALDERON
VIVIENDA	292	24/02/2021	ALEJANDRA ALVARADO MENESES
VIVIENDA	375	2/03/2021	JORGE ANDRES ZAMBRANO
VIVIENDA	1213	30/04/2021	SERGIO PENAGOS
VIVIENDA	919	13/04/2021	CHRISTIAN CAMILO AGUDELO RENGIFO
VIVIENDA	1217	30/04/2021	JULIAN CAMILO CASTIBLANCO
VIVIENDA	848	8/04/2021	KATERINA PAVA GONZALEZ
VIVIENDA	1024	20/04/2021	OSCAR ANDRES RIVERA VILLANUEVA
VIVIENDA	1235	3/05/2021	RUTH PIEDAD ECHAVARRIA CAMPUZANO





Anexo 04: Listado de Contratistas 2020

Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
EQUIPAMIENTOS	269	07/04/2020	RUTH PIEDAD ECHAVARRIA CAMPUZANO
EQUIPAMIENTOS	650	02/06/2020	ALEJANDRA ALVARADO MENESES
EQUIPAMIENTOS	716	10/06/2020	JORGE ANDRES ZAMBRANO RODRIGUEZ
EQUIPAMIENTOS	754	17/06/2020	ALEX GIOVANNI VELEZ HERNANDEZ
EQUIPAMIENTOS	798	23/06/2020	JOSE HERNAN RIOS RIAÑO
EQUIPAMIENTOS	826	25/06/2020	SHARON DAYANA GUZMAN GONZALEZ
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1348	29/09/2020	PEDRO JULIAN GALLEGO Q
ESCENARIOS DEPORTIVOS	1946	18/11/2020	CONSORCIO ESTADIO MURILLO TORO
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2159	30/11/2020	JUAN CARLOS CASTRO PARDO
ESCENARIOS DEPORTIVOS	2161	30/11/2020	JOSE JULIAN RAMIREZ PALMA
MALLA VIAL	310	20/04/2020	JOHANNA MARCELA FERNANDEZ ORTIZ
MALLA VIAL	531	18/05/2020	RONALD STEPHEN PEÑA ZAPATA
MALLA VIAL	571	21/05/2020	SERGIO PENAGOS PARRA
MALLA VIAL	572	21/05/2020	LUIS FELIPE SILVA CALDERON
MALLA VIAL	667	04/06/2020	JOHAN LUINI RINCON GONZALEZ
MALLA VIAL	711	10/06/2020	HERNAN CESPEDES CESPEDES
MALLA VIAL	720	11/06/2020	JOSE POLICARPO QUINTERO C
MALLA VIAL	721	11/06/2020	GILBERTO LOZANO PEREZ
MALLA VIAL	767	17/06/2020	JOAQUIN RAMOS GUZMAN
MALLA VIAL	830	25/06/2020	JOSE FERNANDO ORTIZ RODRIGUEZ
MALLA VIAL	831	25/06/2020	WILSON ANDRES GARZON MENDOZA
MALLA VIAL	843	26/06/2020	JORGE LEONARDO BERMUDEZ MORENO
MALLA VIAL	845	26/06/2020	MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL





Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
MALLA VIAL	851	26/06/2020	RAMIRO VARON CAVIEDES
MALLA VIAL	877	02/07/2020	LUIS ALBERTO BOBADILLA GOMEZ
MALLA VIAL	988	28/07/2020	EVELIN DE LAS MERCEDES GARCIA JARA
MALLA VIAL	1003	29/07/2020	HUMBERTO GONZALEZ MOSQUERA
MALLA VIAL	1340	29/09/2020	MARIA ALEJANDRA PUYO BEDOYA
MALLA VIAL	1614	23/10/2020	MONICA TATIANA MORALES
MALLA VIAL	1618	26/10/2020	RUTH PIEDAD ECHAVARRARRIA
MALLA VIAL	1742	04/11/2020	MONICA EUGENIA RINCON ROJAS
MALLA VIAL	1951	19/11/2020	KEVIN BYRON ALMANZA
MALLA VIAL	2106	26/11/2020	JOHANNA MARCELA FERNANDEZ
VIVIENDA	1265	22/09/2020	JUAN DAVID CEBALLOS
VIVIENDA	1300	28/09/2020	SOFY ALEJANDRA BENAVIDES TRUJILLO
VIVIENDA	1335	29/09/2020	JOHAN SEBASTIAN DIAZ CARDENAS
VIVIENDA	1345	29/09/2020	KATERINA PAVA GONZALEZ
VIVIENDA	1346	29/09/2020	YULIETH AMANDA CRIOLLO FORERO
VIVIENDA	1349	29/09/2020	DAYANA ALEJANDRA URUEÑA
VIVIENDA	1350	29/09/2020	JUAN FELIPE CORTES
VIVIENDA	1554	20/10/2020	PAULA ANDREA REMOLINA
VIVIENDA	1555	20/10/2020	RUBY ESPERANZA PRADO
VIVIENDA	1583	22/10/2020	MARIA FDA BERMUDEZ HDEZ
VIVIENDA	1615	26/10/2020	JHON ALEXANDER SOTO GARCIA
VIVIENDA	1619	26/10/2020	JOSE LIBARDO HERRERA LORO
VIVIENDA	1771	05/11/2020	MARCO ANTONIO VASQUEZ MEDINA





Proyecto	Contrato	Fecha	Contratista
VIVIENDA	1968	19/11/2020	ELIANA MARCELA RENGIFO
VIVIENDA	2032	24/11/2020	CARLOS ALFREDO HERNANDEZ FAJARDO
VIVIENDA	2108	27/11/2020	ERASMO ALEJANDRO TAFUR
VIVIENDA	765	17/06/2020	RUBY ESPERANZA PRADO VASQUEZ
VIVIENDA	766	17/06/2020	PAULA ANDREA REMOLINA PULECIO
VIVIENDA	777	18/06/2020	ELIANA MARCELA RENGIFO RENGIFO





IBAGUÉ EVOLUCIONÓ

**LO DIJIMOS,
LO CUMPLIMOS**



IBAGUÉ VIBRA



