

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	12 feb '23							
						X	J	V	S	D	L	M	
1	<b>PLAN DE FORMALIZACIÓN LABORAL Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ</b>	211 días	sáb 11/03/23	vie 29/12/23									
2	<b>ETAPA 1. ALISTAMIENTO Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL</b>	38 días	sáb 11/03/23	mar 2/05/23									
3	Elaborar el Plan de Trabajo, en donde se determinen las actividades necesarias, así como la metodología a utilizar	3 días	sáb 11/03/23	mar 14/03/23									
4	Definición de la estrategia de gestión del cambio, que le permitirá a la entidad disminuir riesgos jurídicos y dignificar los vínculos laborales	5 días	mié 15/03/23	mar 21/03/23	3								
5	<b>Realizar la conformación de un equipo técnico multidisciplinario destinado a consolidar la información y elaborar el documento técnico final y el cronograma de trabajo,</b>	2 días	vie 10/02/23	lun 13/02/23									
6	Proyección y adopción Resolución Equipo Técnico	15 días	mié 22/03/23	mar 11/04/23	4								
7	<b>Reuniones Equipo Técnico</b>		vie 10/02/23										
8	Sesión 01	1 día	mar 2/05/23	mar 2/05/23									
9	Sesión 02	1 día	mar 6/06/23	mar 6/06/23									
10	Sesión 03	1 día	mar 4/07/23	mar 4/07/23									
11	Sesión 04	1 día	mar 1/08/23	mar 1/08/23									
12	Sesión 05	1 día	mar 5/09/23	mar 5/09/23									
13	Sesión 06	1 día	mar 3/10/23	mar 3/10/23									
14	Realizar la recopilación y análisis de los datos necesarios para realizar el diagnóstico de la situación actual del modelo organizacional con el cual está operando la Entidad actualmente	30 días	mié 22/03/23	mar 2/05/23	4								
15	<b>Realizar el diagnóstico institucional con los siguientes aspectos</b>	25 días	mié 22/03/23	mar 25/04/23									
16	1. Análisis de contexto externo. Incluye la identificación y análisis de todos los aspectos externos que puedan afectar el desarrollo normal de sus funciones, la prestación y entrega de sus servicios	8 días	mié 22/03/23	vie 31/03/23									

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R Fecha: mié 26/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	12 feb '23						
						X	J	V	S	D	L	M
17	a) Análisis sectorial. Consiste en un análisis del sector, de la(s) política(s) pública(s) a cargo de la Entidad y de las funciones que desarrolla en su contexto, para con ello elaborar el diagnóstico de sus	5 días	mié 22/03/23	mar 28/03/23								
18	b) Análisis jurídico legal. Contiene todo el soporte y análisis legal, que incluye las normas principales que regulan su misionalidad (Constitución Política, leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, ordenanzas, circulares, CONPES, y sentencias.	5 días	mié 22/03/23	mar 28/03/23								
19	c) Análisis de casos de éxito. Incluye una lista con los casos de éxito y buenas prácticas locales o internacionales. que puedan ser valiosos para el del proceso de formalización laboral que planteó su entidad.	5 días	mié 22/03/23	mar 28/03/23								
20	d) Análisis de fuentes externas. Contiene la revisión y documentación de las fuentes externas, como indicadores o índices, informes de gestión, hallazgos o glosas de los entes de control, y recomendaciones	5 días	mié 22/03/23	mar 28/03/23								
21	2. Análisis de contexto interno. Incluye la revisión de las competencias administrativas sobre las que ejerce su misionalidad la entidad, ejecuta funciones, lleva a cabo procesos productivos y entrega bienes y servicios a corto, mediano y largo plazo	9 días	sáb 1/04/23	mié 12/04/23								
22	Análisis de la Cadena de valor de resultados y procesos.	5 días	sáb 1/04/23	jue 6/04/23								
23	Análisis del marco estratégico vigente.	5 días	vie 7/04/23	jue 13/04/23	22							
24	Análisis de las capacidades institucionales. Este análisis incluye aspectos como tecnología, presupuesto, estructura organizacional y talento humano con el fin de lograr un proceso de fortalecimiento institucional para la formalización laboral por un trab	5 días	mié 19/04/23	mar 25/04/23	23							
25	<b>ETAPA 2. DISEÑO DE LA PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA FORMALIZACIÓN LABORAL - POR UN TRABAJO DIGNO Y EN EQUIDAD.</b>	<b>104 días</b>	<b>vie 10/03/23</b>	<b>mié 2/08/23</b>								

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R Fecha: mié 26/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	12 feb '23							
						X	J	V	S	D	L	M	
26	<b>Actualizar Estudio Técnico, según la estructura y extensión definidos en la Guía de fortalecimiento institucional - Construcción de un documento técnico para la formalización laboral, por un trabajo digno y en equidad. Versión 01. Noviembre de 2022.</b>	104 días	vie 10/03/23	mié 2/08/23									
27	<b>FASE 1. Diagnóstico Institucional</b>	25 días	mié 22/03/23	mar 25/04/23									
28	Análisis Contexto Interno	25 días	mié 22/03/23	mar 25/04/23									
29	Análisis Contexto Externo	25 días	mié 22/03/23	mar 25/04/23									
30	<b>FASE 2. Propuesta de ajuste a la Cadena de Valor y al Modelo de Operación por Procesos</b>	20 días	mié 26/04/23	mar 23/05/23									
31	Recolección de información	10 días	mié 26/04/23	mar 9/05/23									
32	Análisis y validación de la información	10 días	mié 10/05/23	mar 23/05/23 31									
33	Consolidación	5 días	jue 11/05/23	mié 17/05/23 32									
34	<b>FASE 3. Propuesta de fortalecimiento y desarrollo de capacidades, con los siguientes aspectos:</b>	104 días	vie 10/03/23	mié 2/08/23									
35	Capacidades Tecnológicas. Ajuste a la estrategia de transformación digital de la entidad asociada a la eficiencia de los procesos y a la entrega de productos y servicios.	10 días	jue 18/05/23	mié 31/05/23									
36	Presupuestales. Identificación y descripción de las alternativas de financiamiento para mejorar la operación de la entidad a costo cero.	15 días	jue 18/05/23	mié 7/06/23									
37	Estructura organizacional. Incluye necesidades de ajuste a la estructura organizacional vigente para mejorar la actual división del trabajo, el nivel de departamentalización, la cantidad de tramos de control y el nivel de autoridad existente.	10 días	jue 18/05/23	mié 31/05/23									

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	12 feb '23							
						X	J	V	S	D	L	M	
38	Talento humano. Incluye procesos de disminución de brechas de capital humano, mejora de los perfiles ocupacionales y funcionales y, con base en esto, plantear la creación de plantas temporales durante un periodo de transición.	10 días	jue 18/05/23	mié 31/05/23									
39	<b>Definición de planta de personal</b>	<b>47 días</b>	<b>mar 2/05/23</b>	<b>mié 5/07/23</b>									
40	Recolección de información Cargas Laborales												
41	Procesos Estratégicos	10 días	mar 2/05/23	lun 15/05/23									
42	Procesos Misionales	30 días	mar 2/05/23	lun 12/06/23									
43	Procesos de Apoyo	30 días	mar 2/05/23	lun 12/06/23									
44	Procesos de Evaluación	5 días	mar 23/05/23	lun 29/05/23	43								
45	Consolidación de necesidades Vs. Aspectos a considerar	5 días	mar 13/06/23	lun 19/06/23									
46	Validación con los jefes inmediatos	20 días	jue 1/06/23	mié 28/06/23									
47	Generación nueva propuesta de planta de personal	5 días	jue 29/06/23	mié 5/07/23									
48	<b>Manual específico de funciones y competencias laborales</b>	<b>1 día?</b>	<b>vie 10/03/23</b>	<b>vie 10/03/23</b>									
49	Actualización de la estructura del documento - Funciones Transversales - Requisitos	5 días	jue 1/06/23	mié 7/06/23									
50	Actualización Perfiles de los Cargos												
51	Nivel Directivo	5 días	jue 8/06/23	mié 14/06/23	49								
52	Nivel Asesor	5 días	jue 15/06/23	mié 21/06/23	51								
53	Nivel Profesional	15 días	jue 8/06/23	mié 28/06/23	52								
54	Nivel Técnico	10 días	jue 8/06/23	mié 21/06/23	53								
55	Nivel Asistencial	10 días	jue 22/06/23	mié 5/07/23	54								
56	Validación y ajustes de la información	5 días	jue 6/07/23	mié 12/07/23	55								
57	Consolidado final del documento	15 días	jue 13/07/23	mié 2/08/23	56								

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R Fecha: mié 26/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	12 feb '23								
						X	J	V	S	D	L	M		
58	<b>ETAPA 3. SOCIALIZACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA FORMALIZACIÓN LABORAL - POR UN TRABAJO DIGNO Y EN EQUIDAD.</b>	<b>109 días</b>	<b>mar 1/08/23</b>	<b>vie 29/12/23</b>										
59	Generar las Guías o Procedimientos para la selección del personal en el marco de los lineamientos definidos por la normatividad vigente	15 días	mar 1/08/23	lun 21/08/23										
60	Realizar la formulación y aprobación de los actos administrativos para la implementación del fortalecimiento institucional para la formalización laboral - por un trabajo digno y en equidad	10 días	mar 22/08/23	lun 4/09/23	59									
61	Presentación ante la Alta Dirección de los resultados del Estudio de Formalización Laboral para su análisis	20 días	mar 5/09/23	lun 2/10/23	60									
62	Aprobación de los resultados del Estudio de Formalización Laboral	5 días	mié 1/11/23	mar 7/11/23										
63	Realizar los procesos de socialización y comunicación de la estrategia de cambio y demás actividades de sensibilización y socialización, requeridas para la apropiación del proceso de fortalecimiento institucional para la formalización laboral.	8 días	mié 8/11/23	vie 17/11/23	62									
64	Estudio por parte de la CNSC de la nueva planta temporal y verificación de existencia de lista de elegibles	8 días	mié 8/11/23	vie 17/11/23										
65	<b>Adelantar procesos meritocráticos para la provisión de los cargos</b>	<b>30 días</b>	<b>lun 20/11/23</b>	<b>vie 29/12/23</b>										
66	Convocatorias de Encargo	5 días	lun 20/11/23	vie 24/11/23										
67	Convocatorias Cerradas	10 días	lun 27/11/23	vie 8/12/23	66									
68	Convocatorias Abiertas	15 días	lun 11/12/23	vie 29/12/23	67									
69	Provisión de la planta	21 días	vie 1/12/23	vie 29/12/23										
70	Cierre del proceso de formalización laboral	1 día	vie 29/12/23	vie 29/12/23										


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

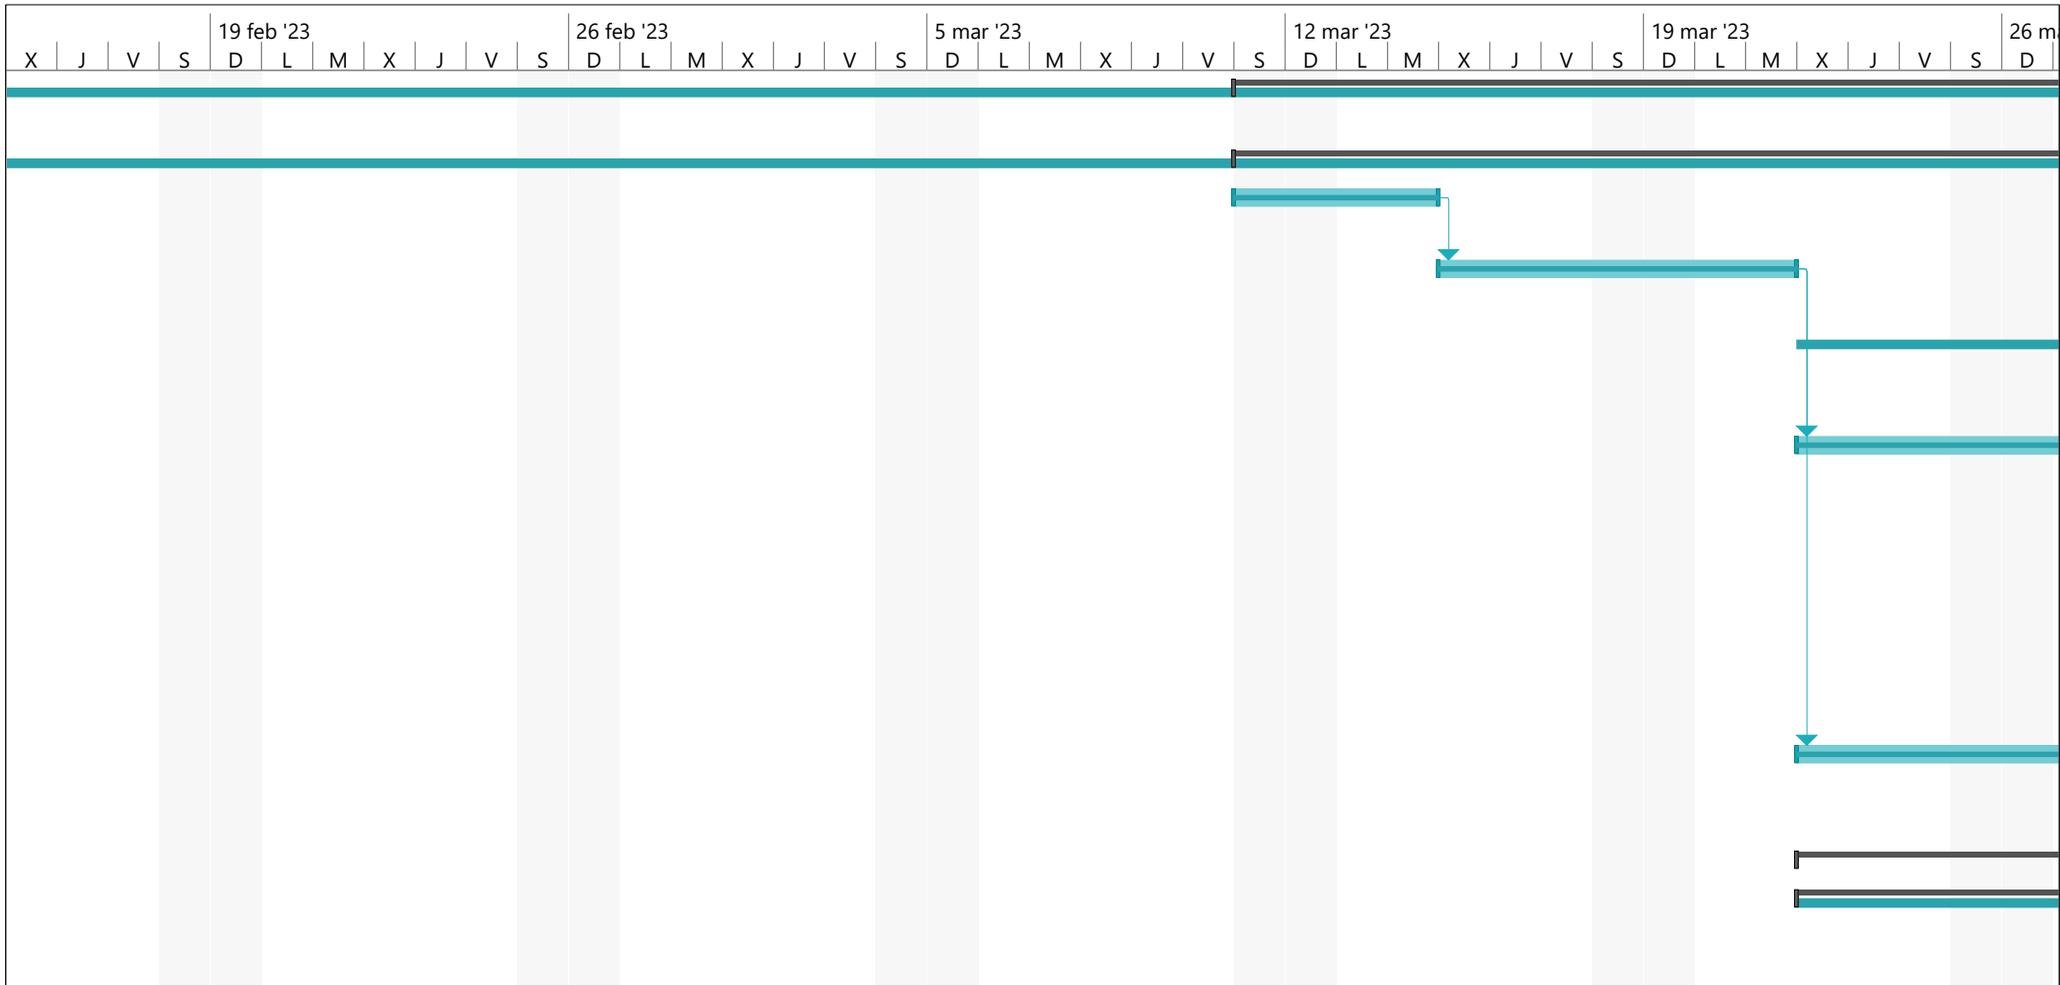


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

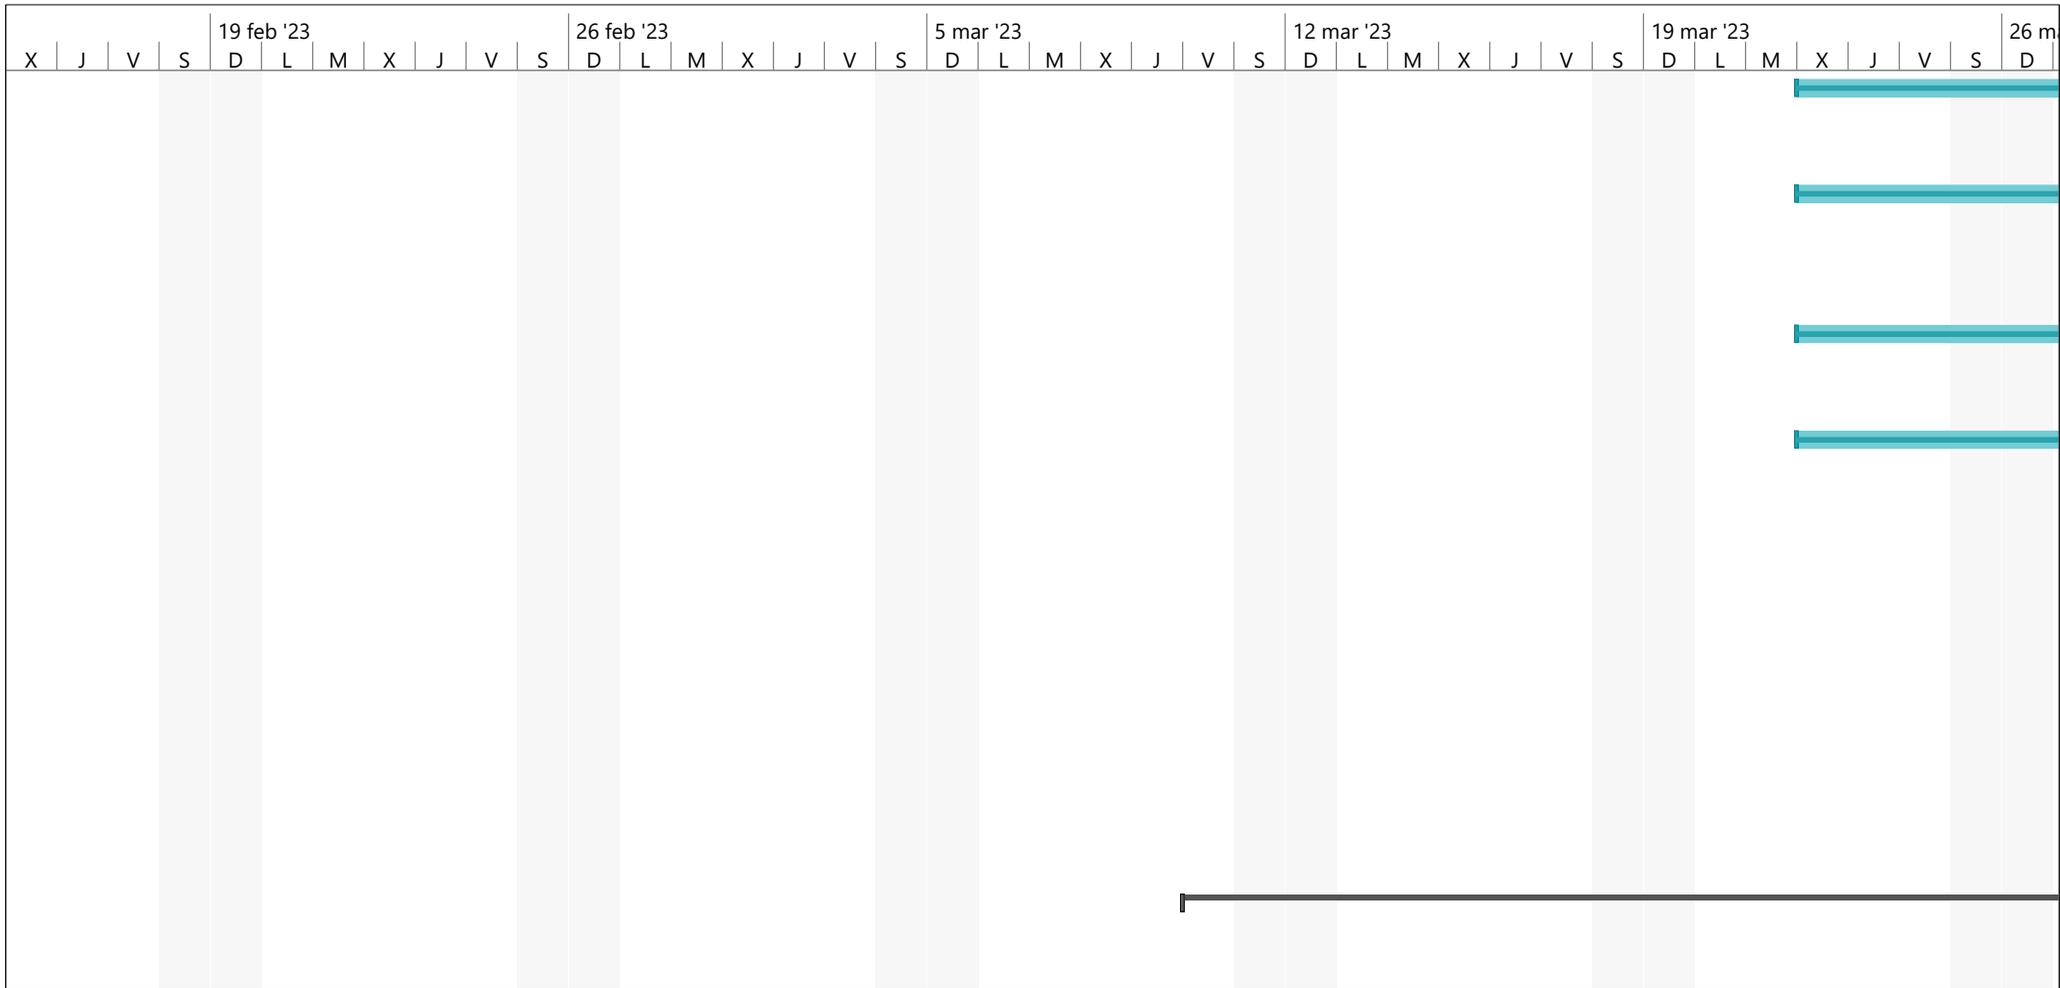


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

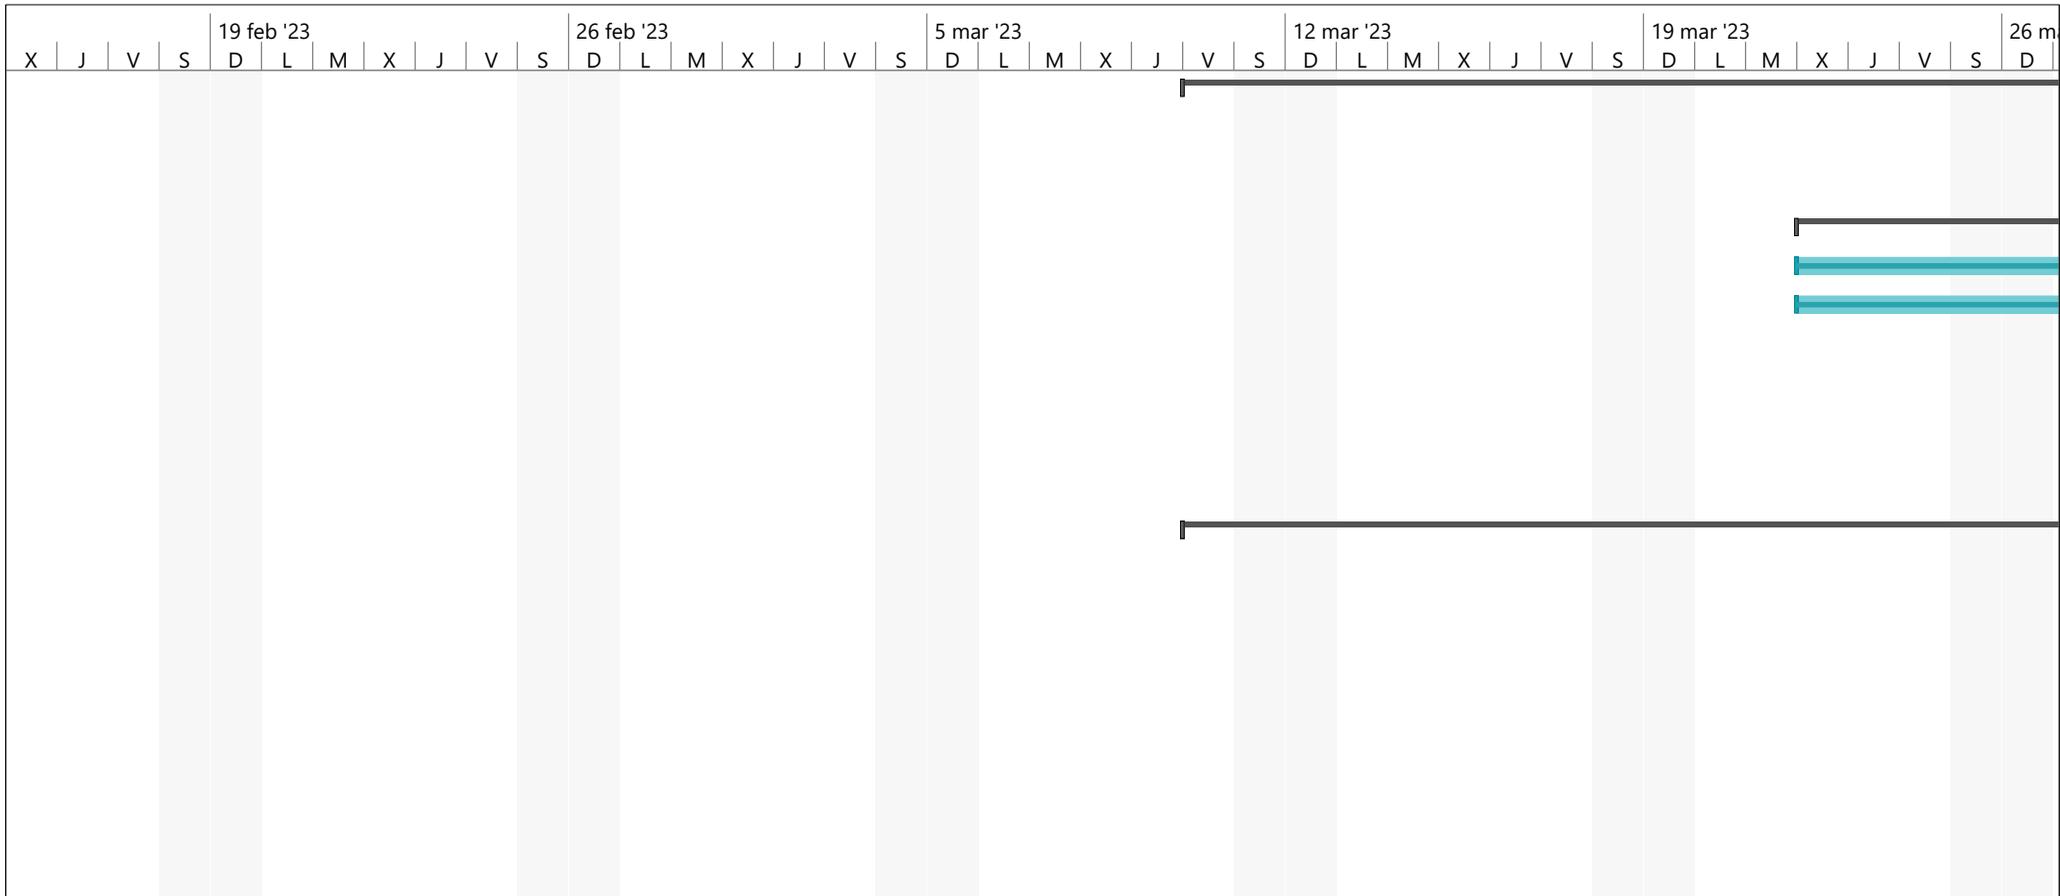


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

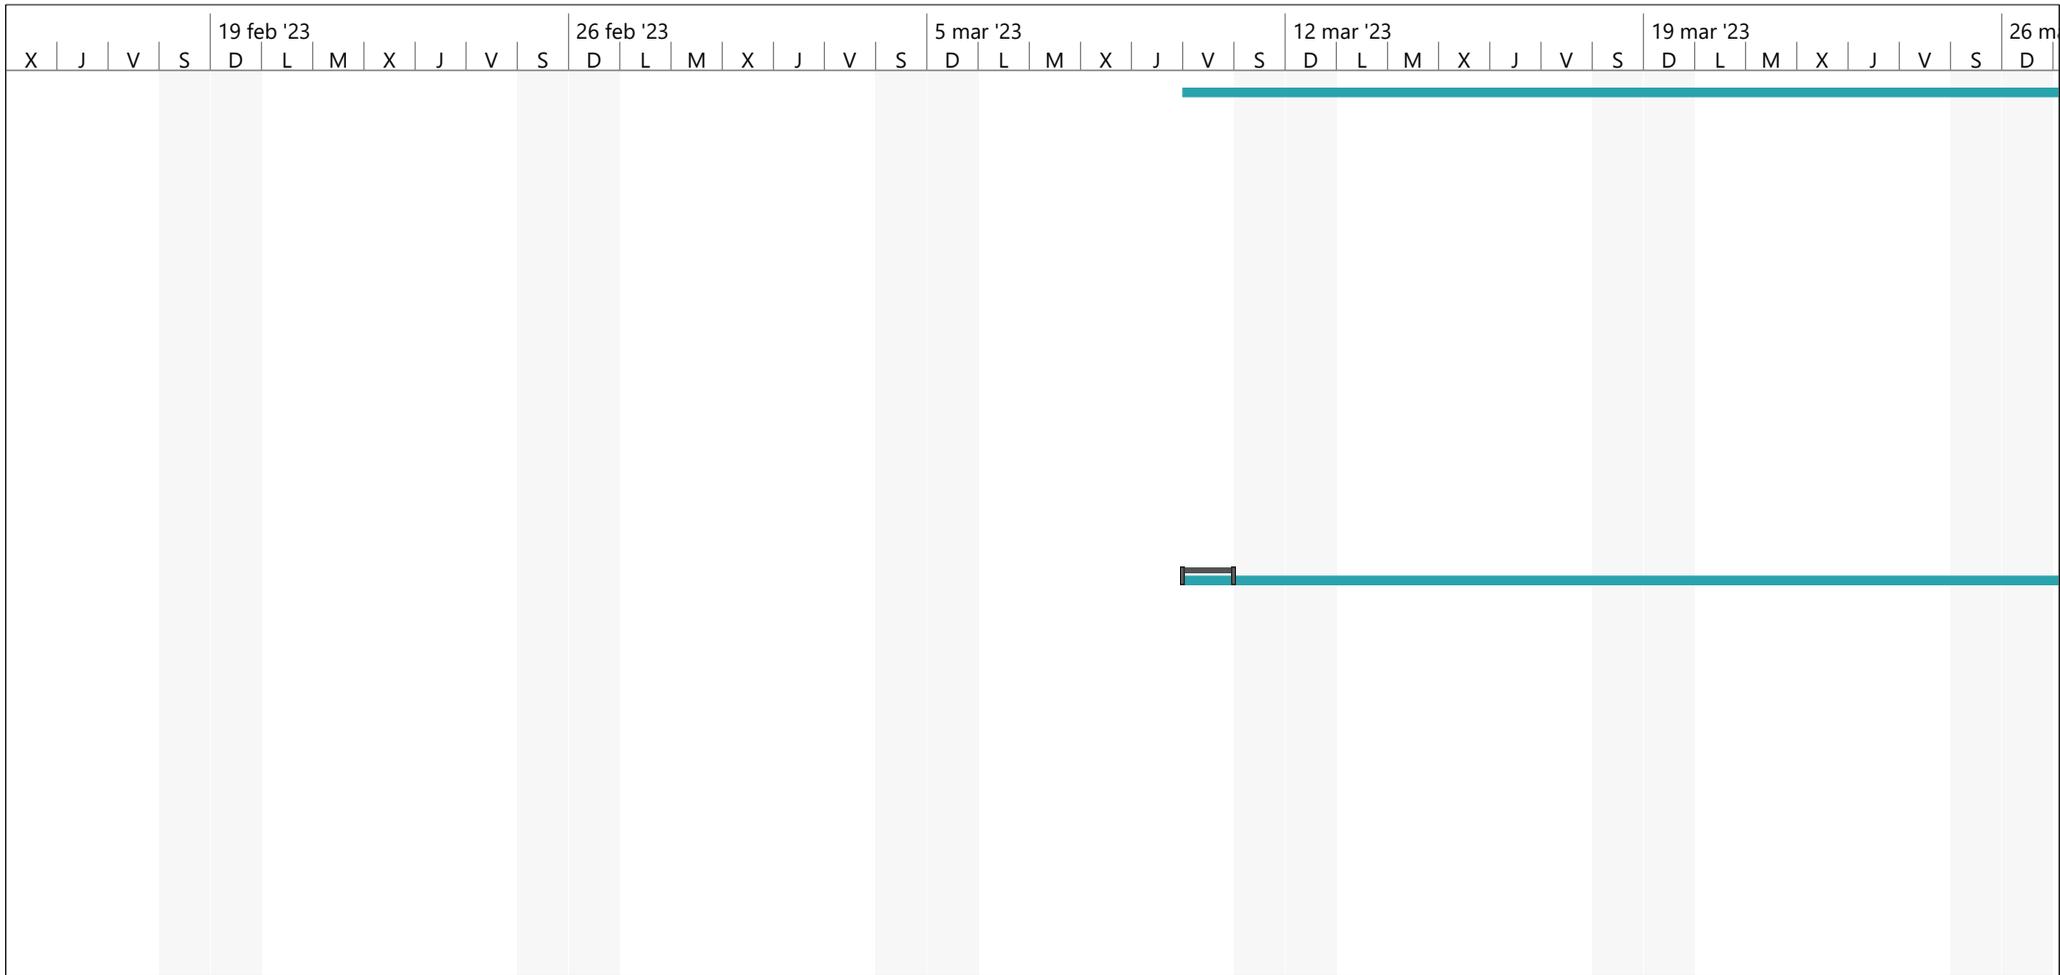

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

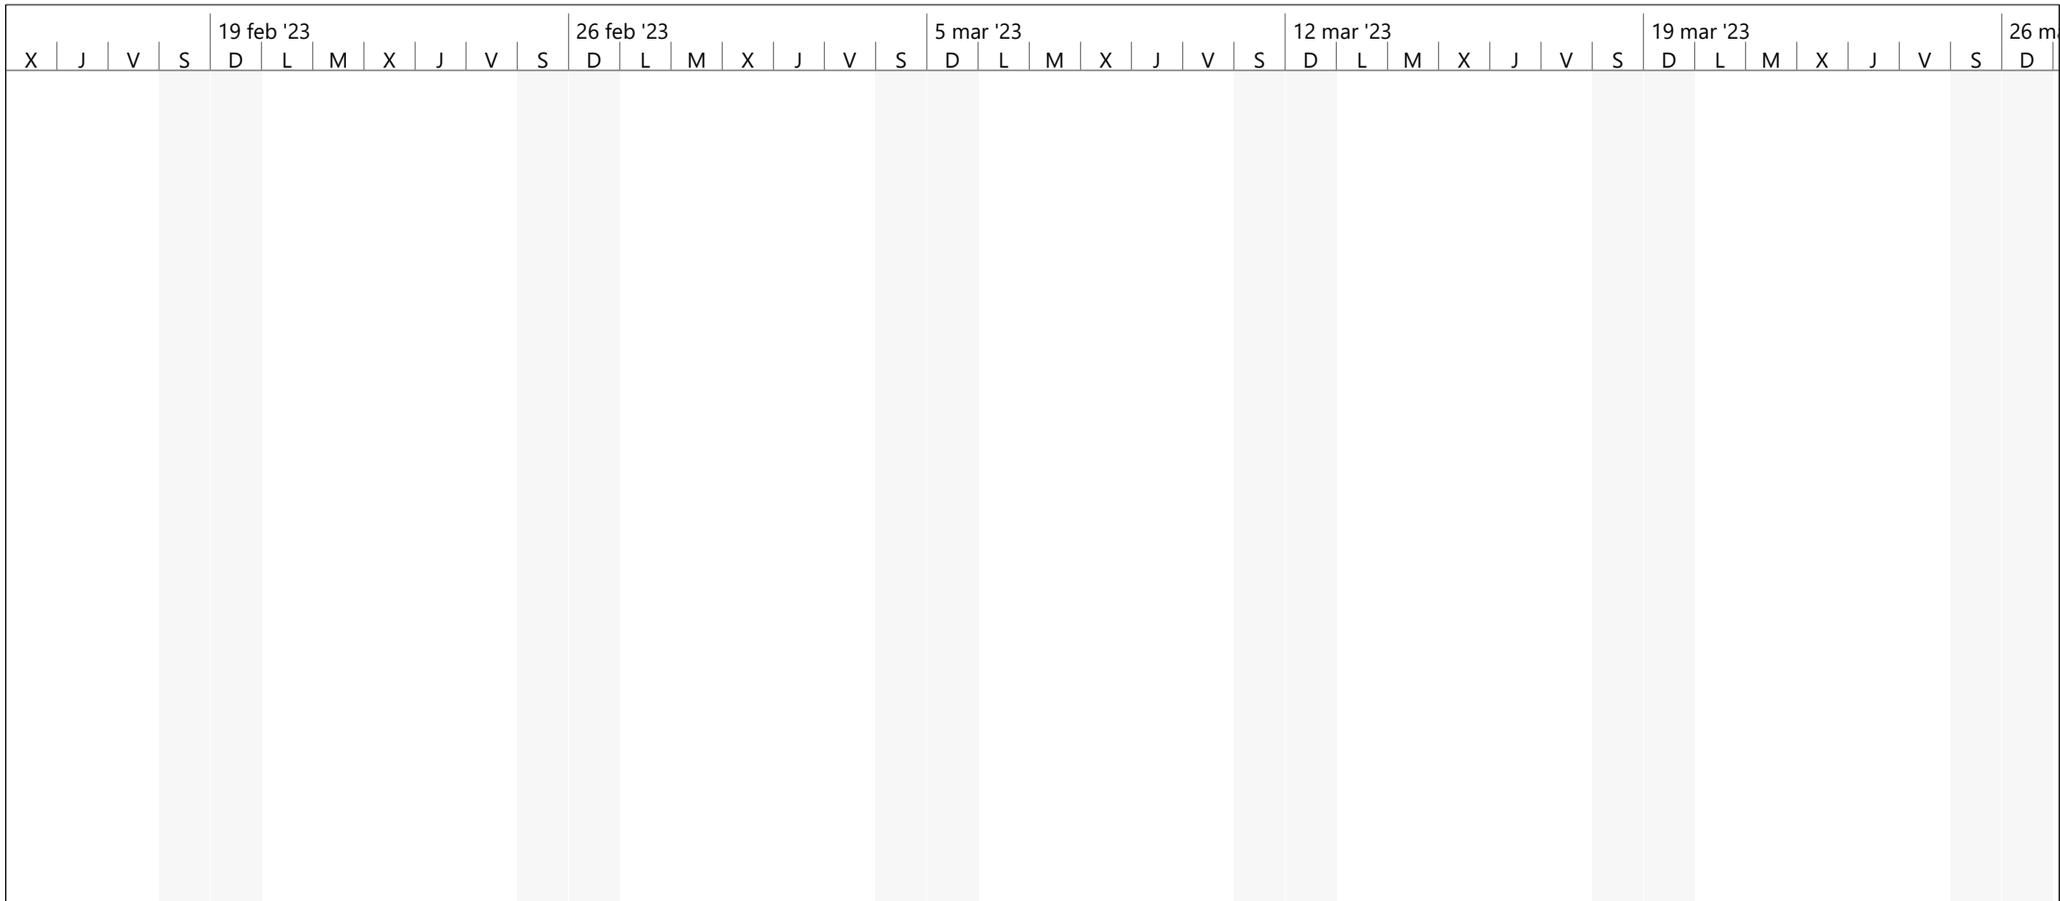


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



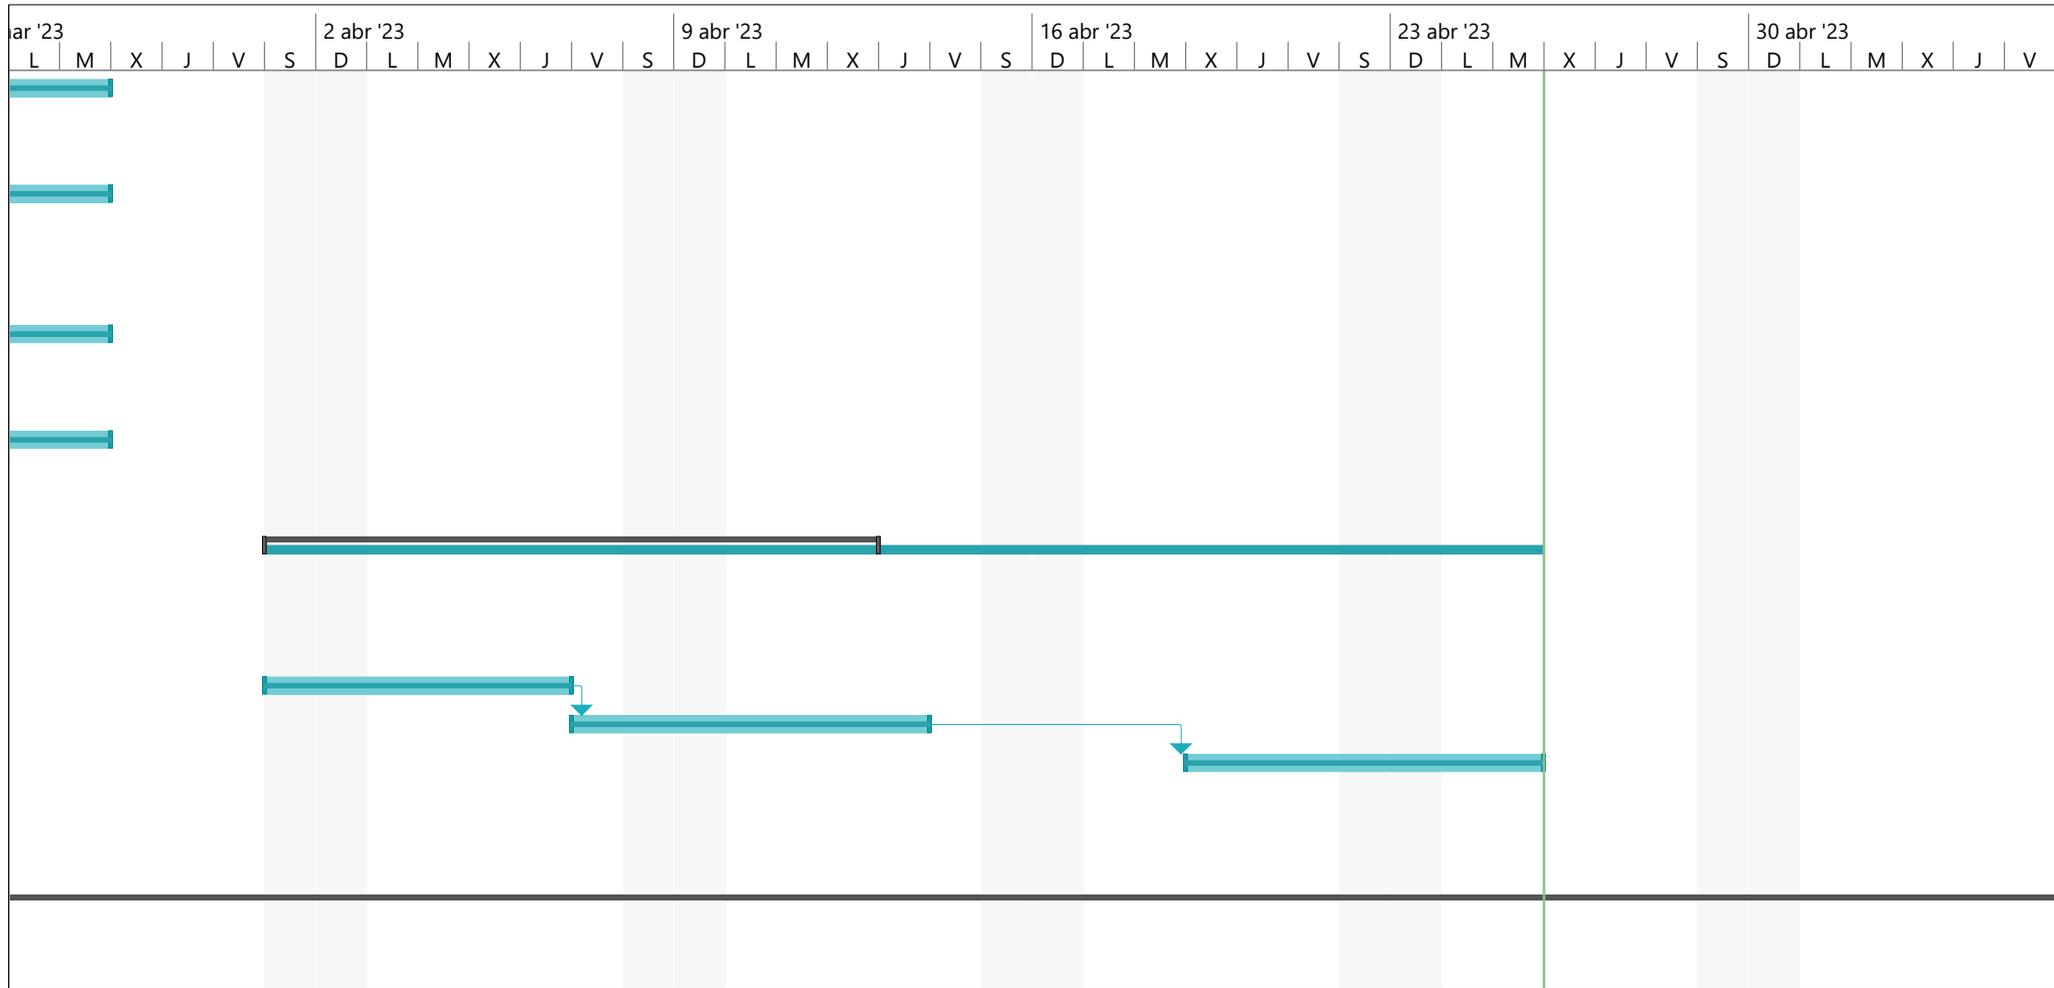


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R Fecha: mié 26/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

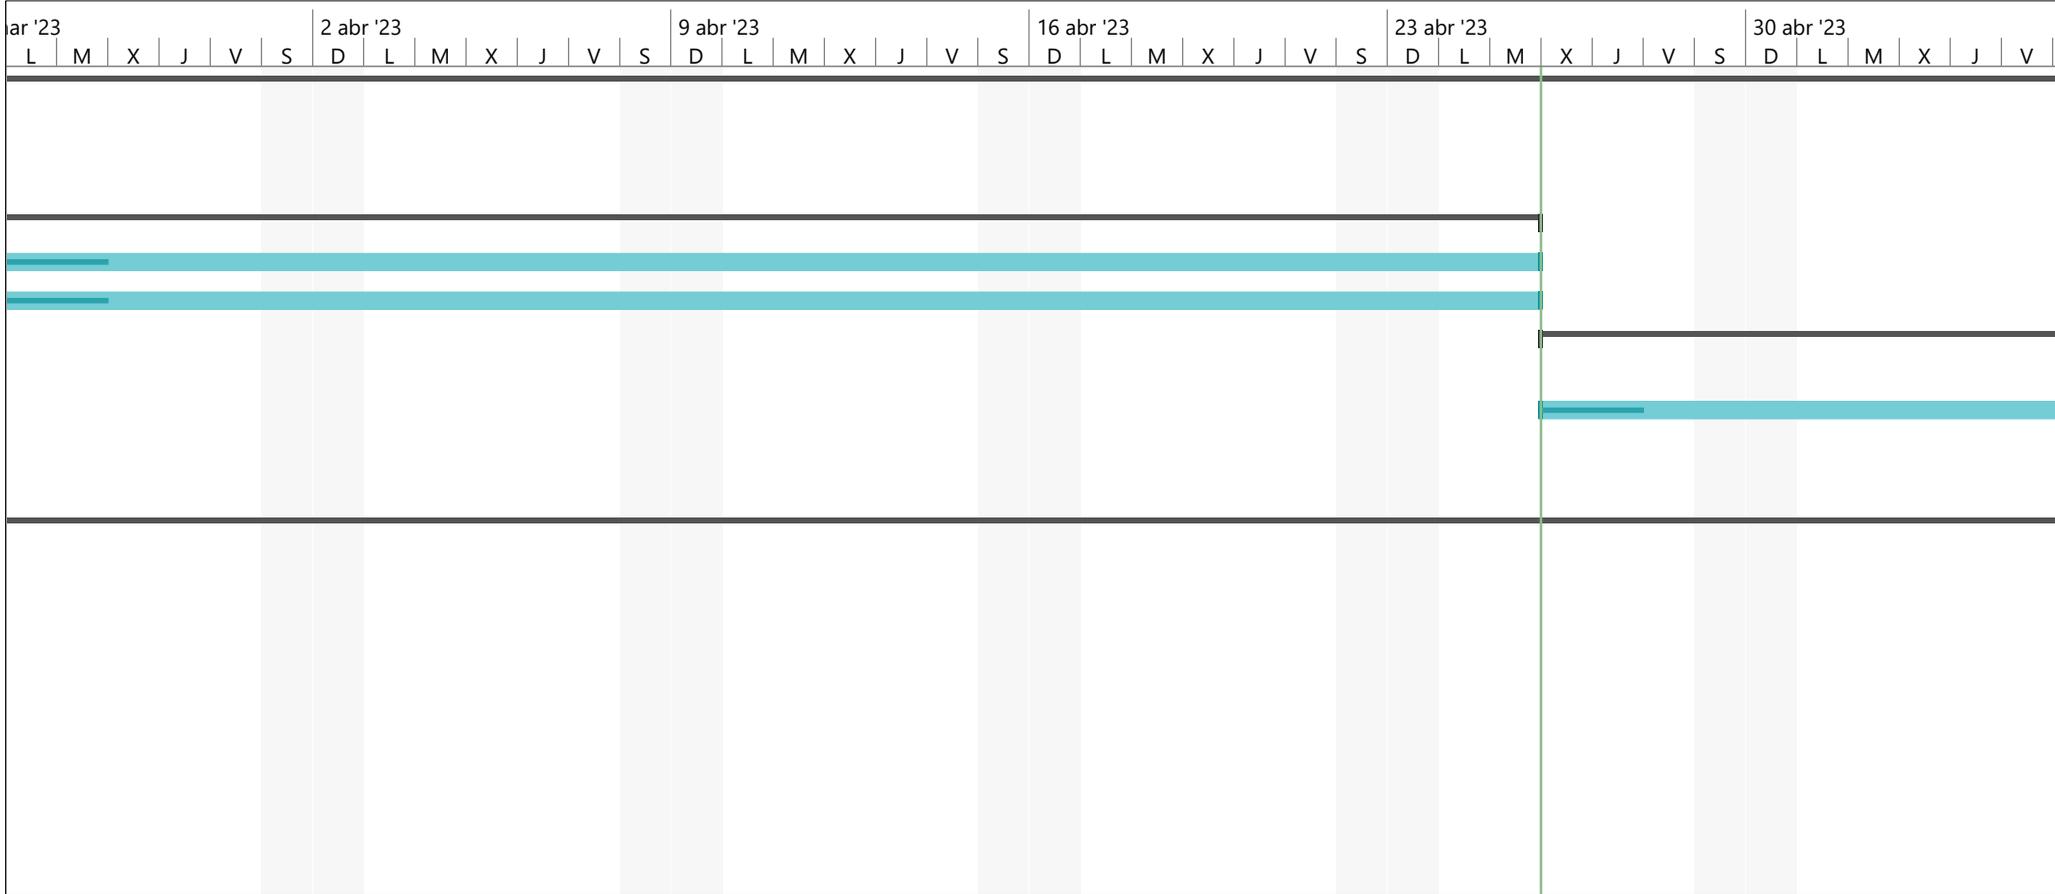


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

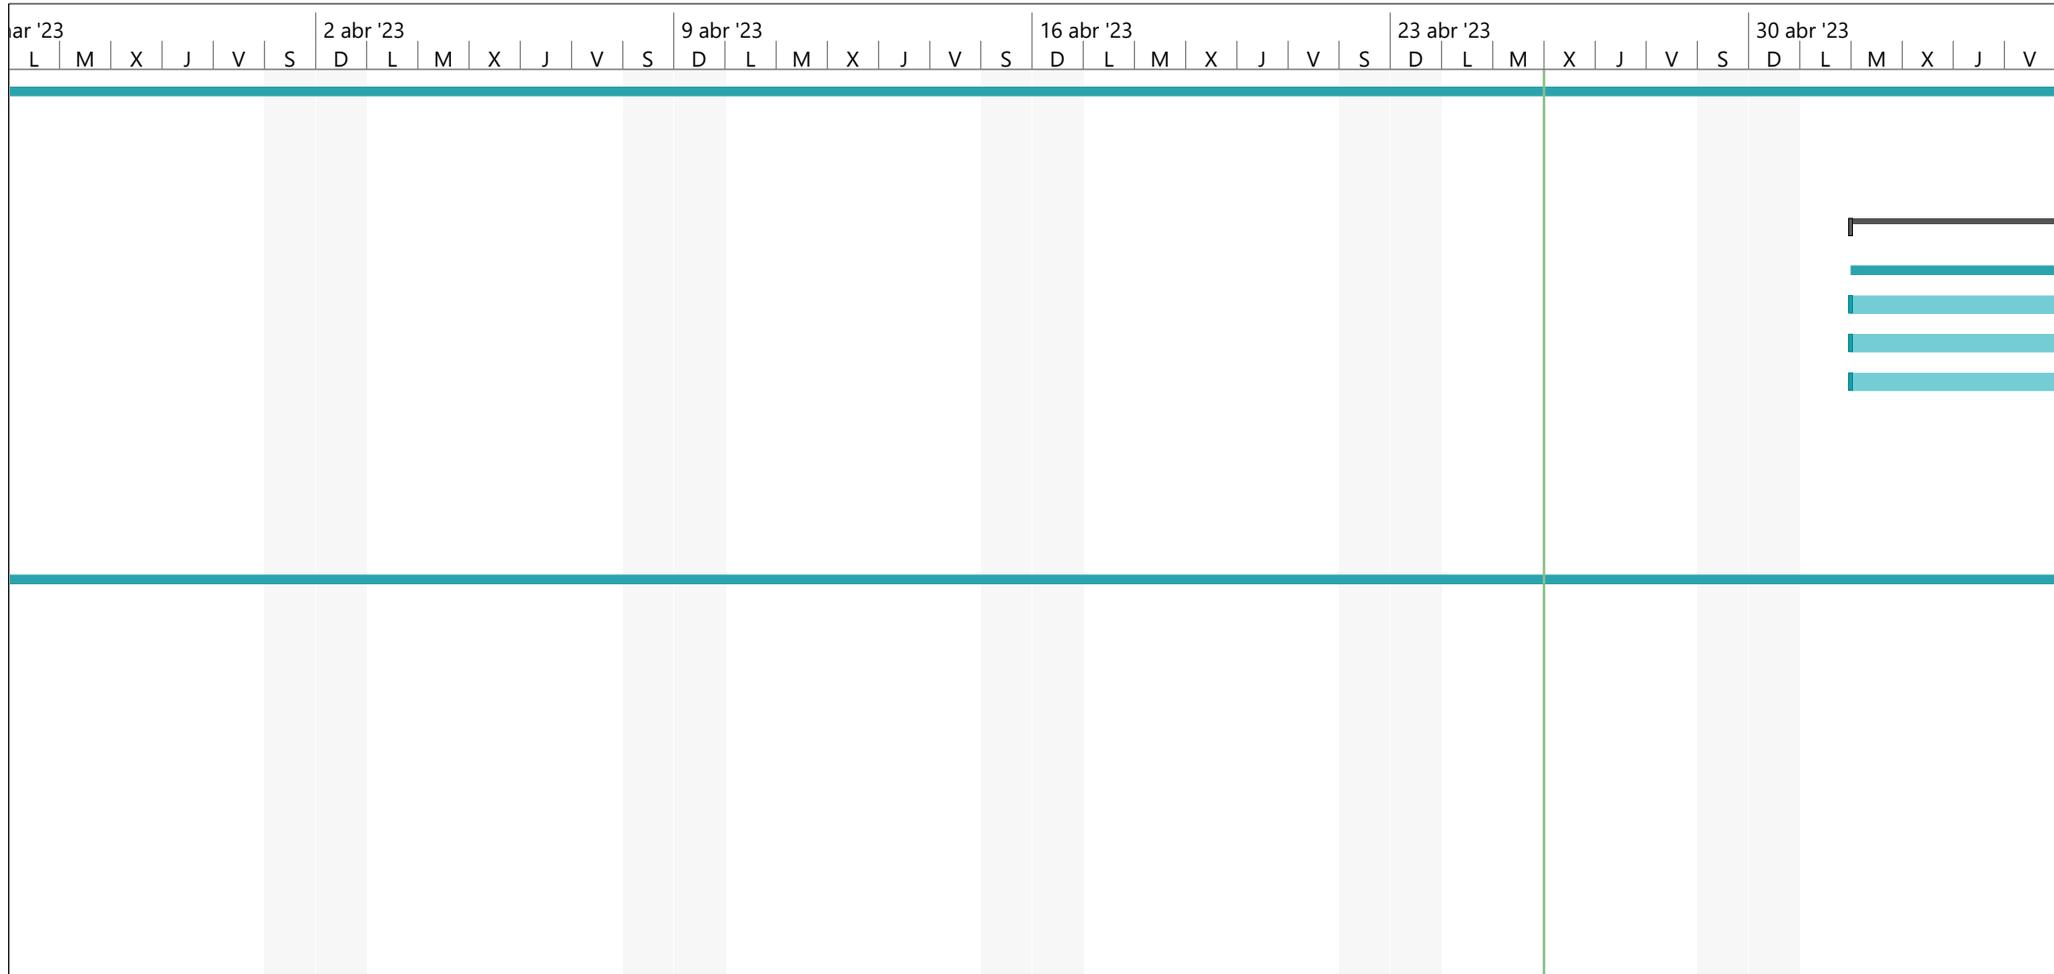


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

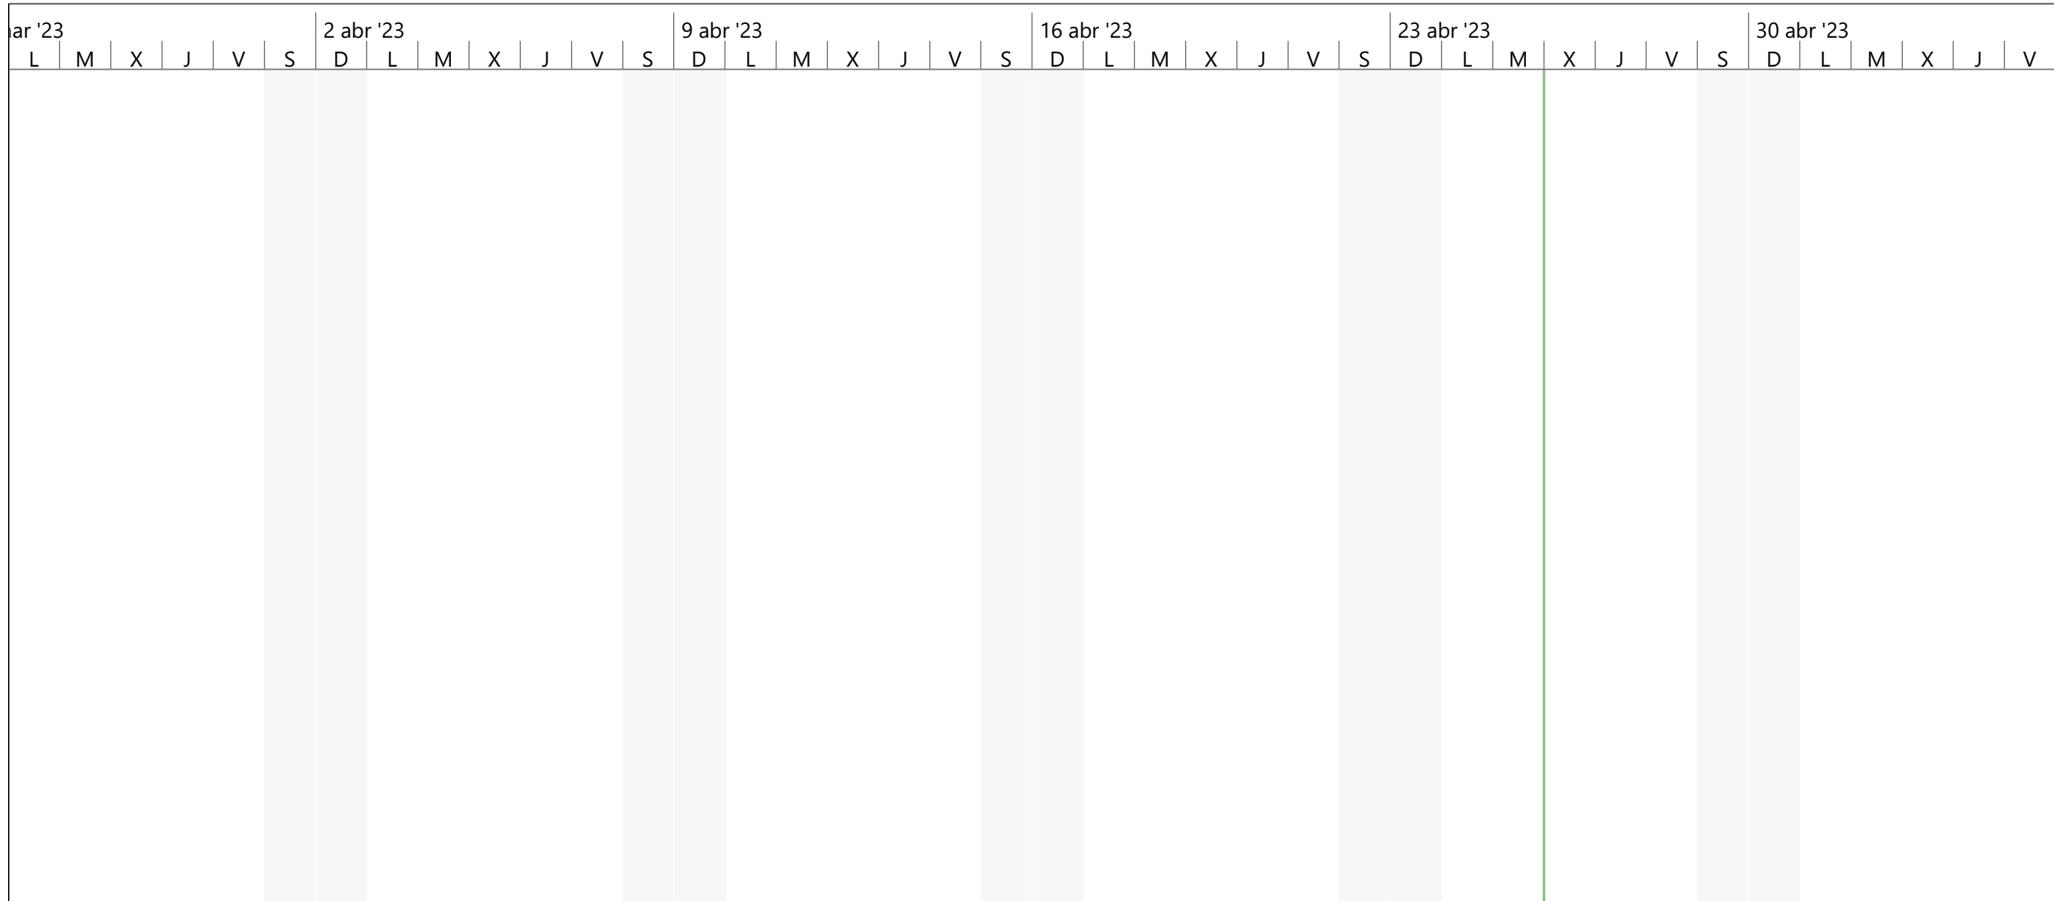

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R Fecha: mié 26/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

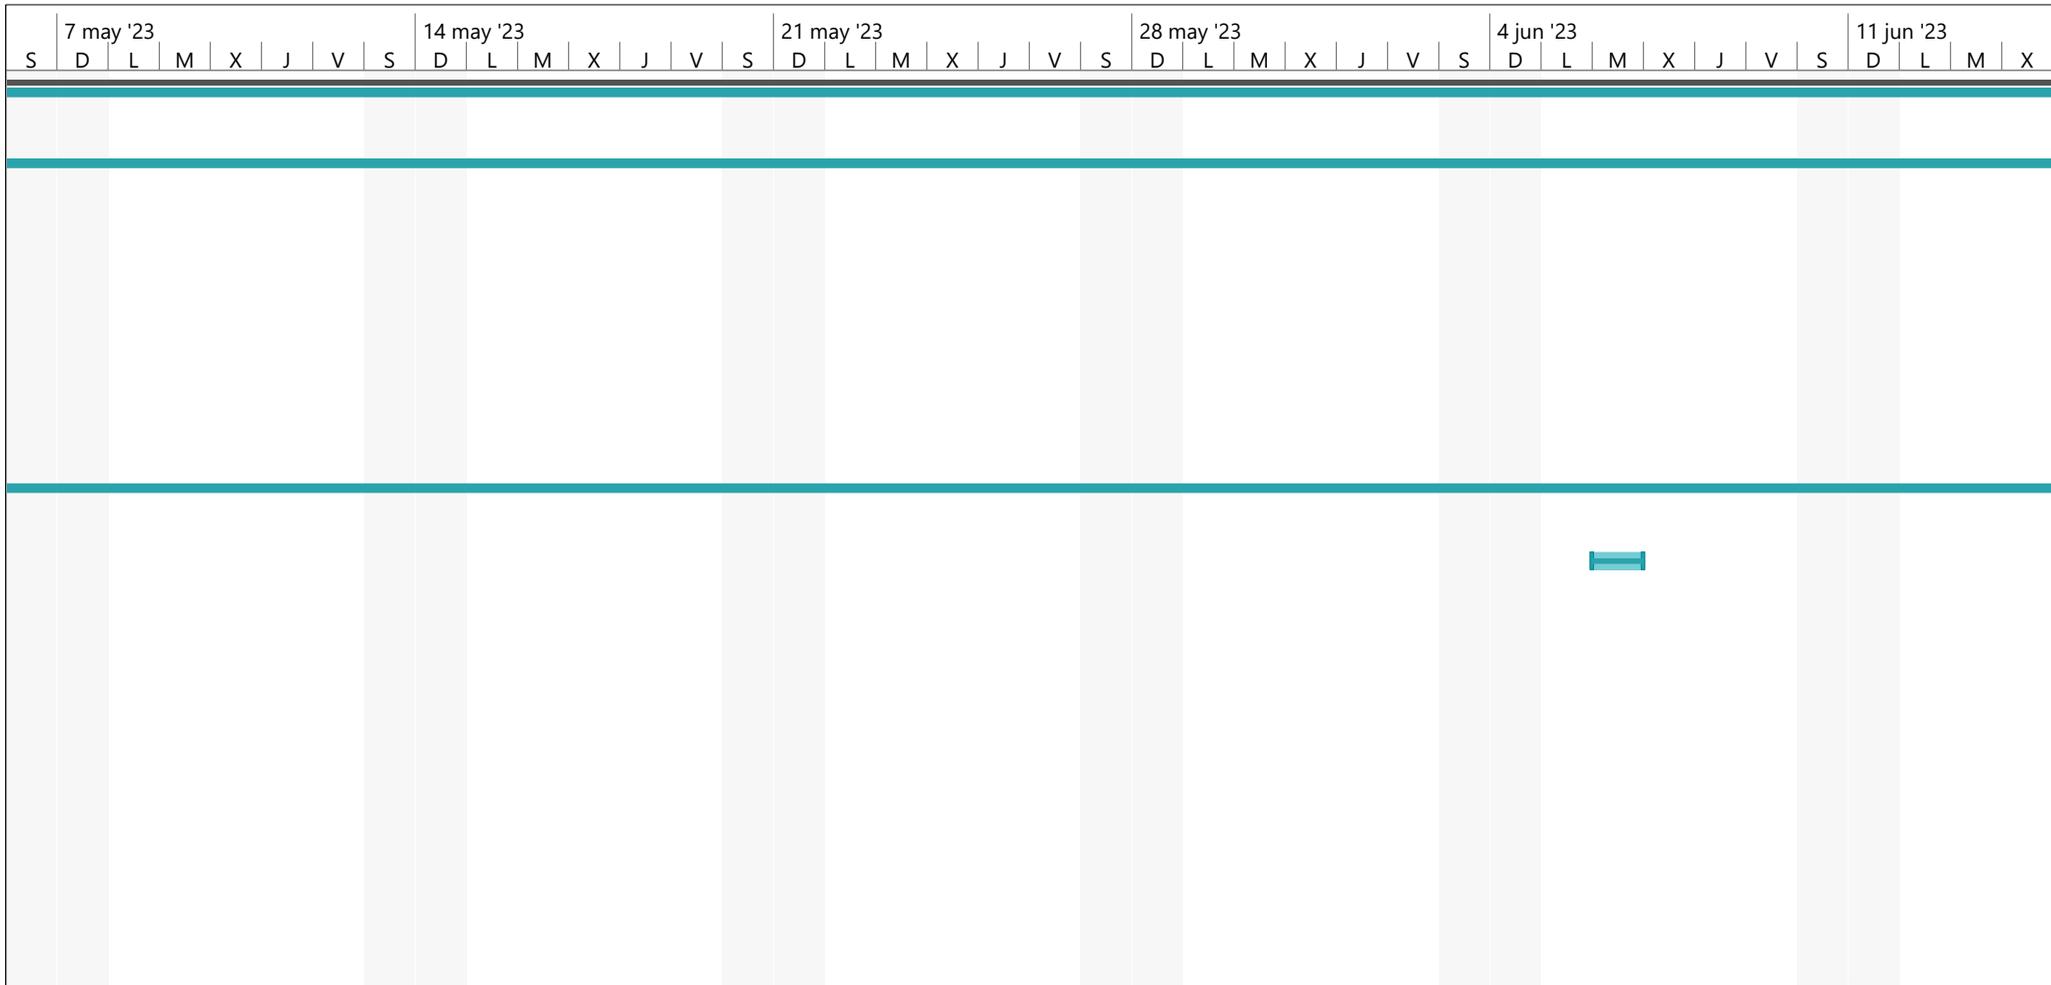

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R Fecha: mié 26/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


7 may '23      14 may '23      21 may '23      28 may '23      4 jun '23      11 jun '23

S D L M X J V S    D L M X J V S    D L M X J V S    D L M X J V S    D L M X J V S    D L M X

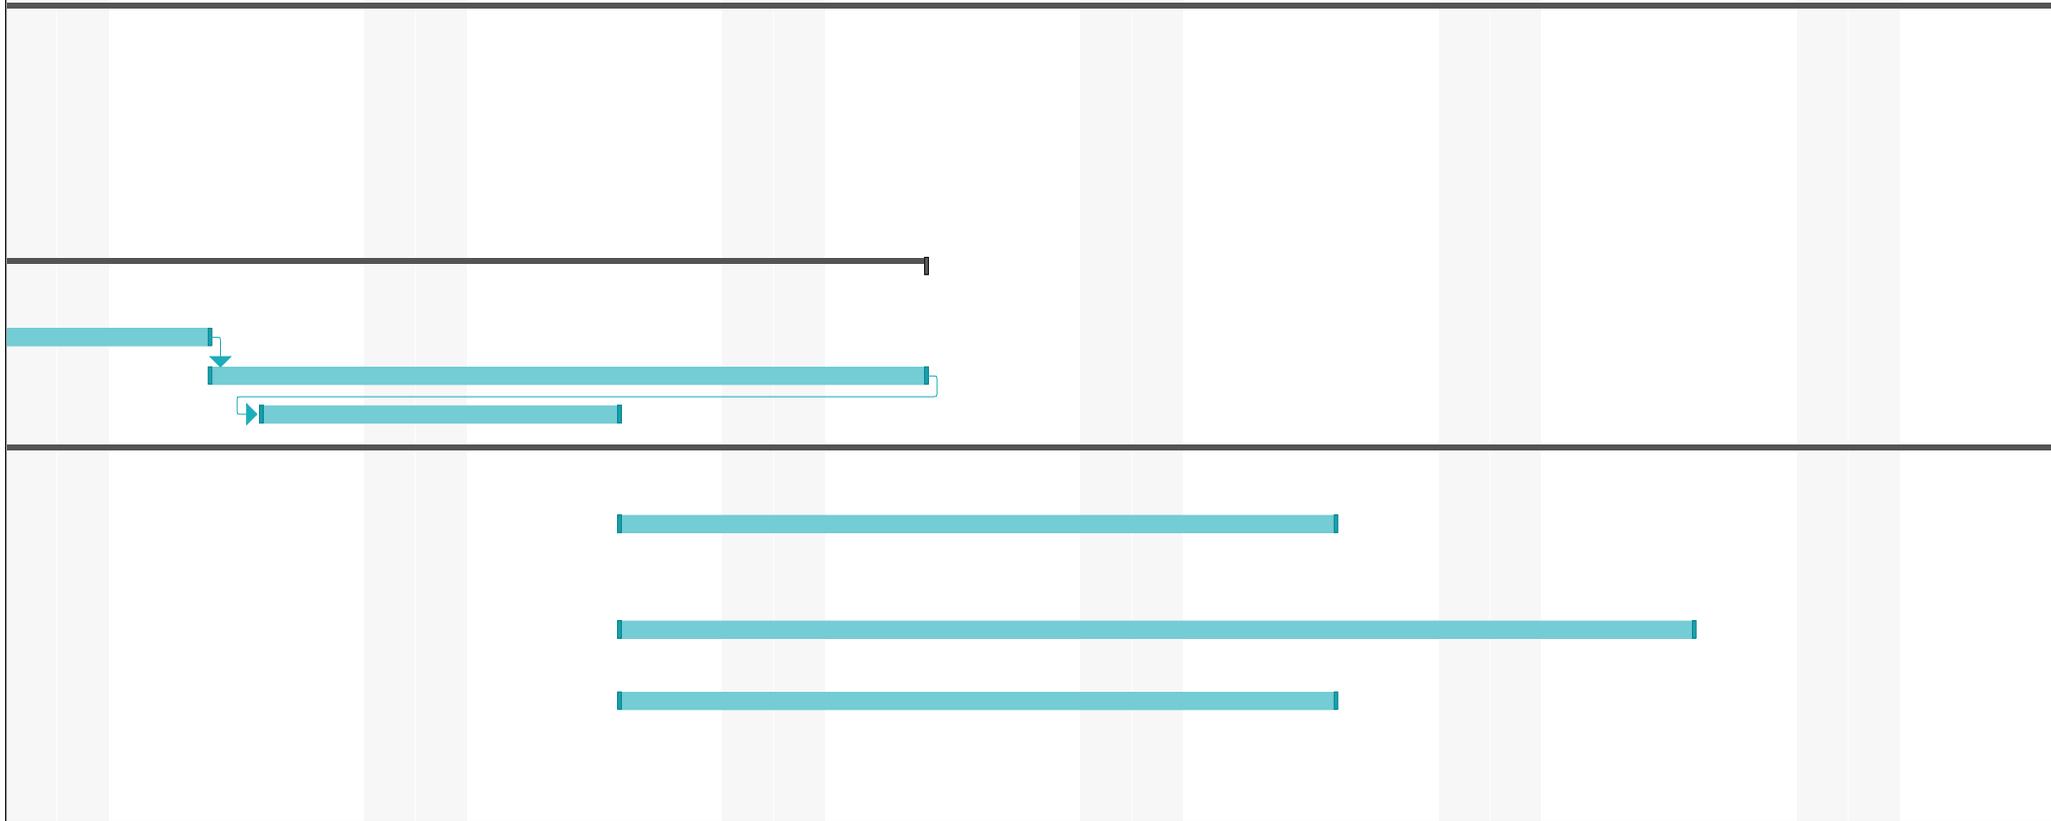


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

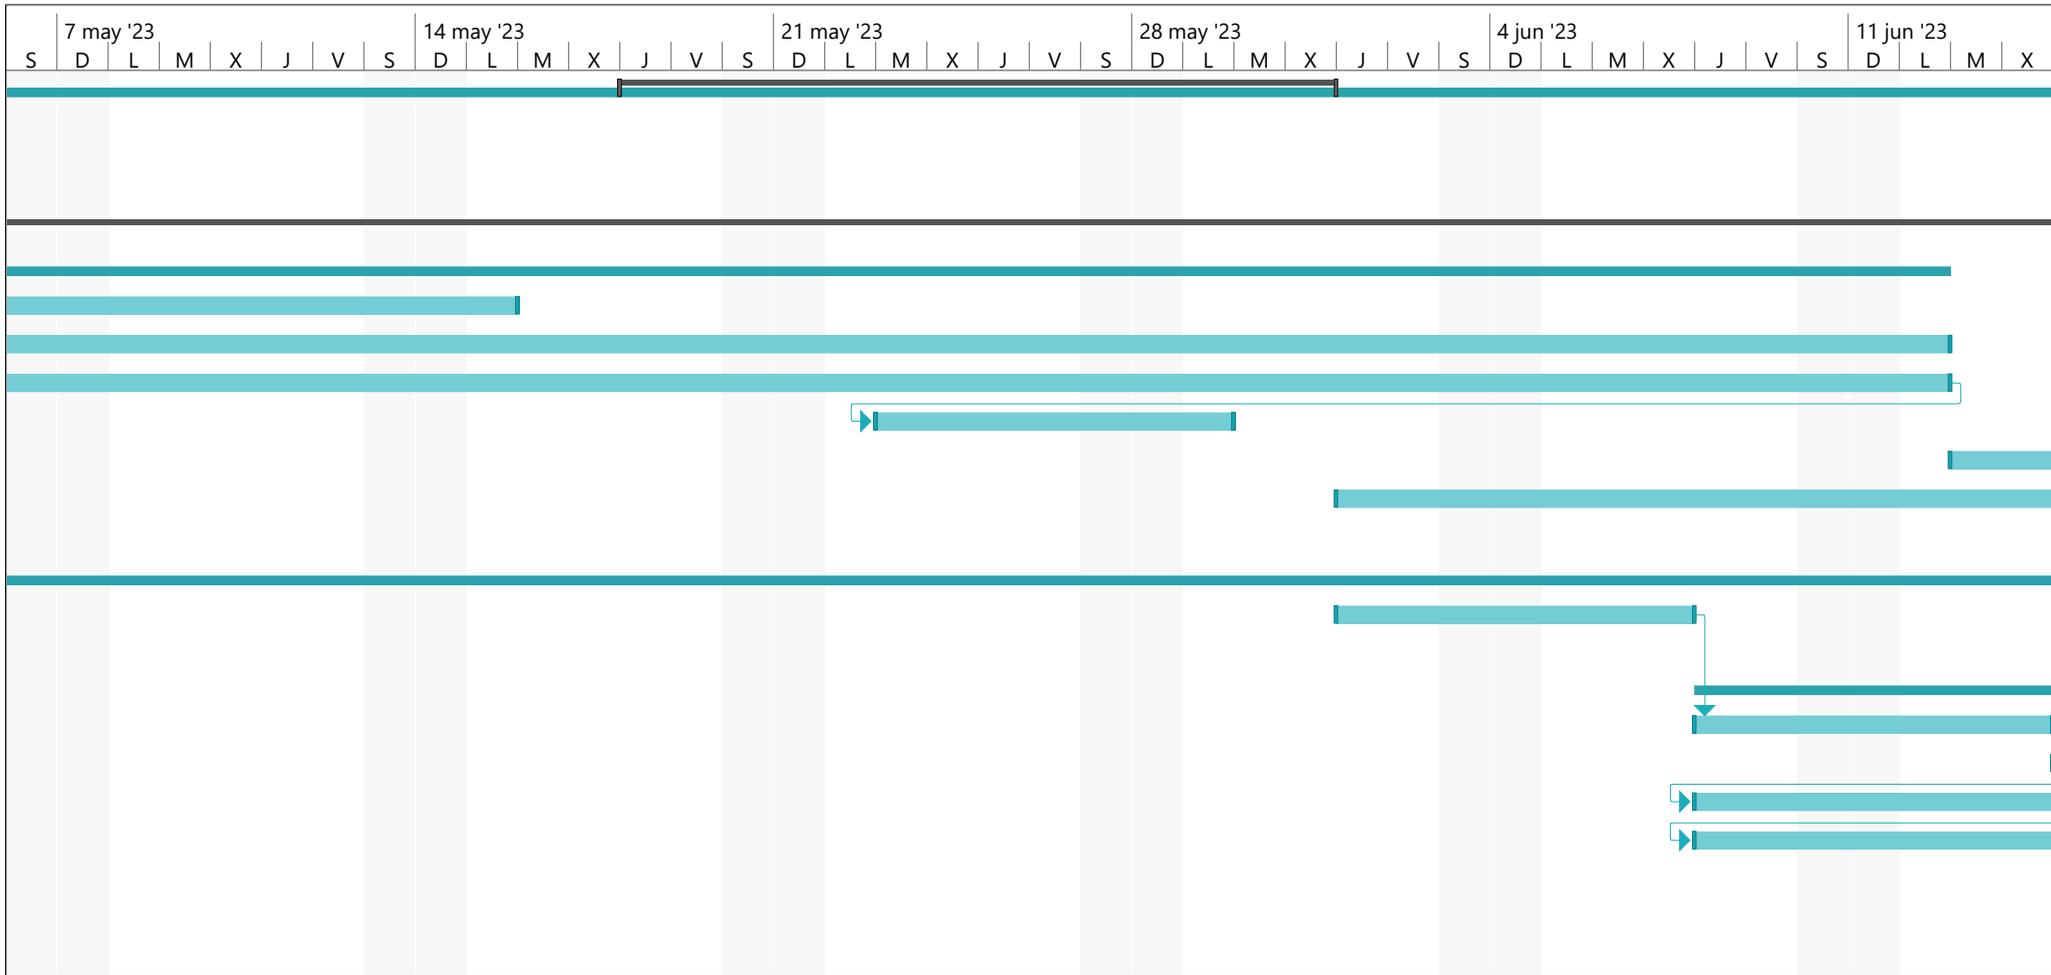


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

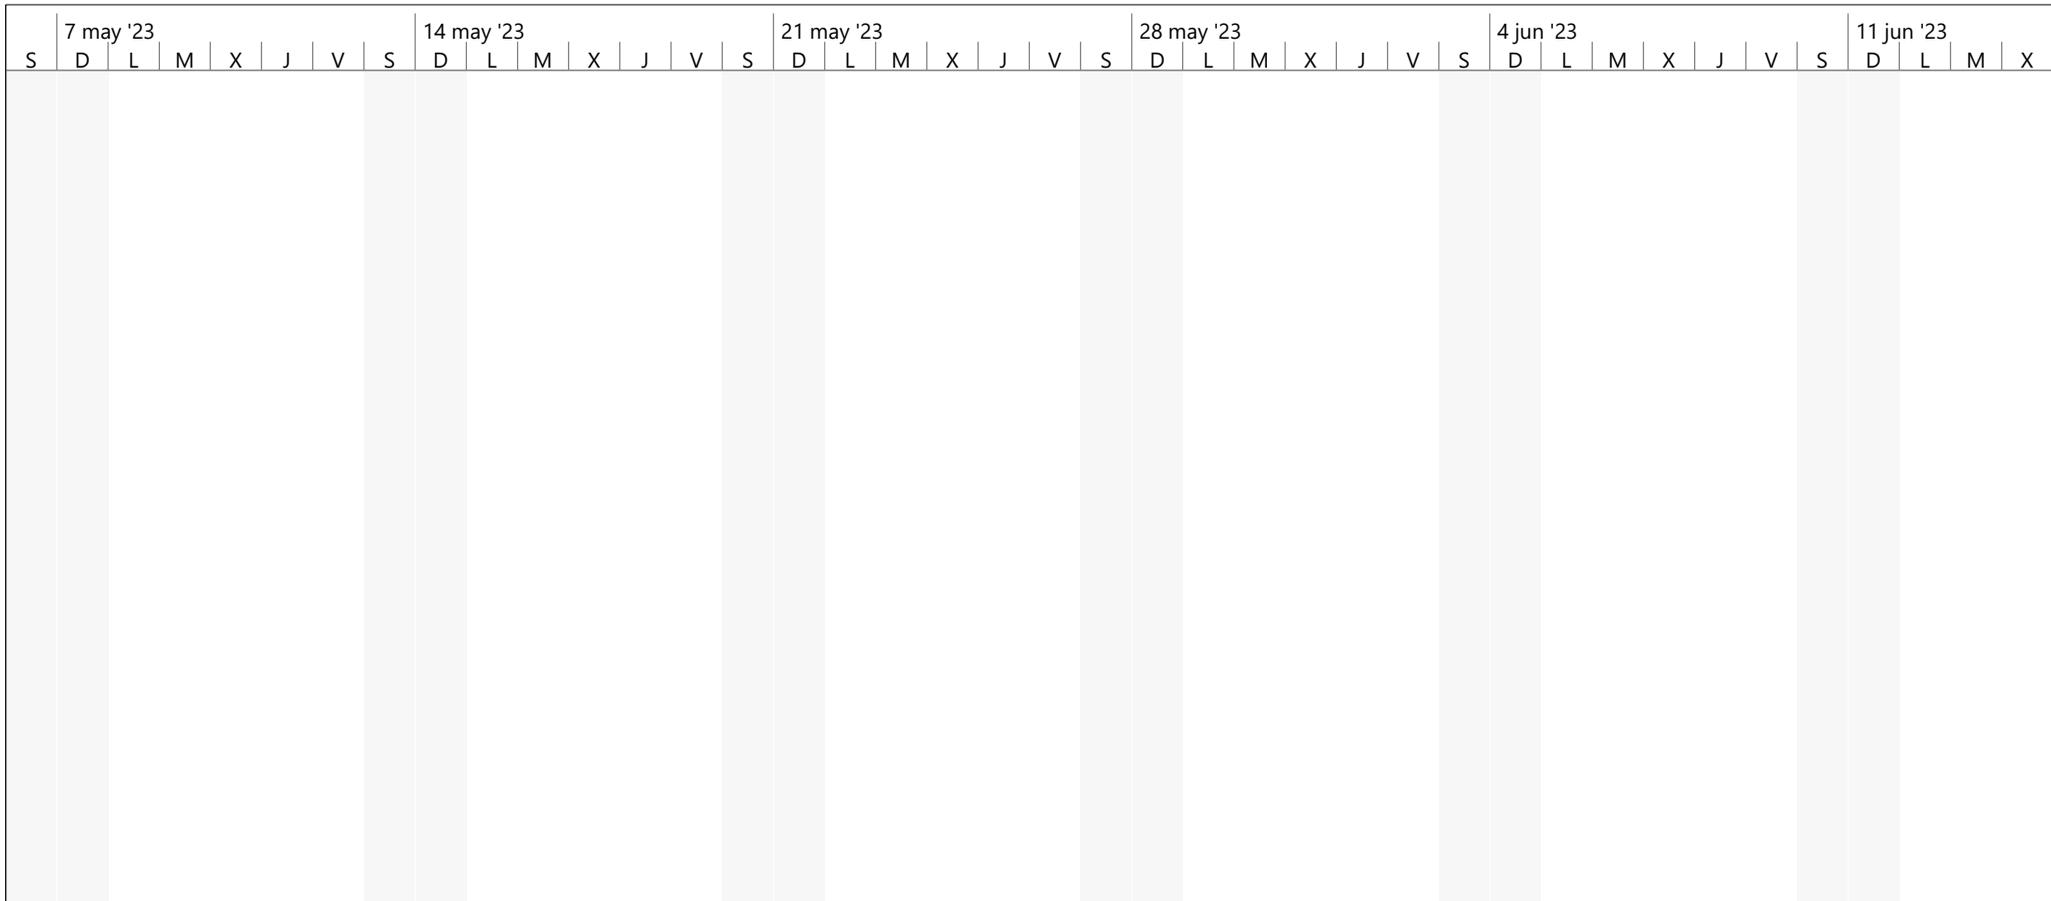


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R Fecha: mié 26/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

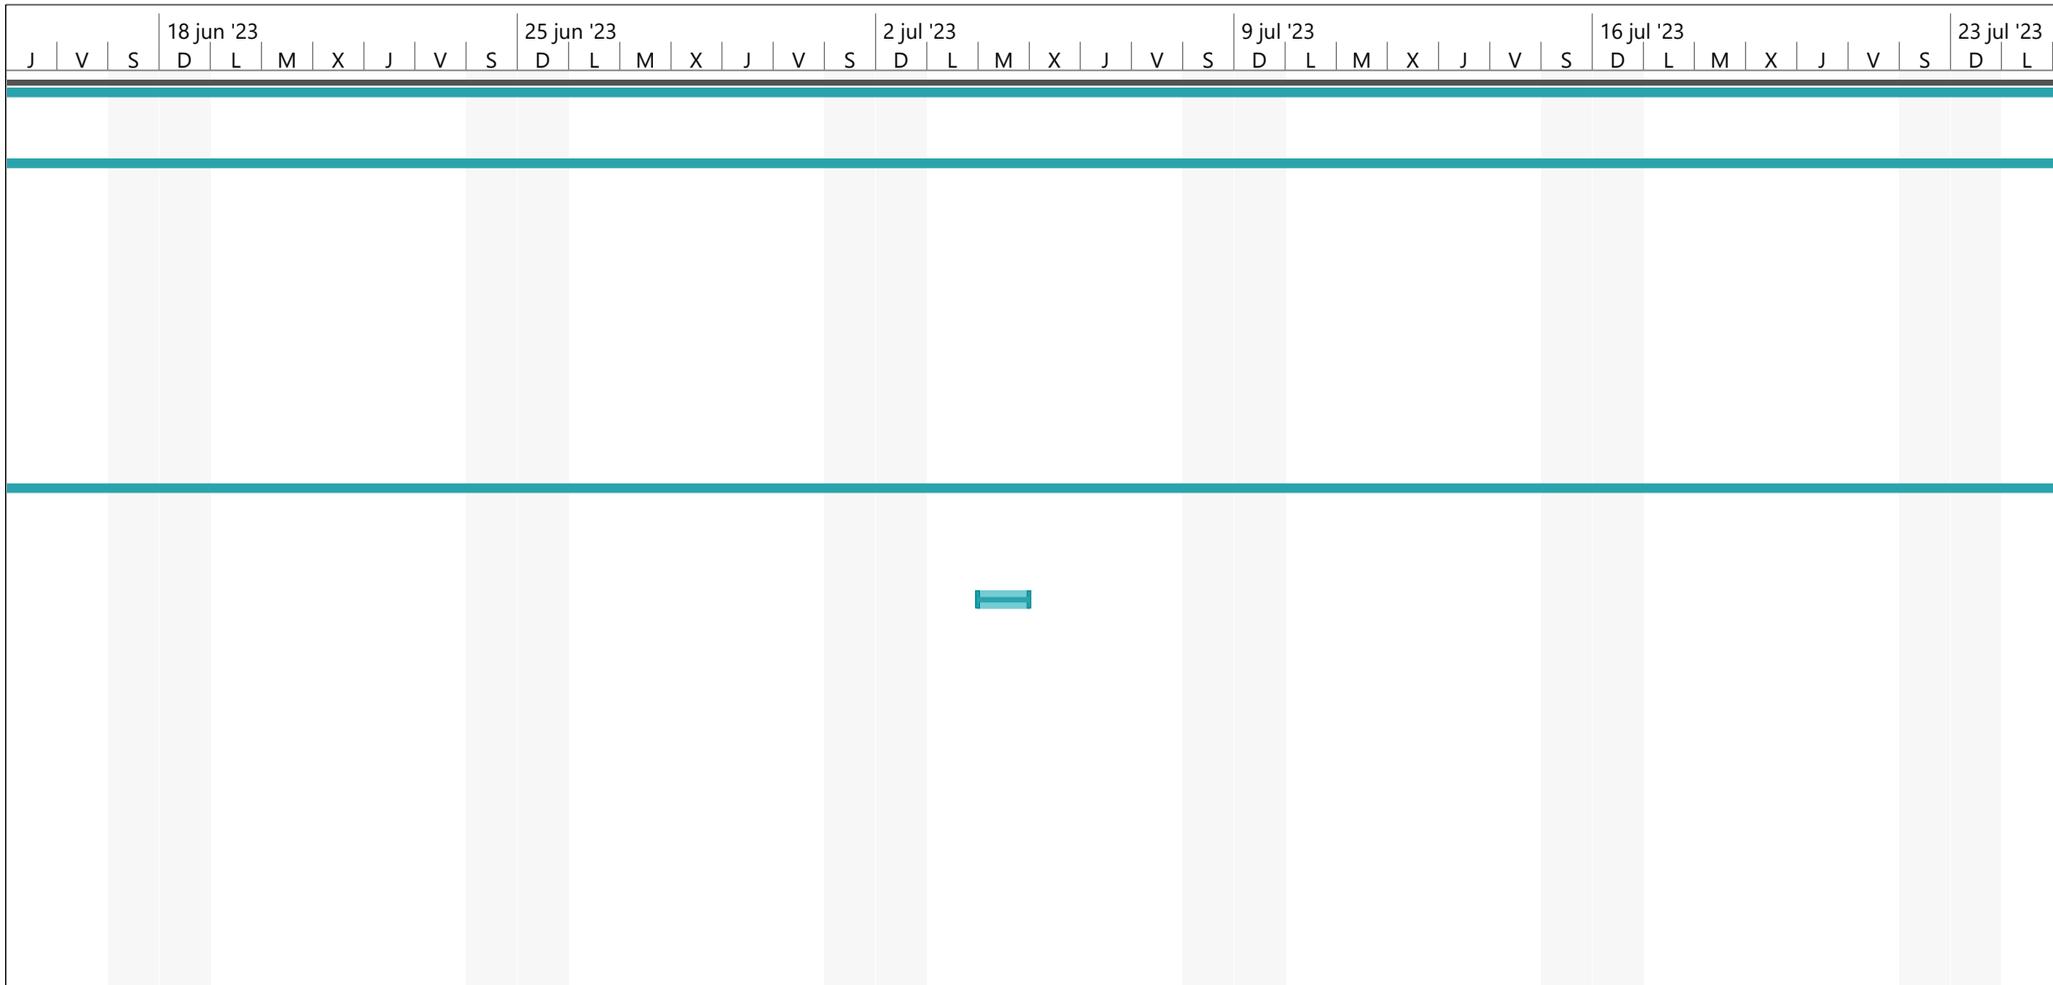


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R Fecha: mié 26/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

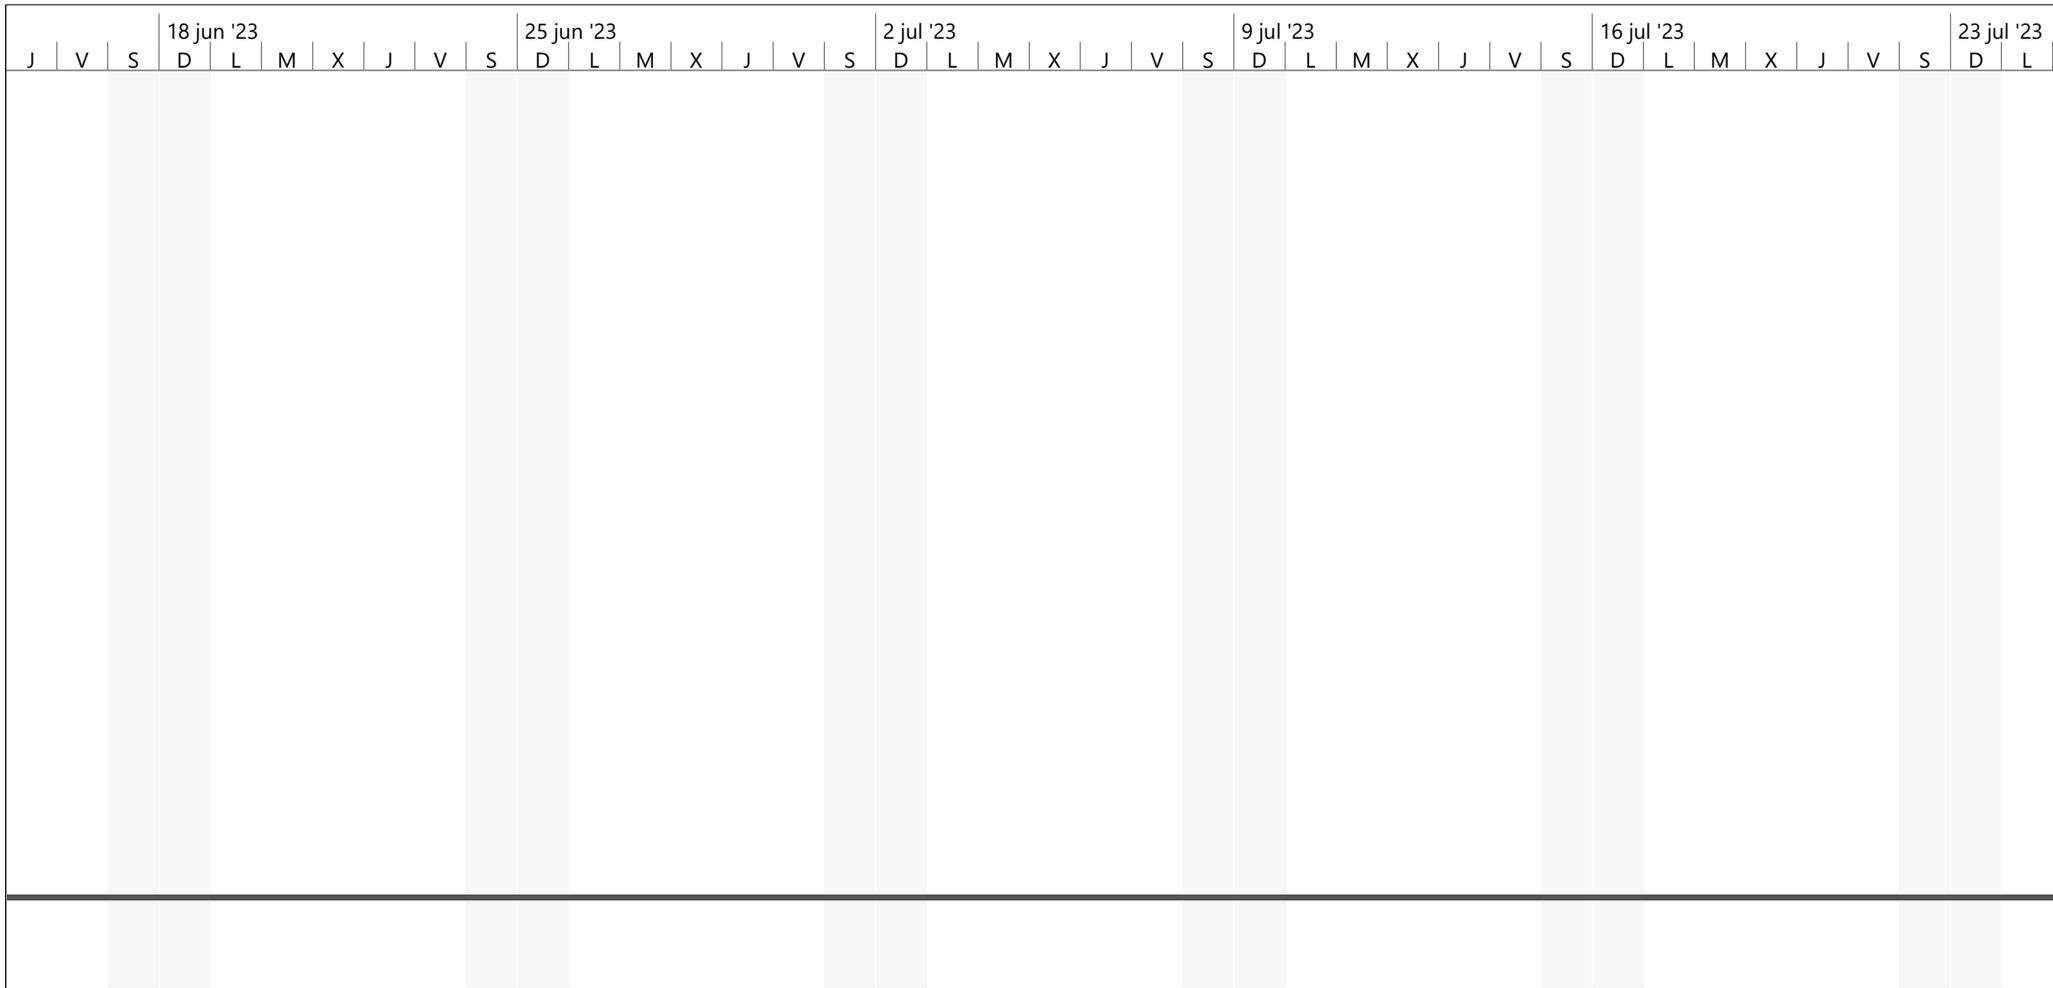

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R Fecha: mié 26/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

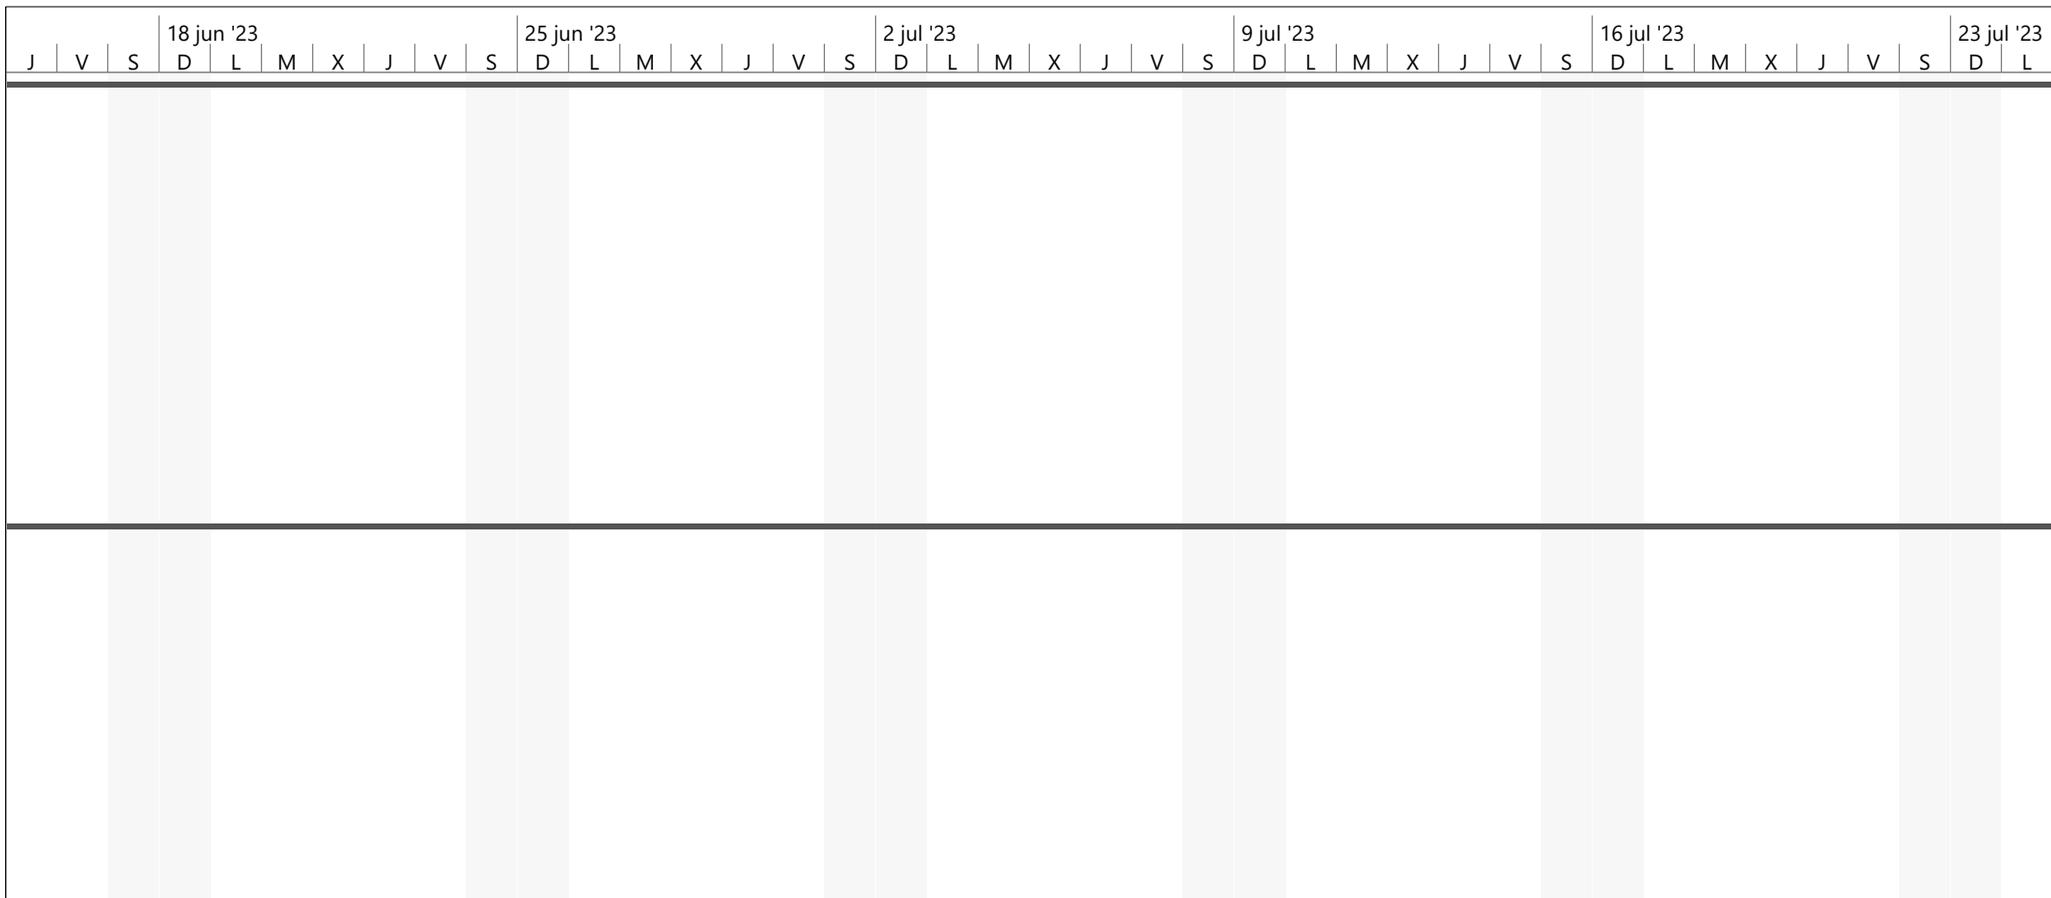


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R Fecha: mié 26/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

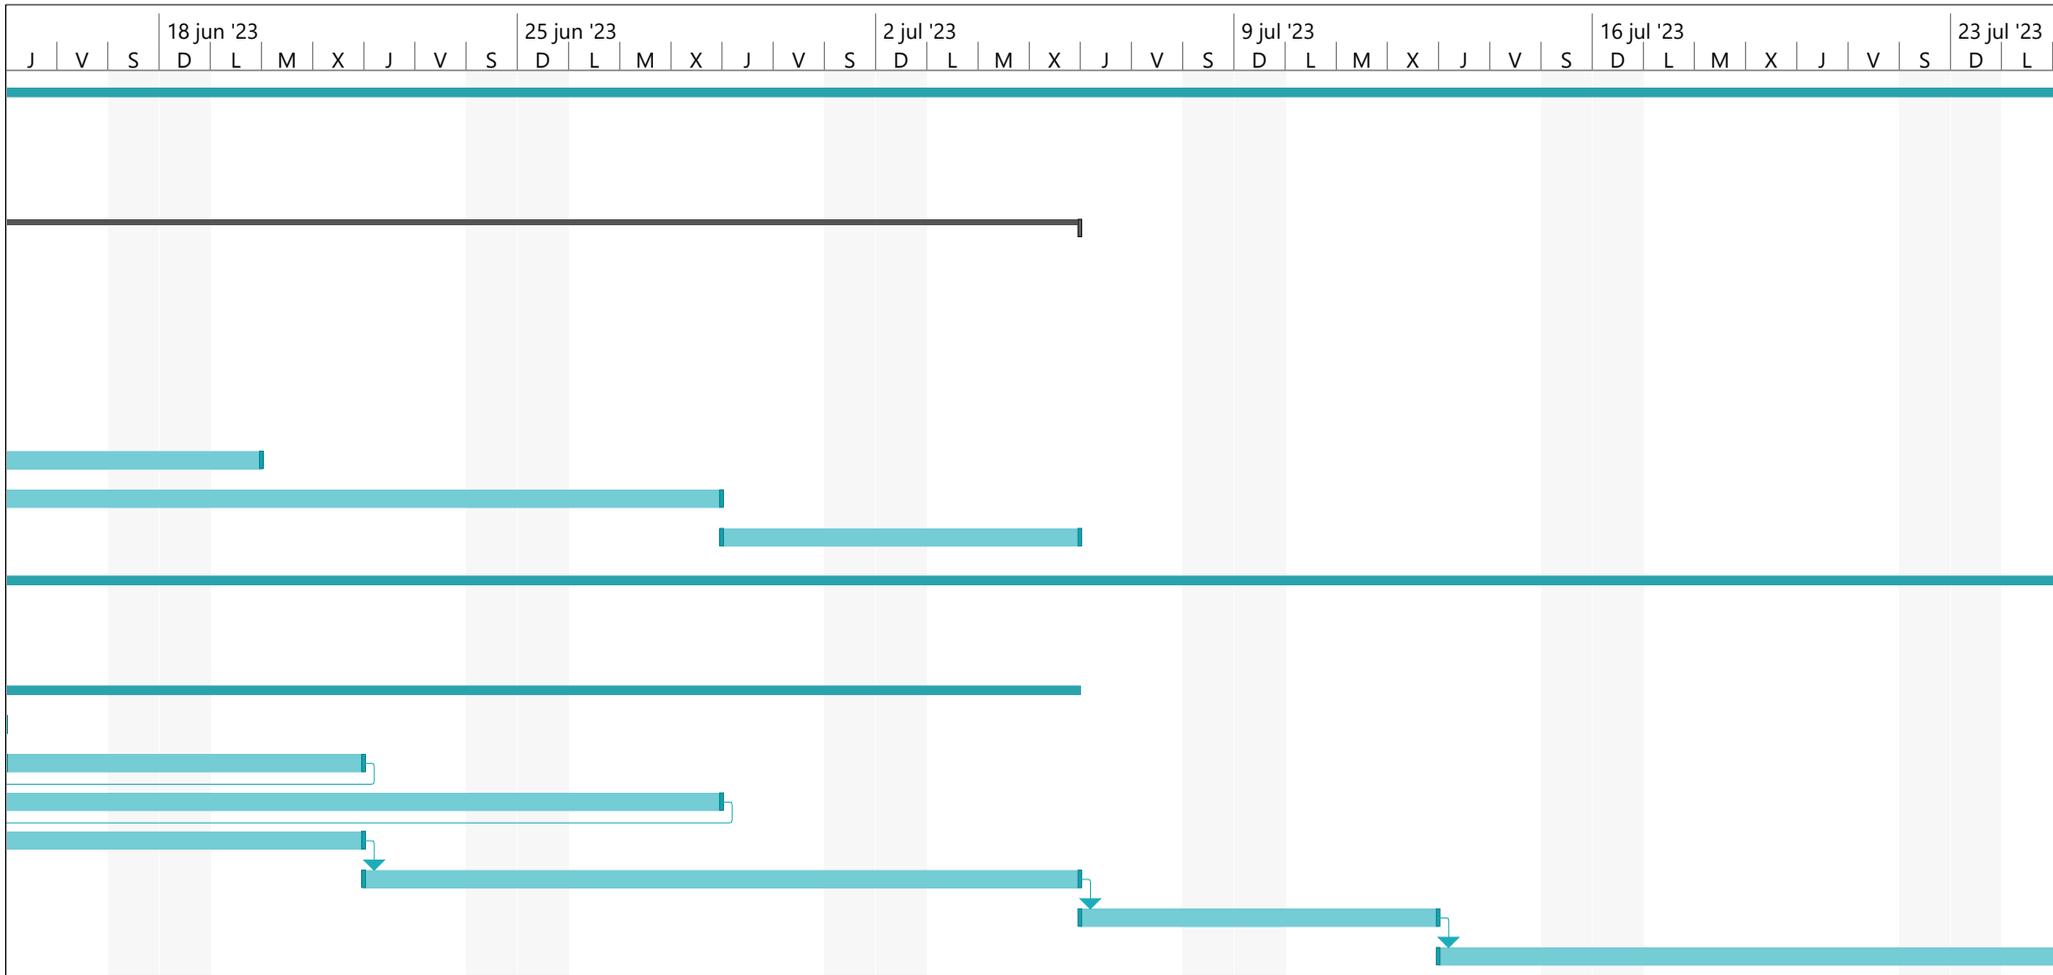


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

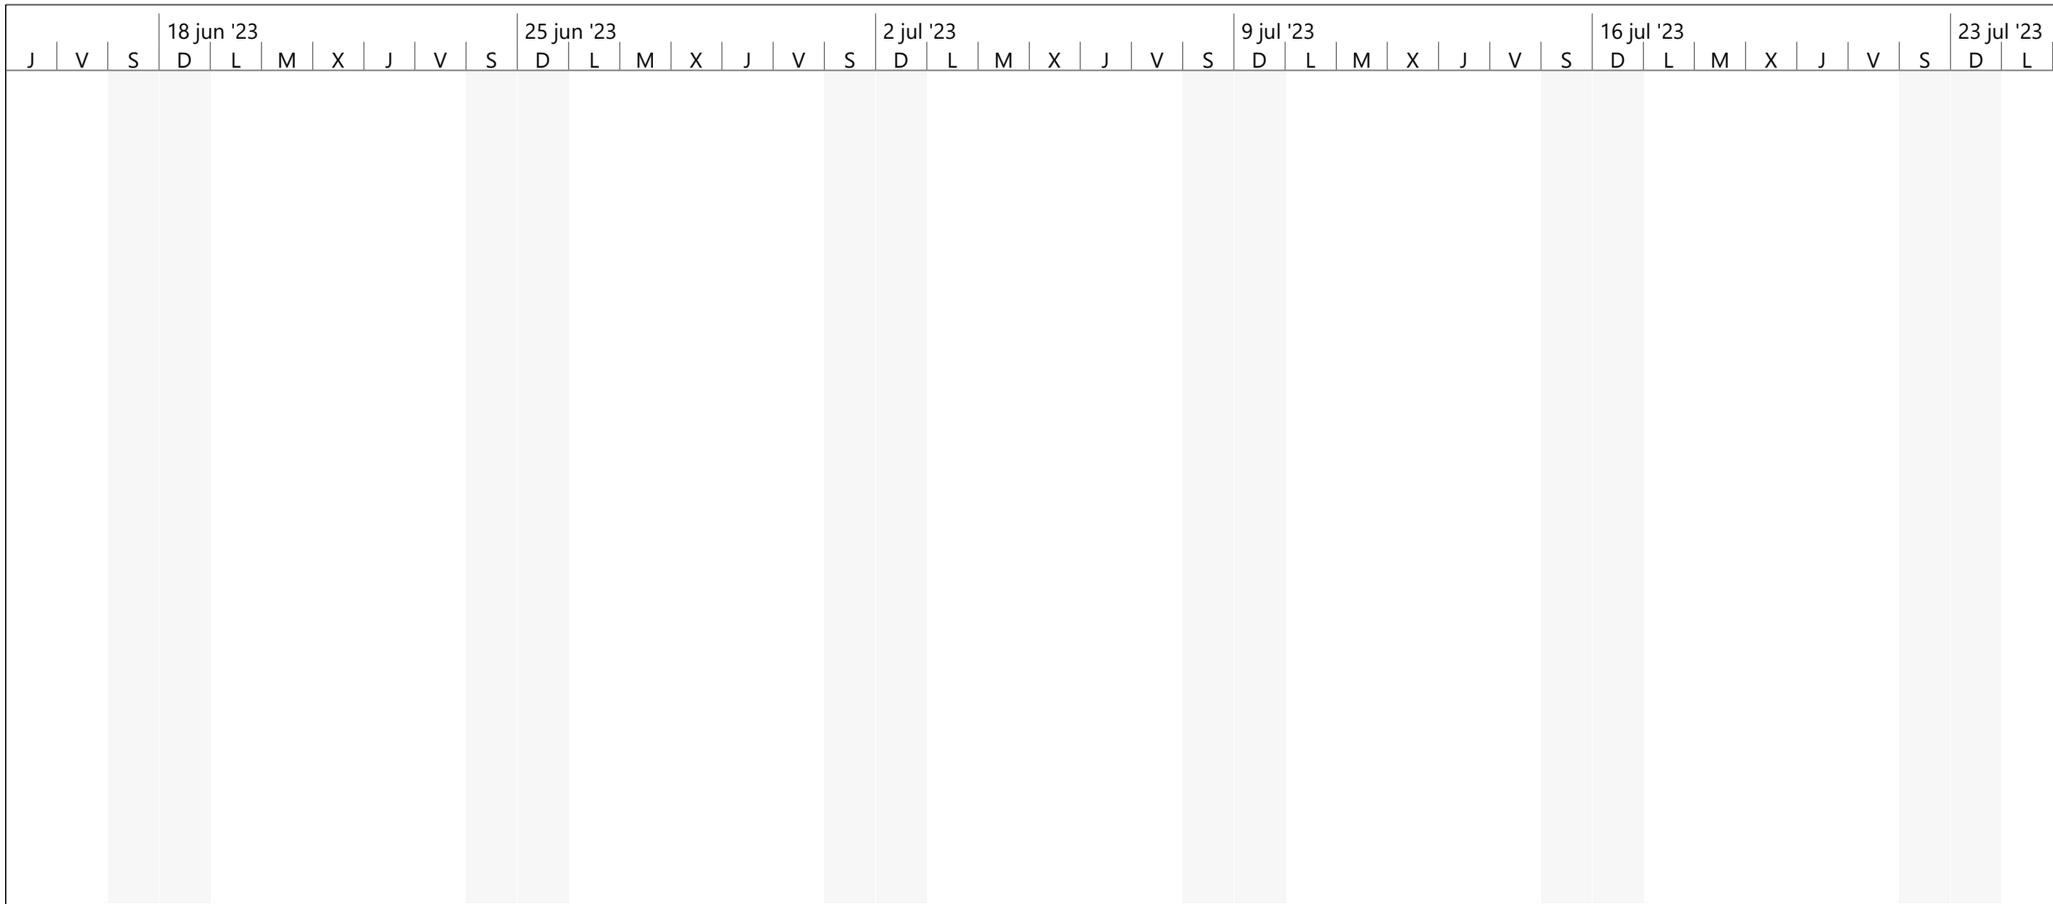


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

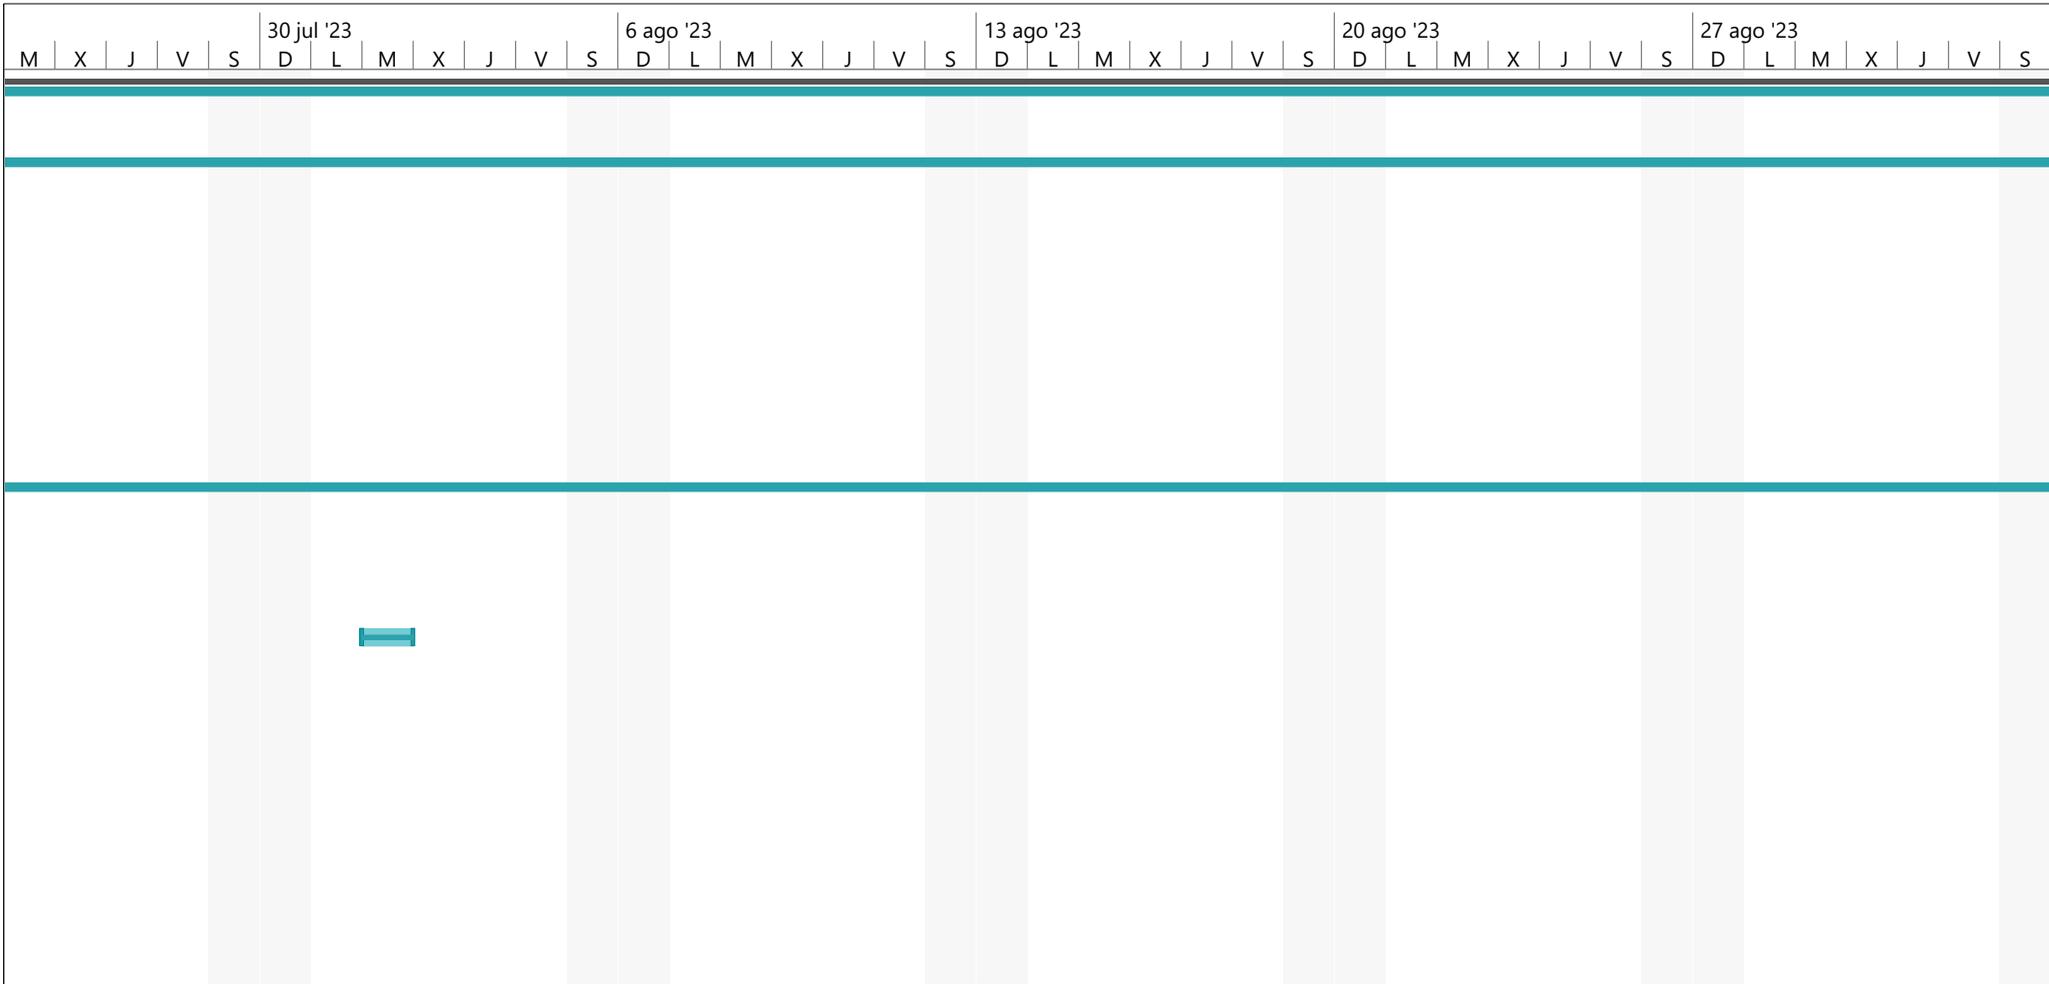

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R Fecha: mié 26/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

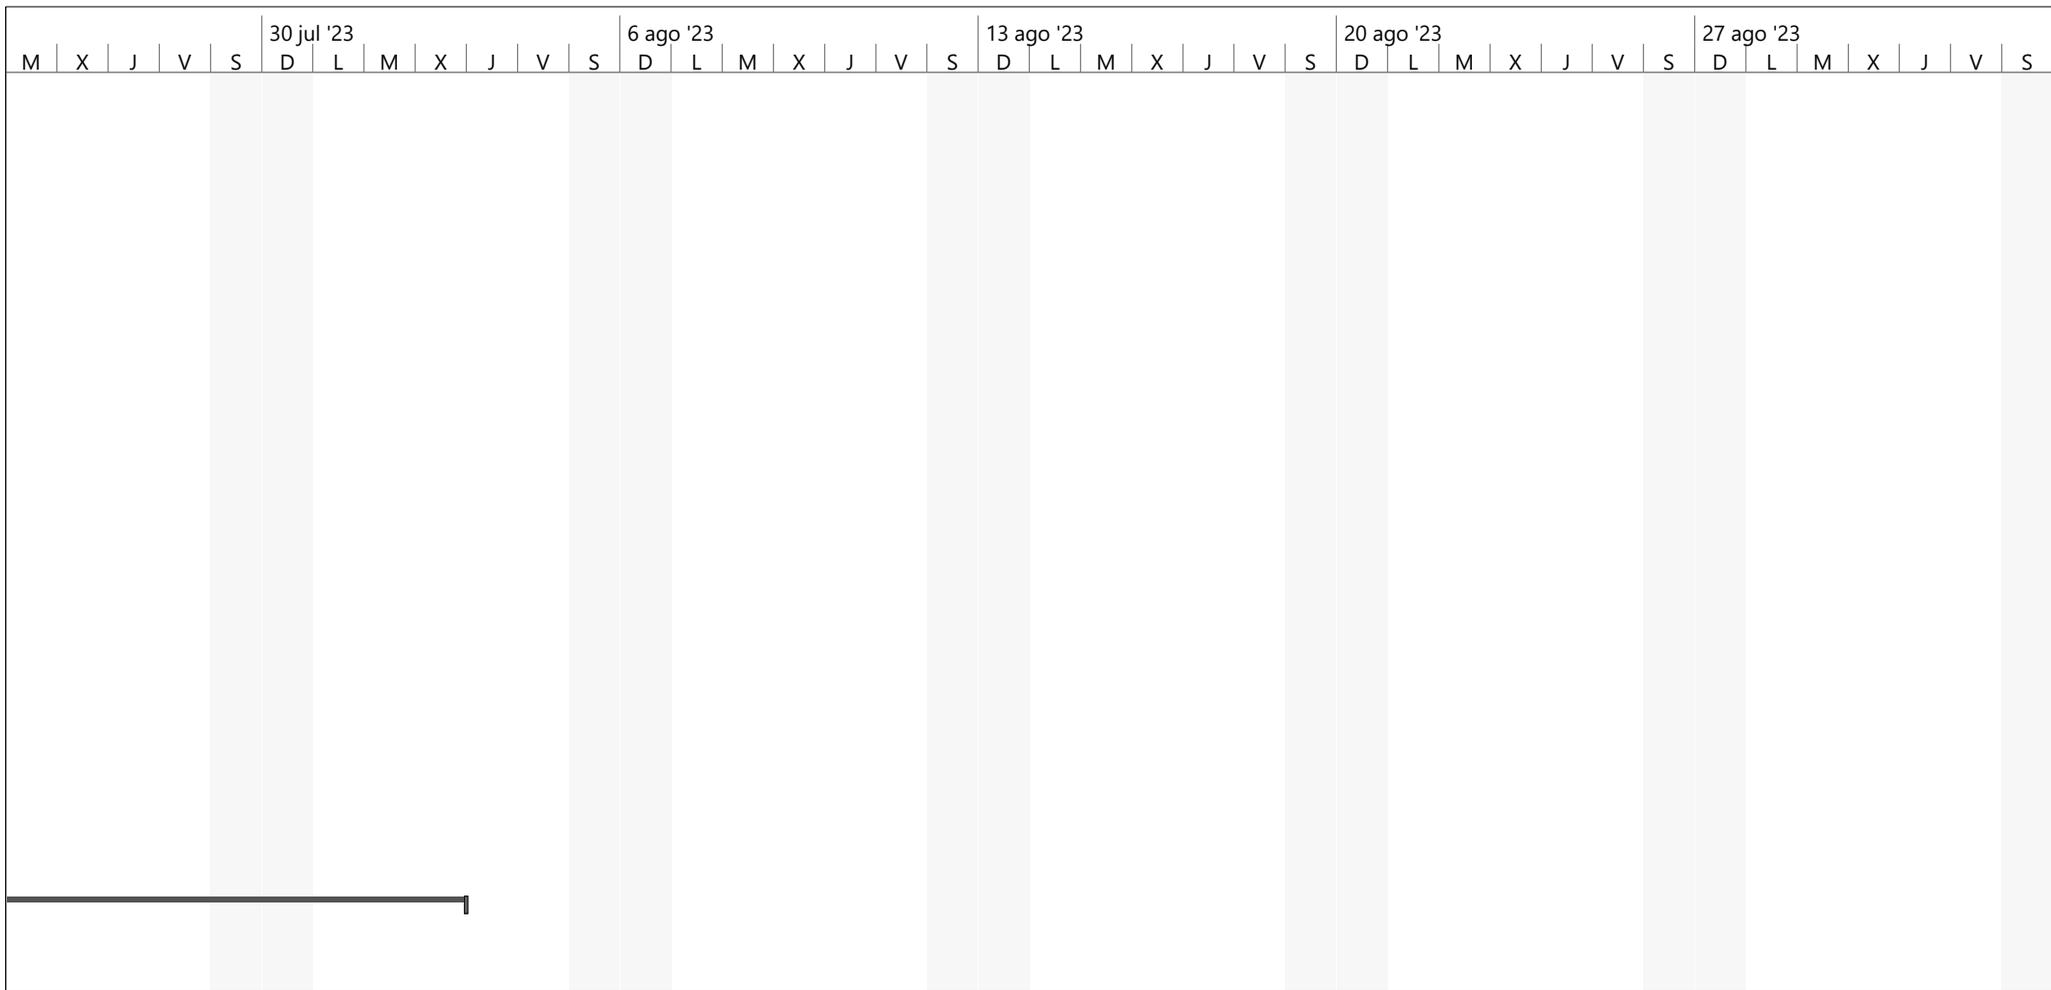

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R Fecha: mié 26/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

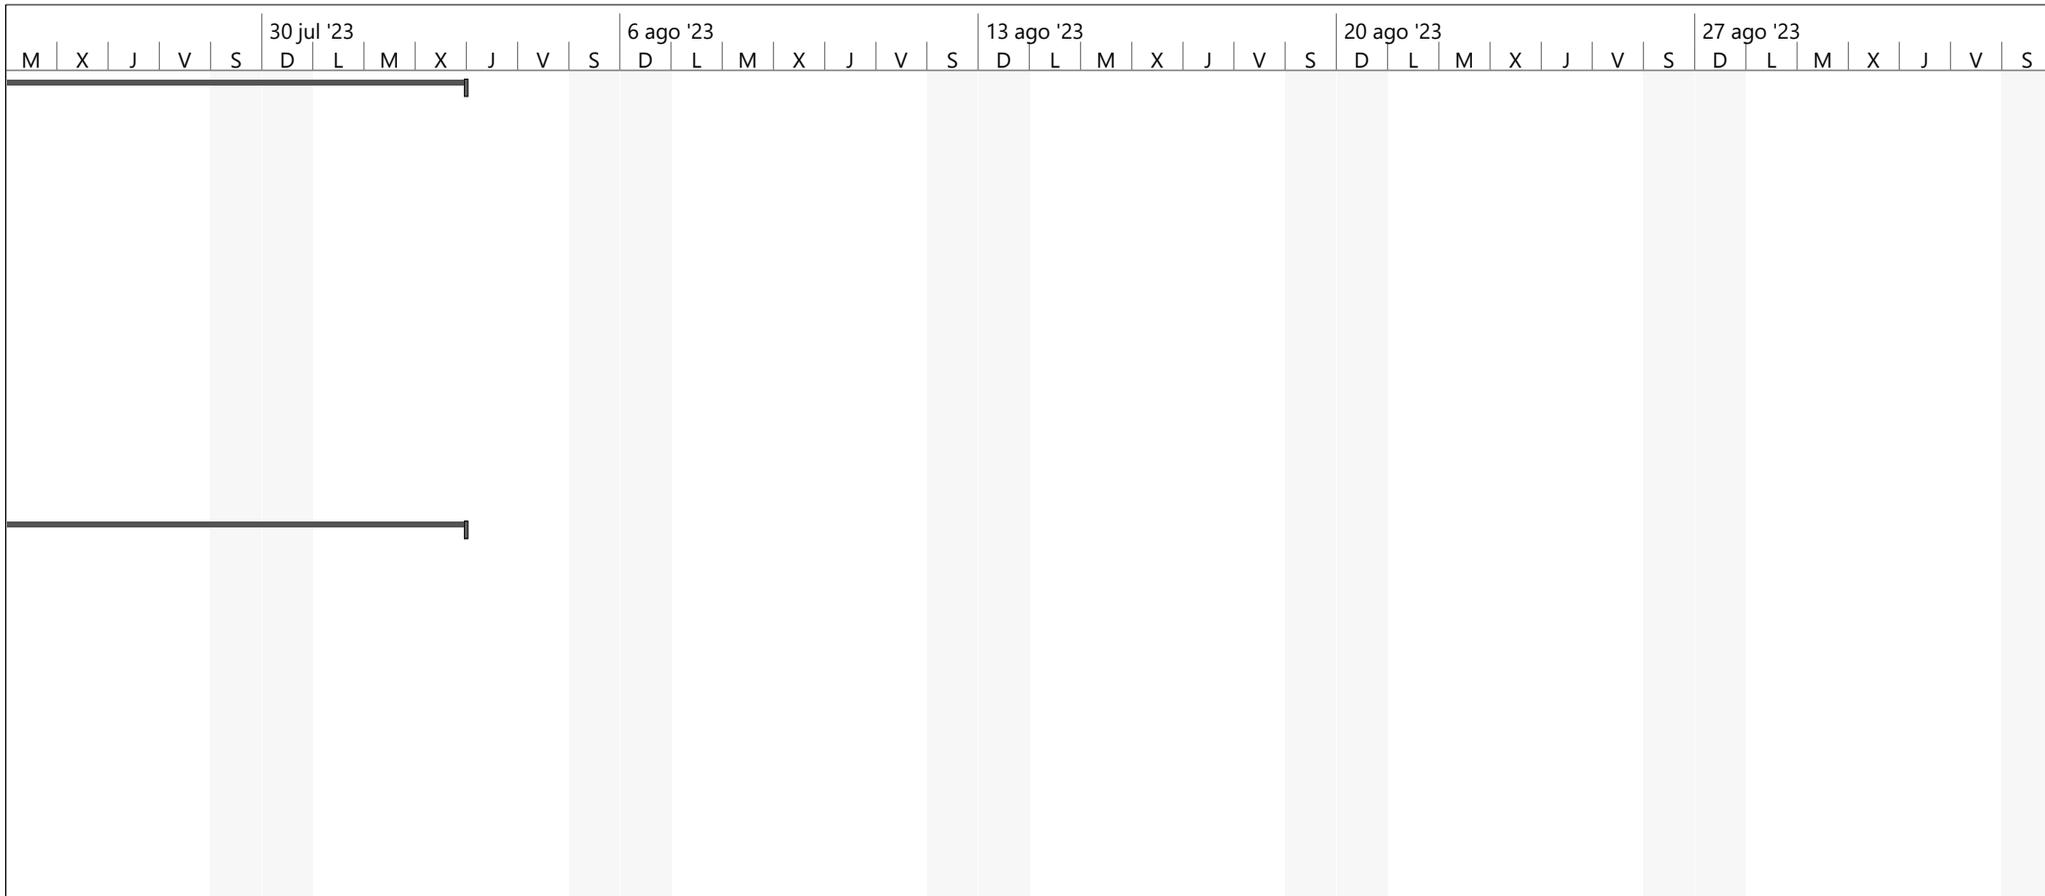


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

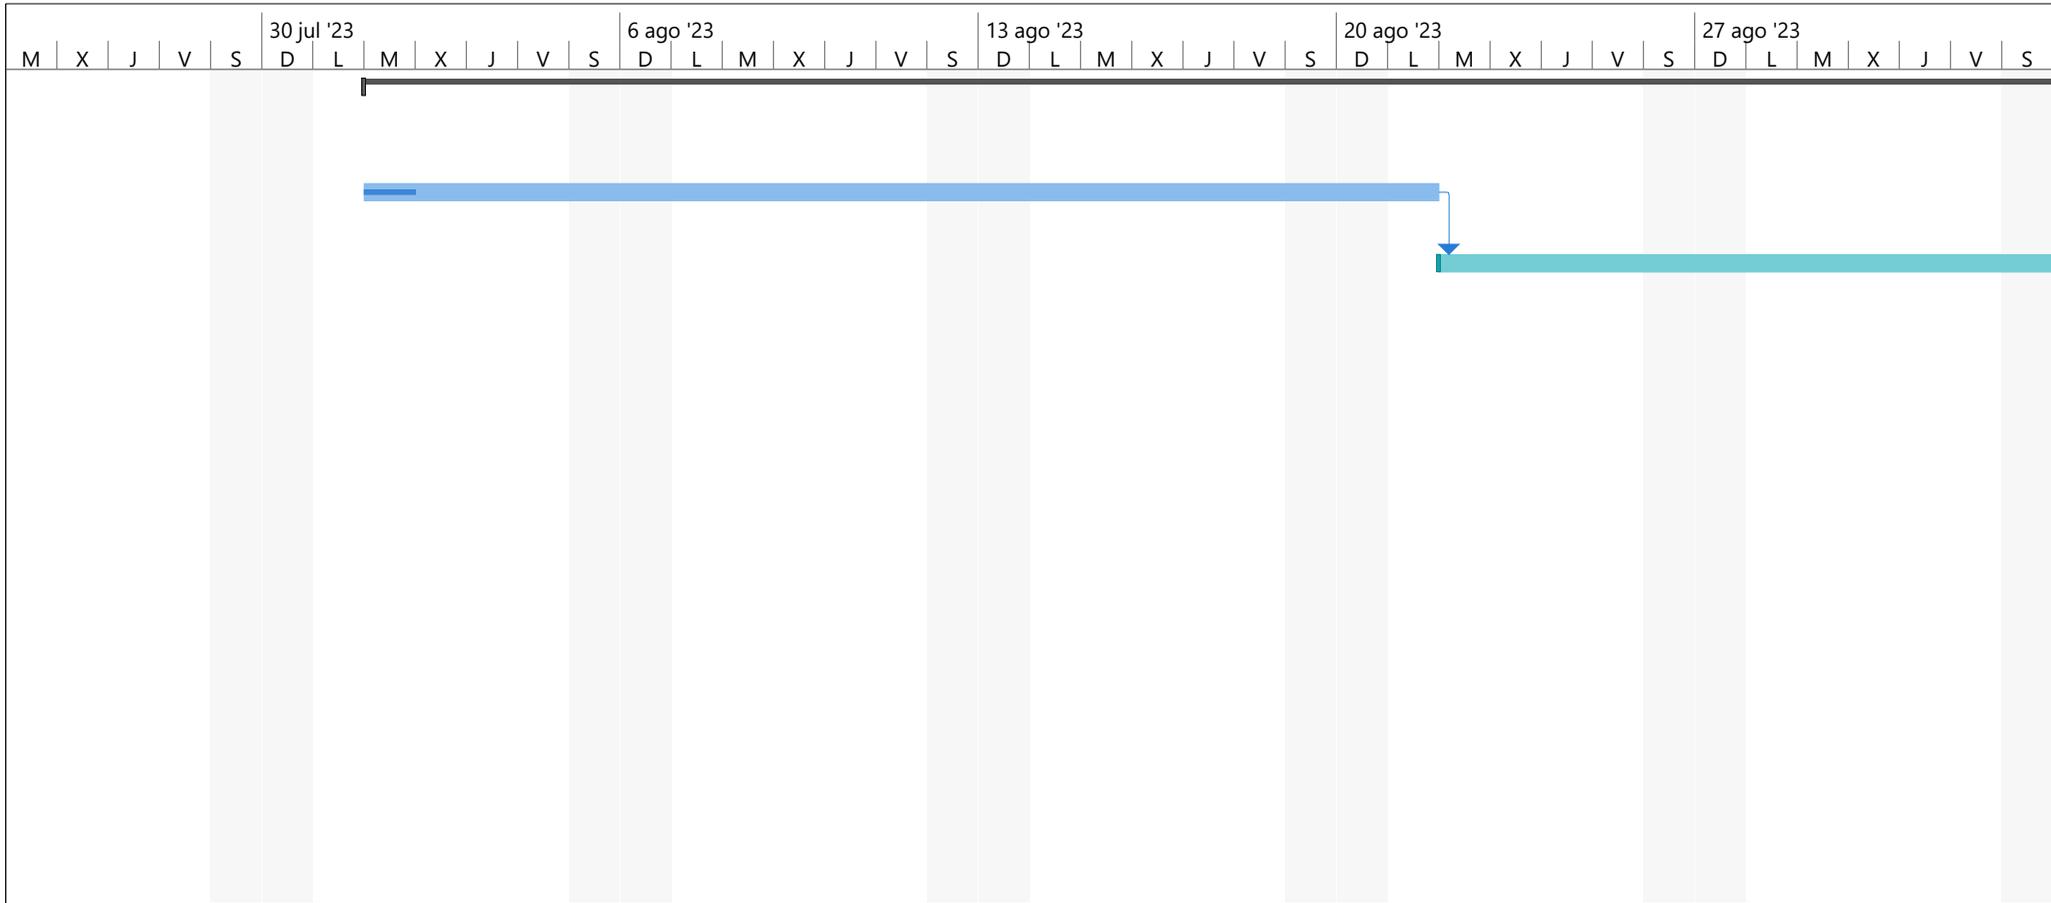

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

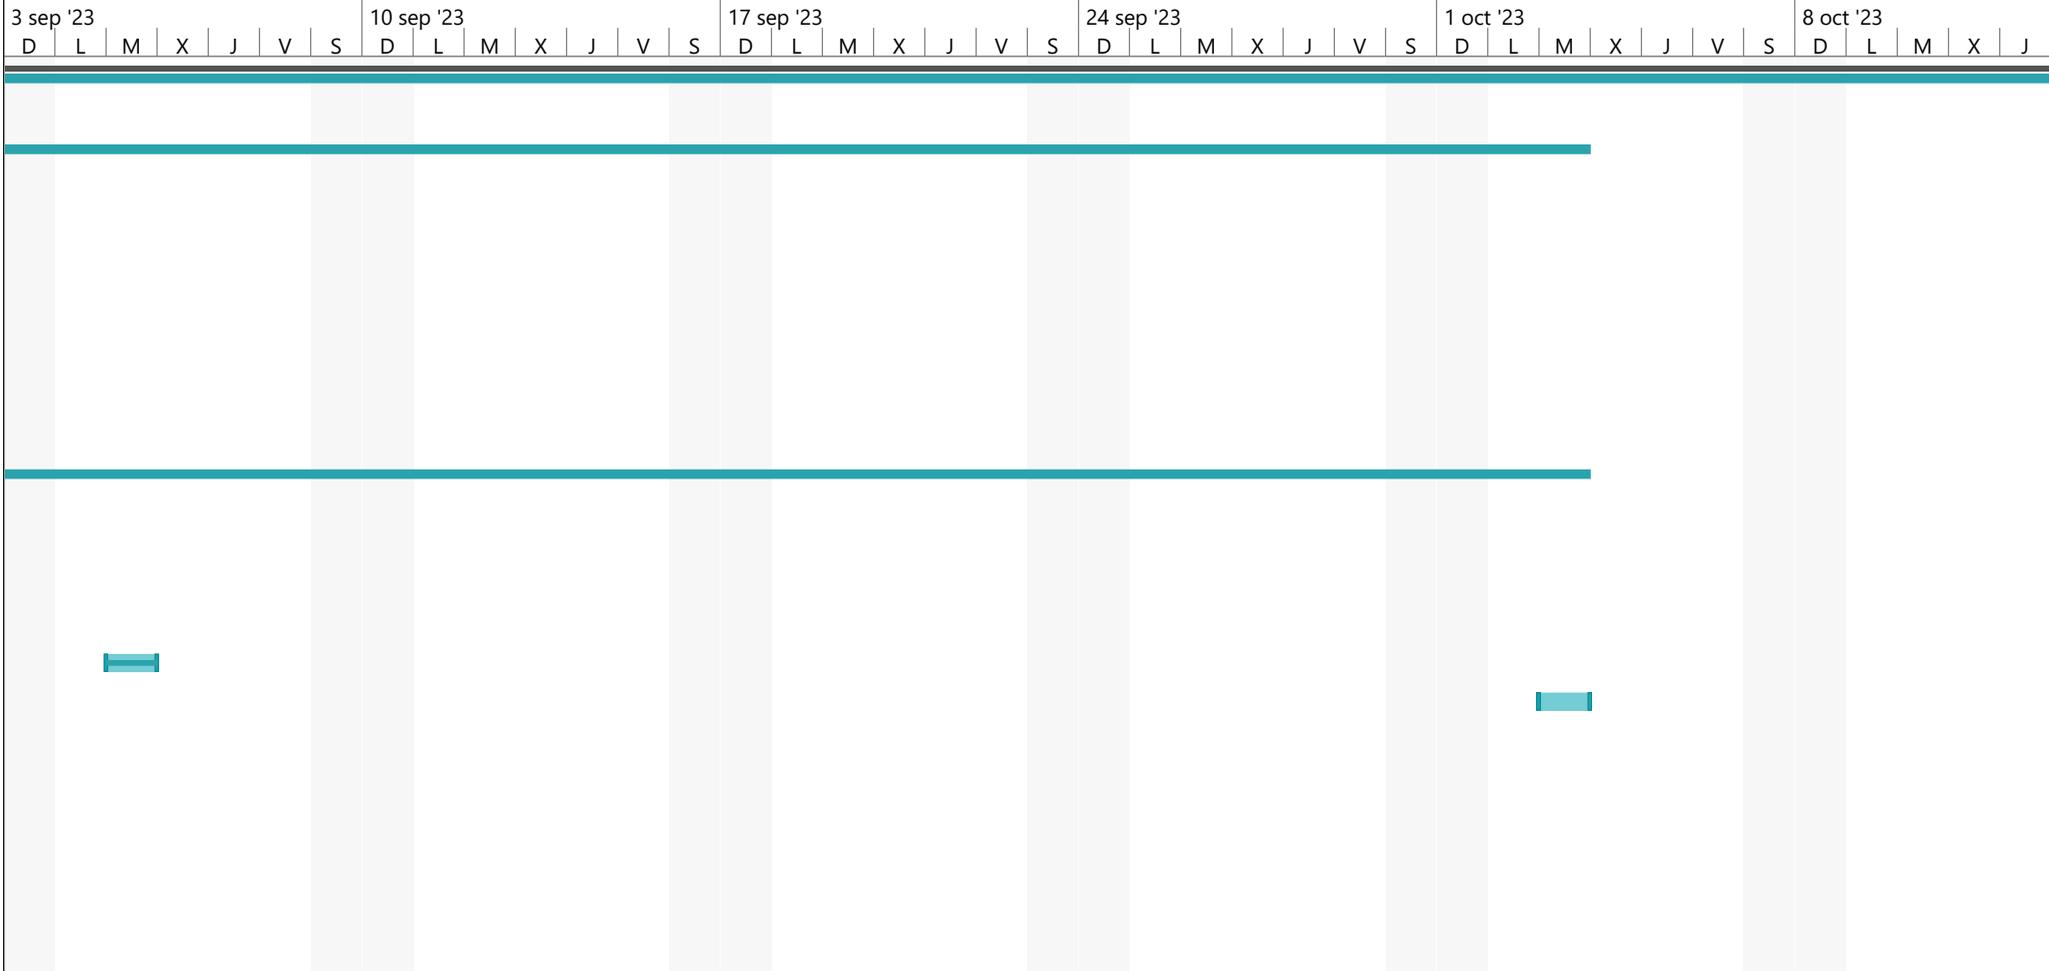


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R Fecha: mié 26/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

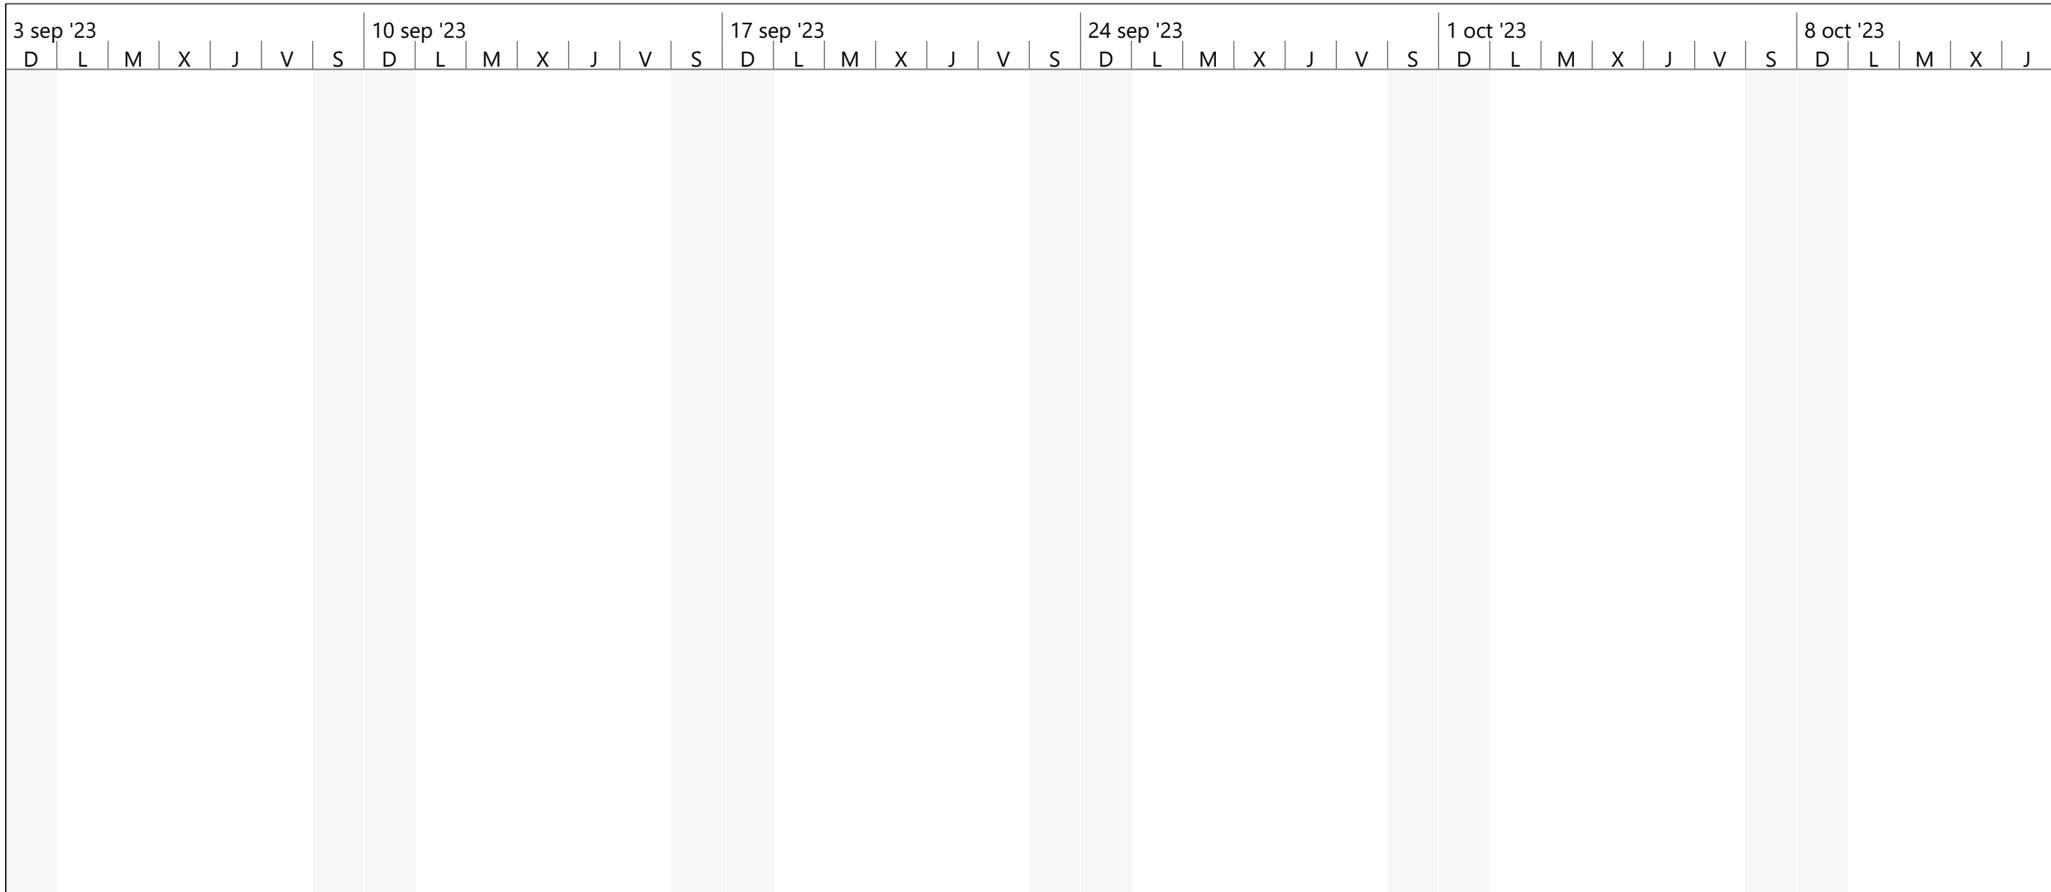

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R Fecha: mié 26/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R Fecha: mié 26/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

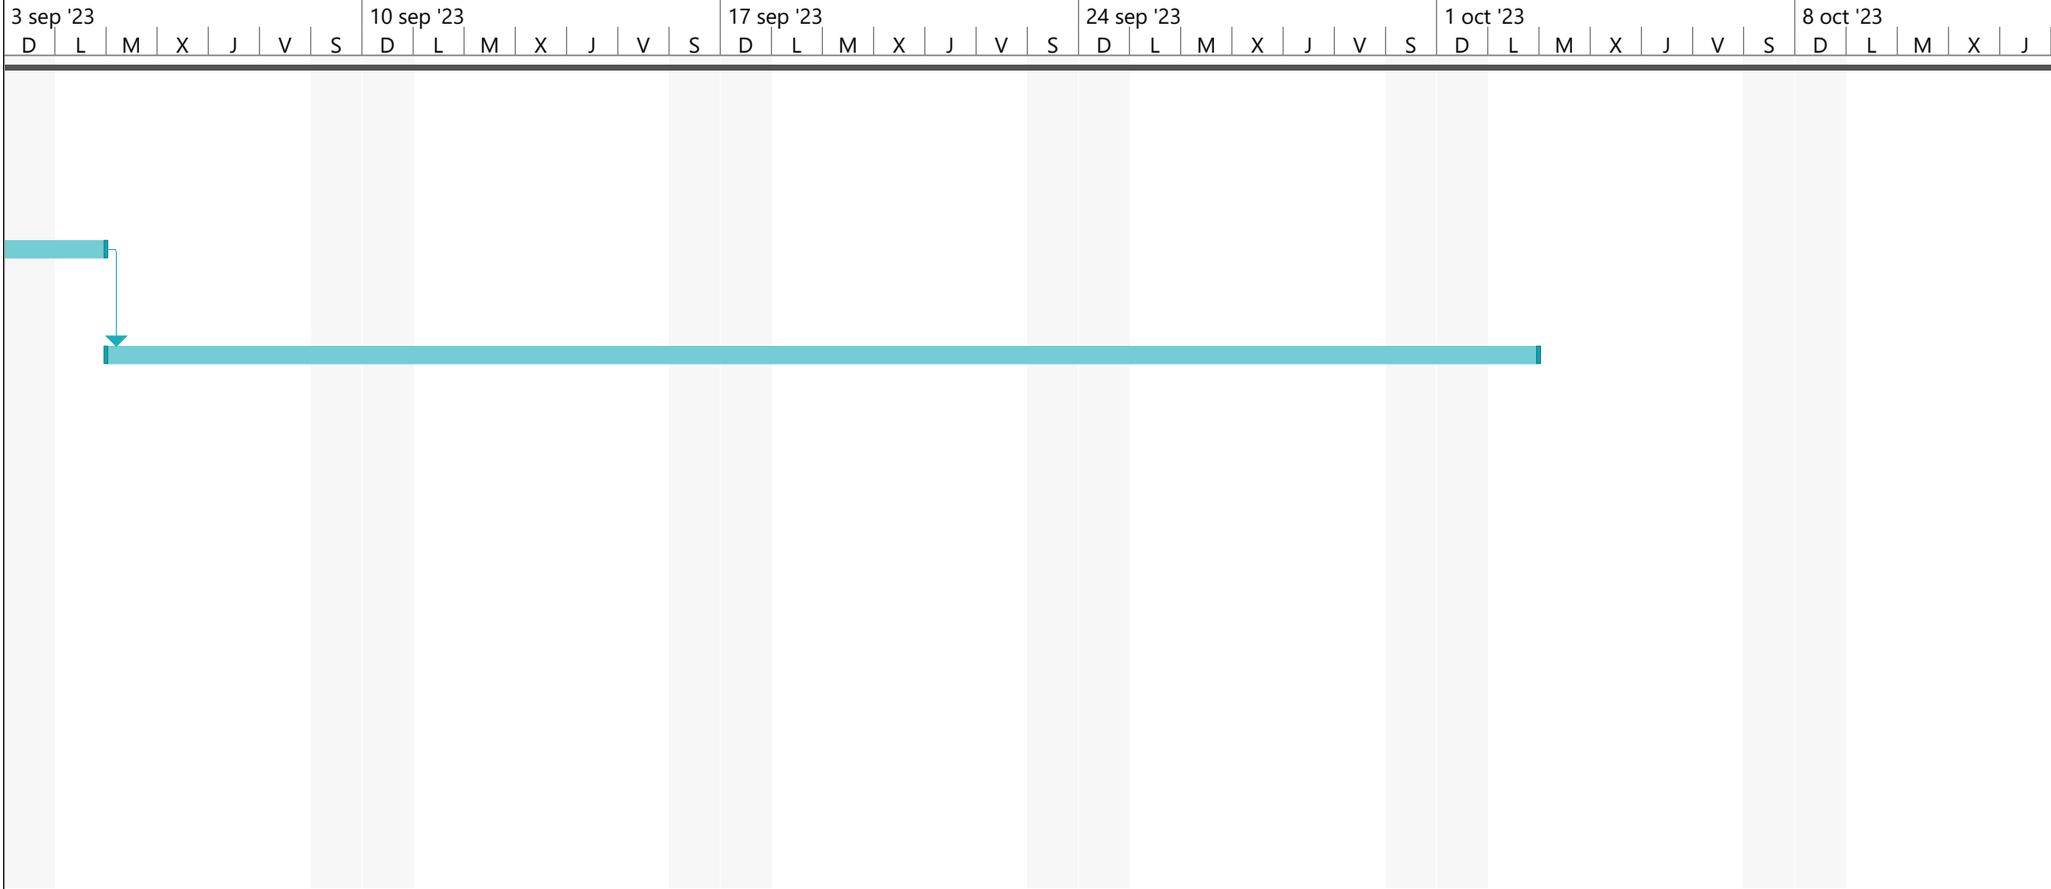

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

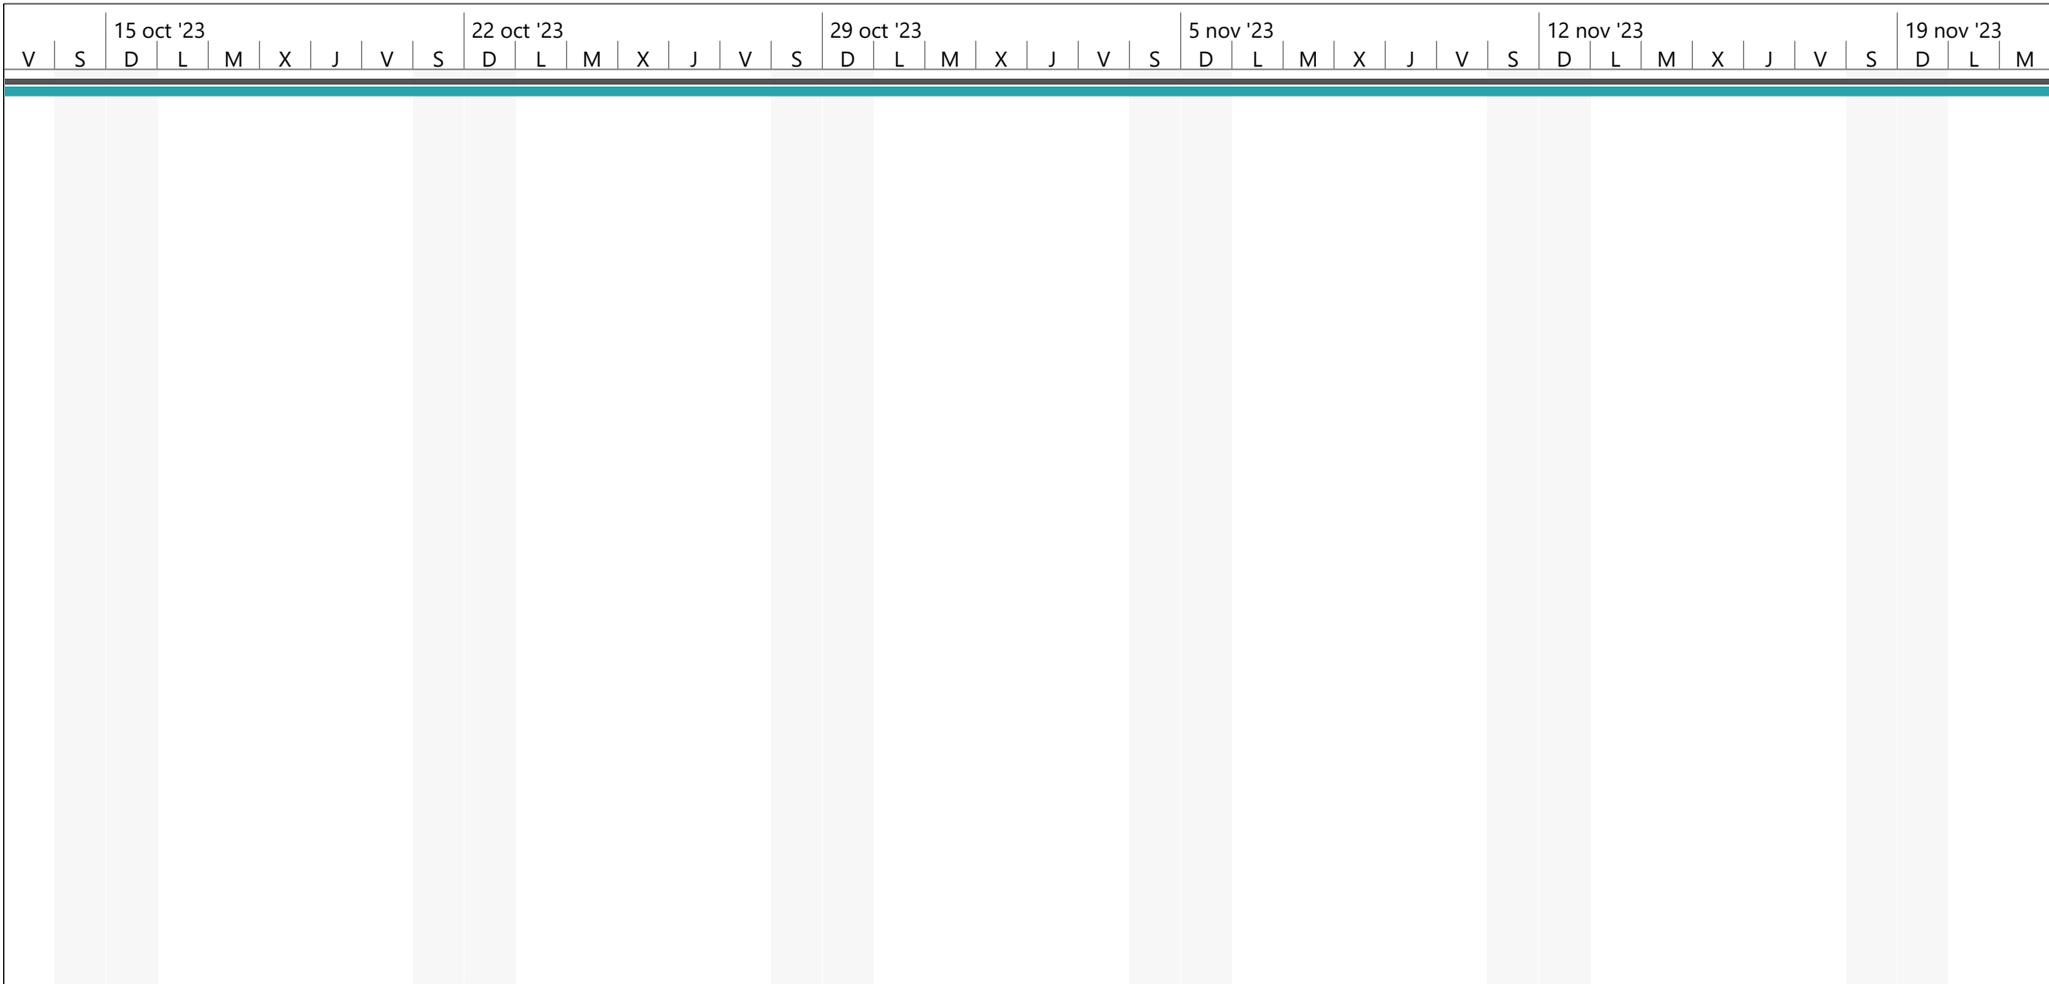


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

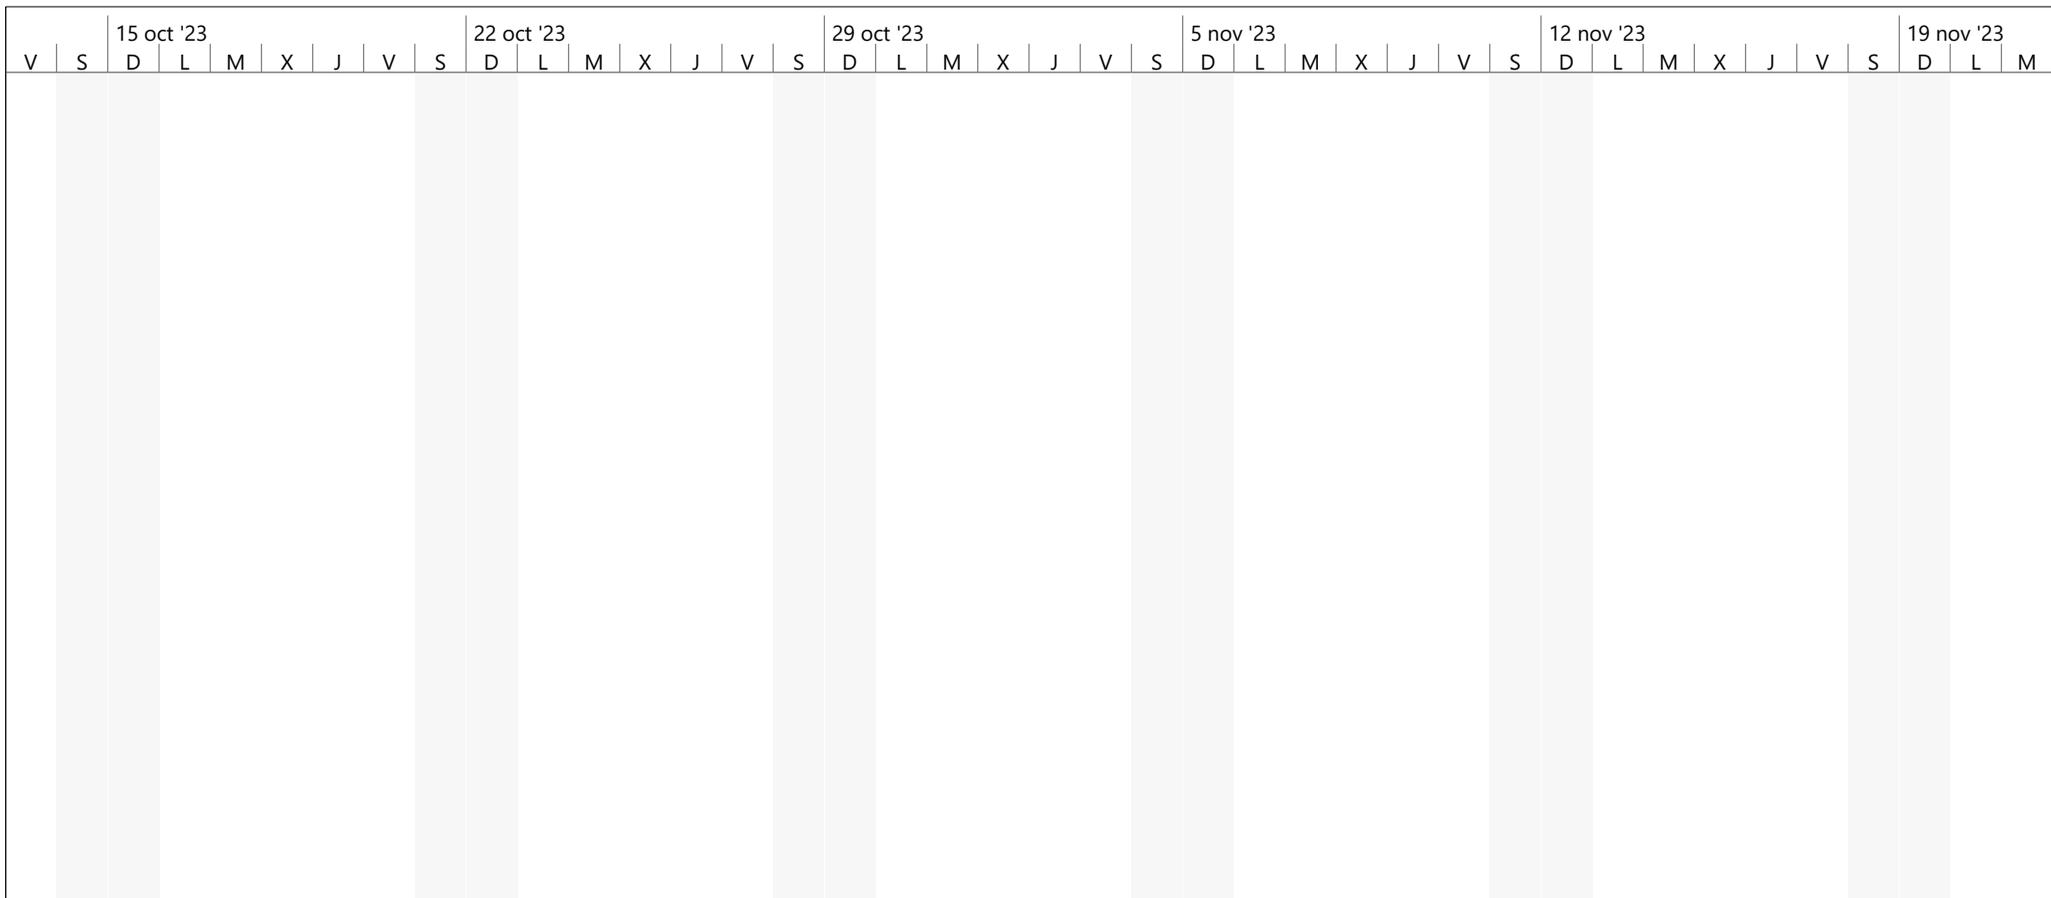


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R Fecha: mié 26/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

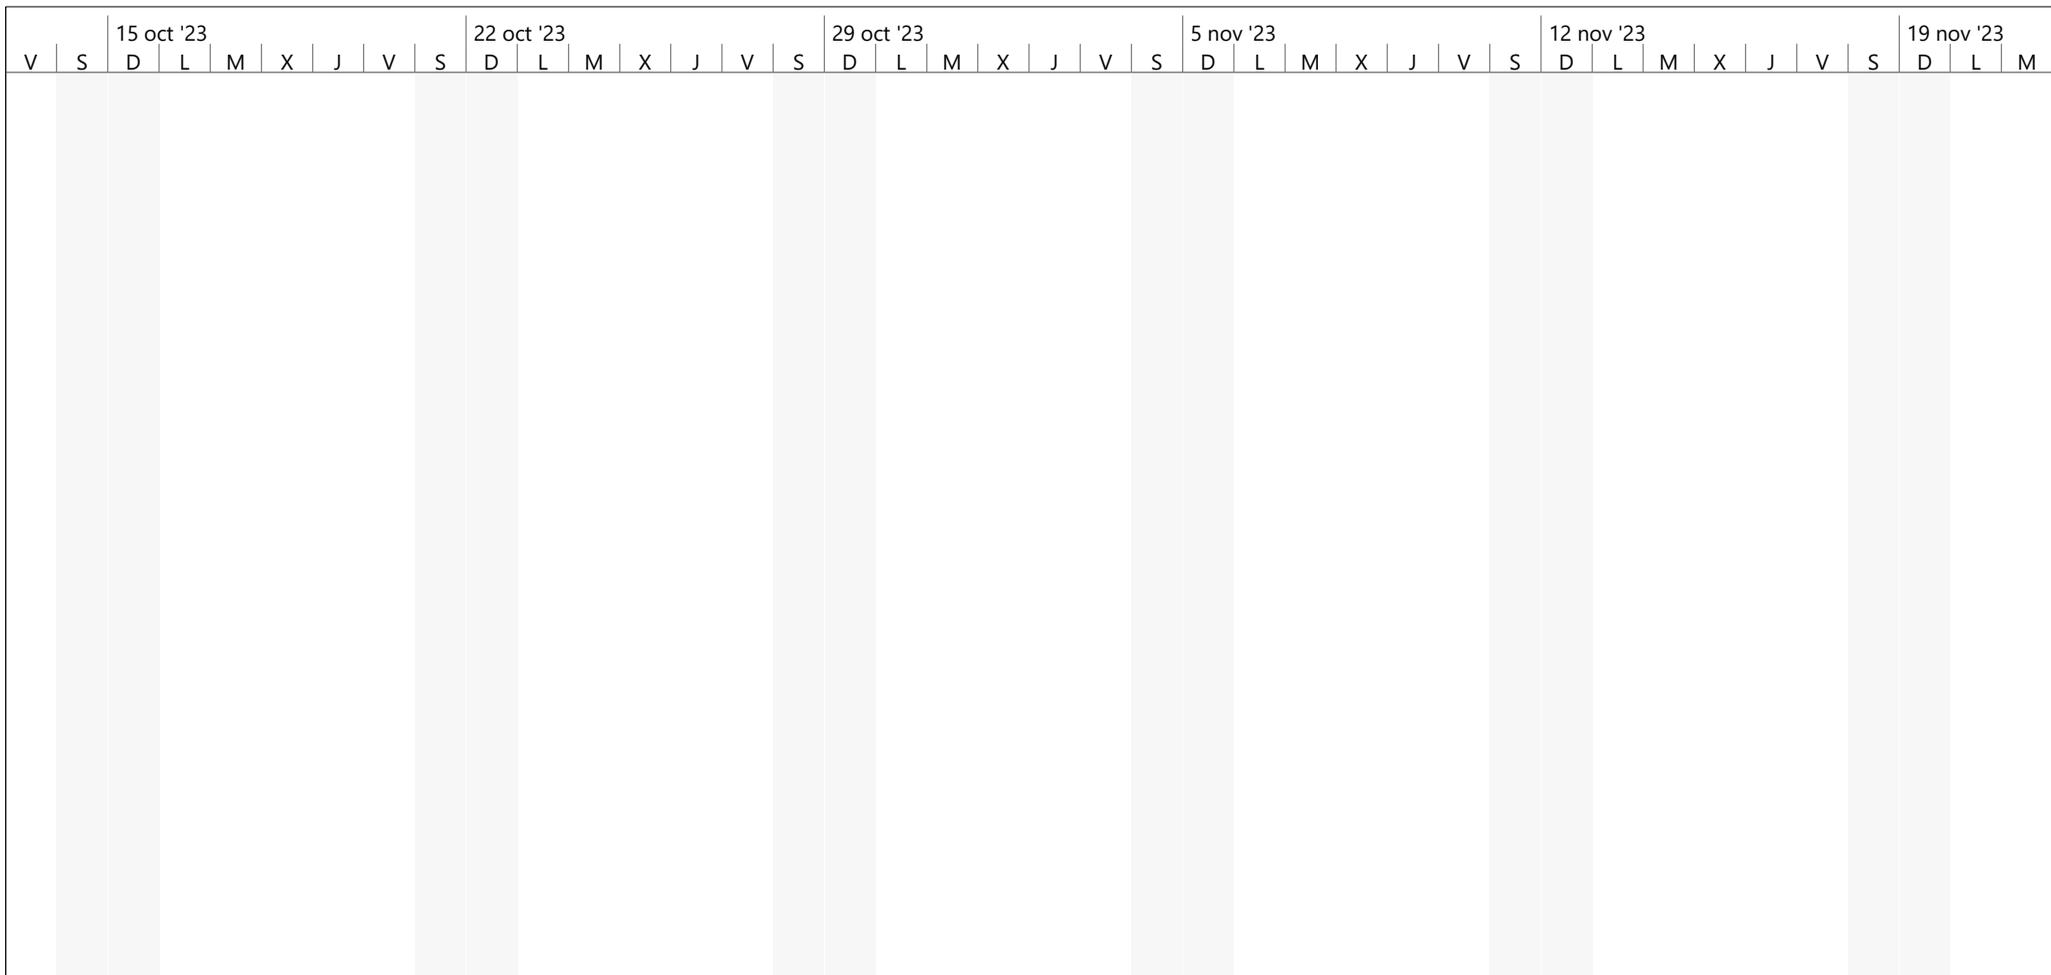


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

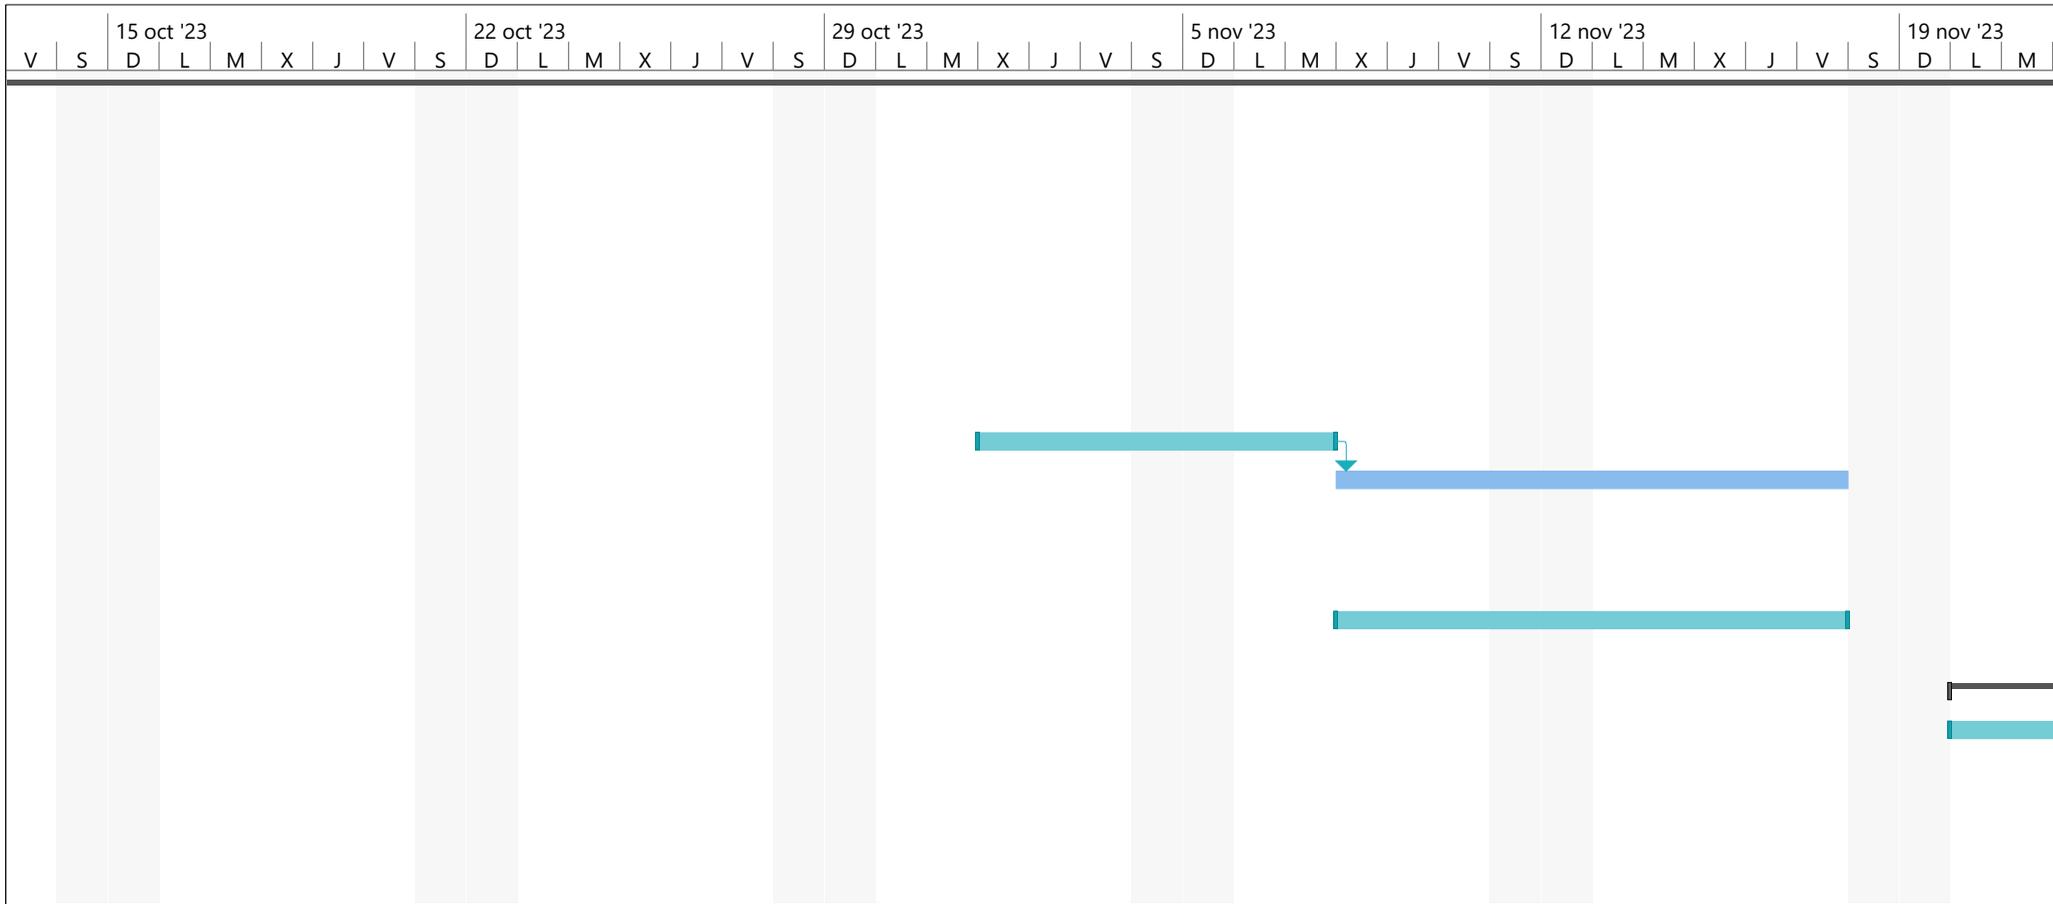


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R Fecha: mié 26/04/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

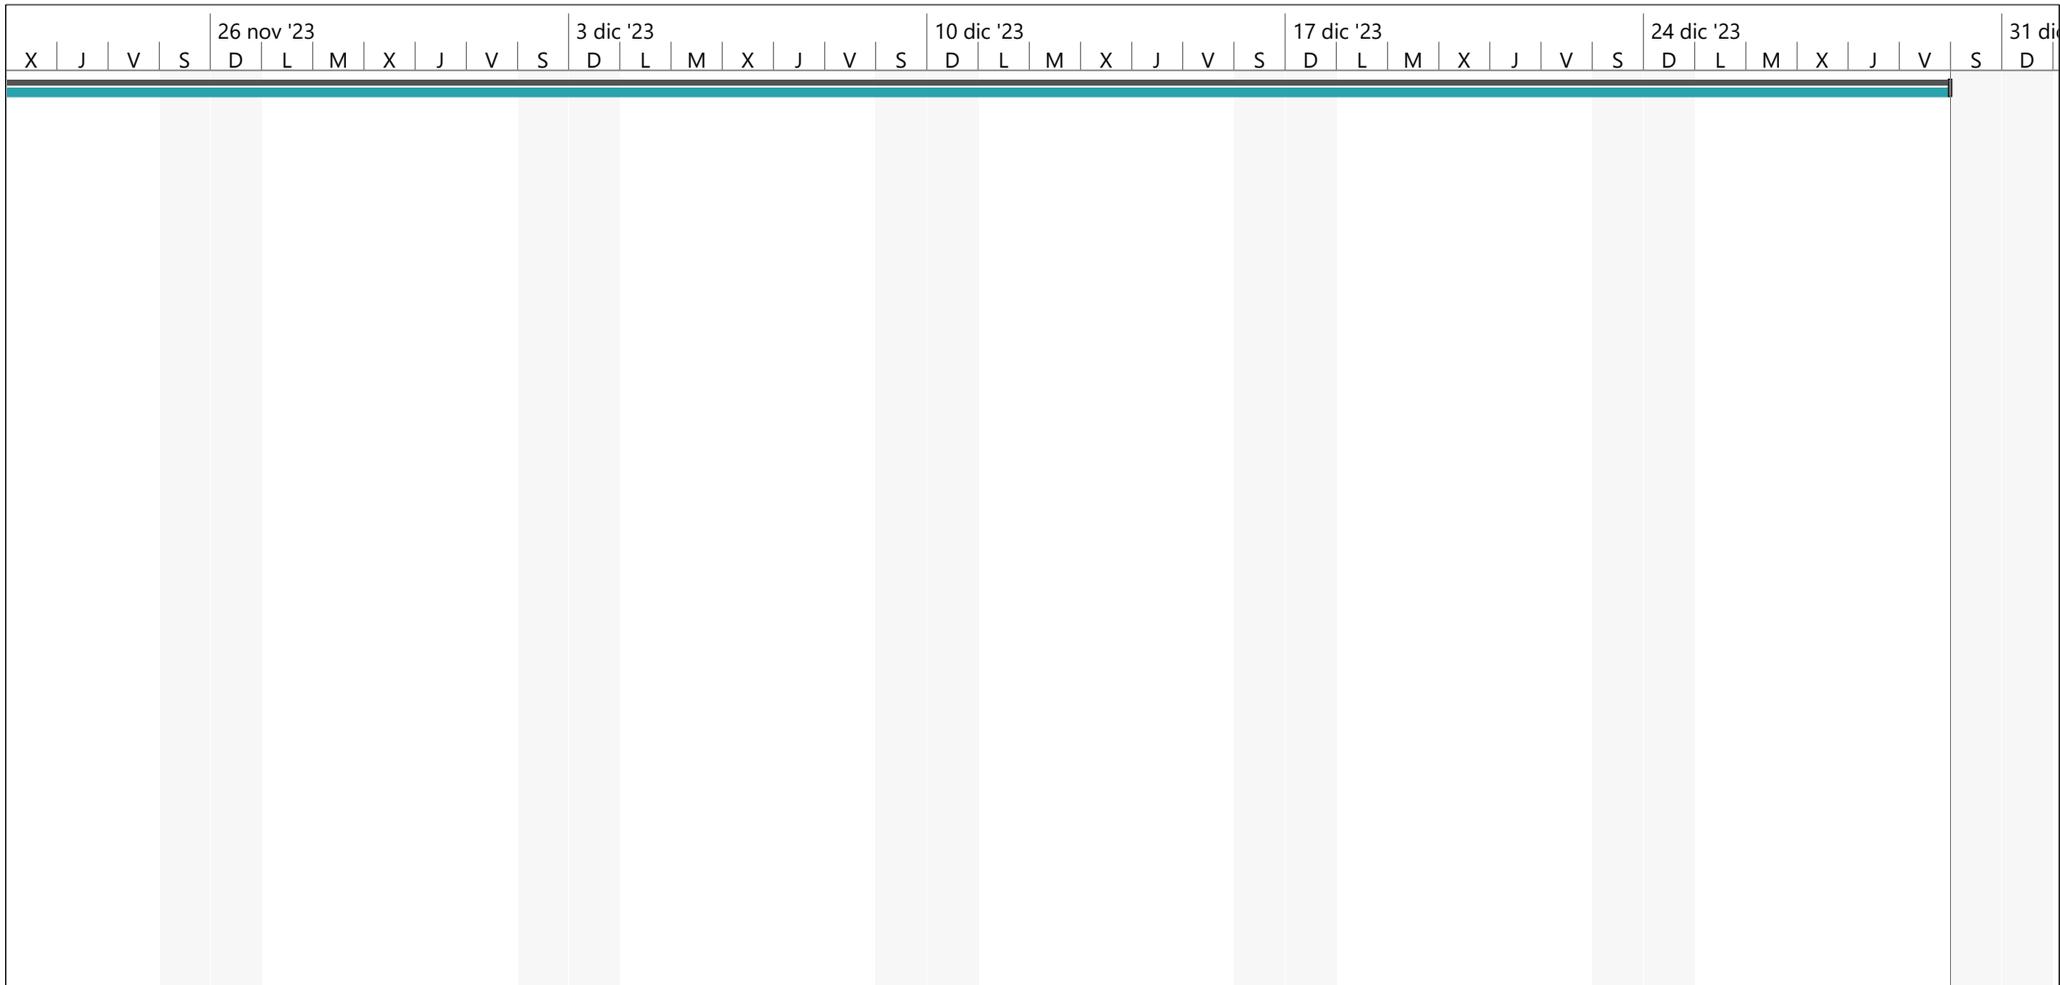


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

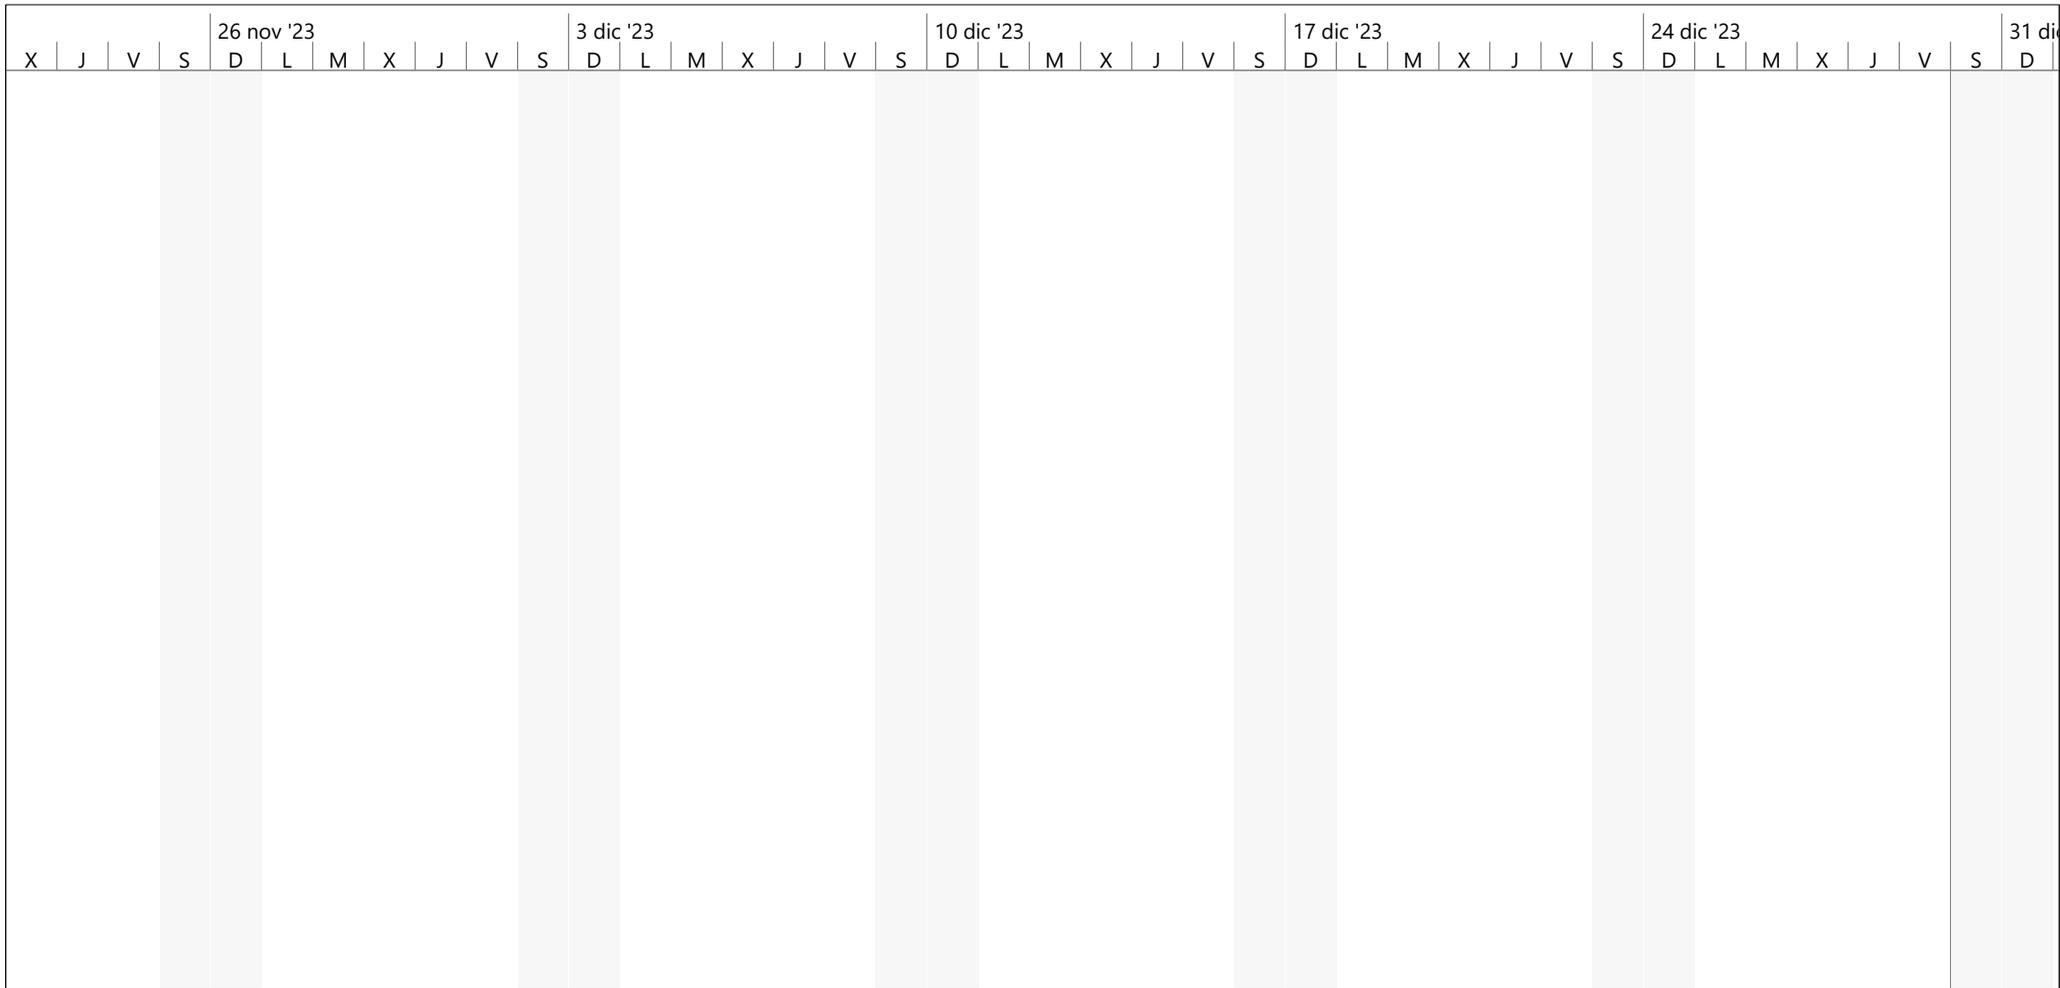


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

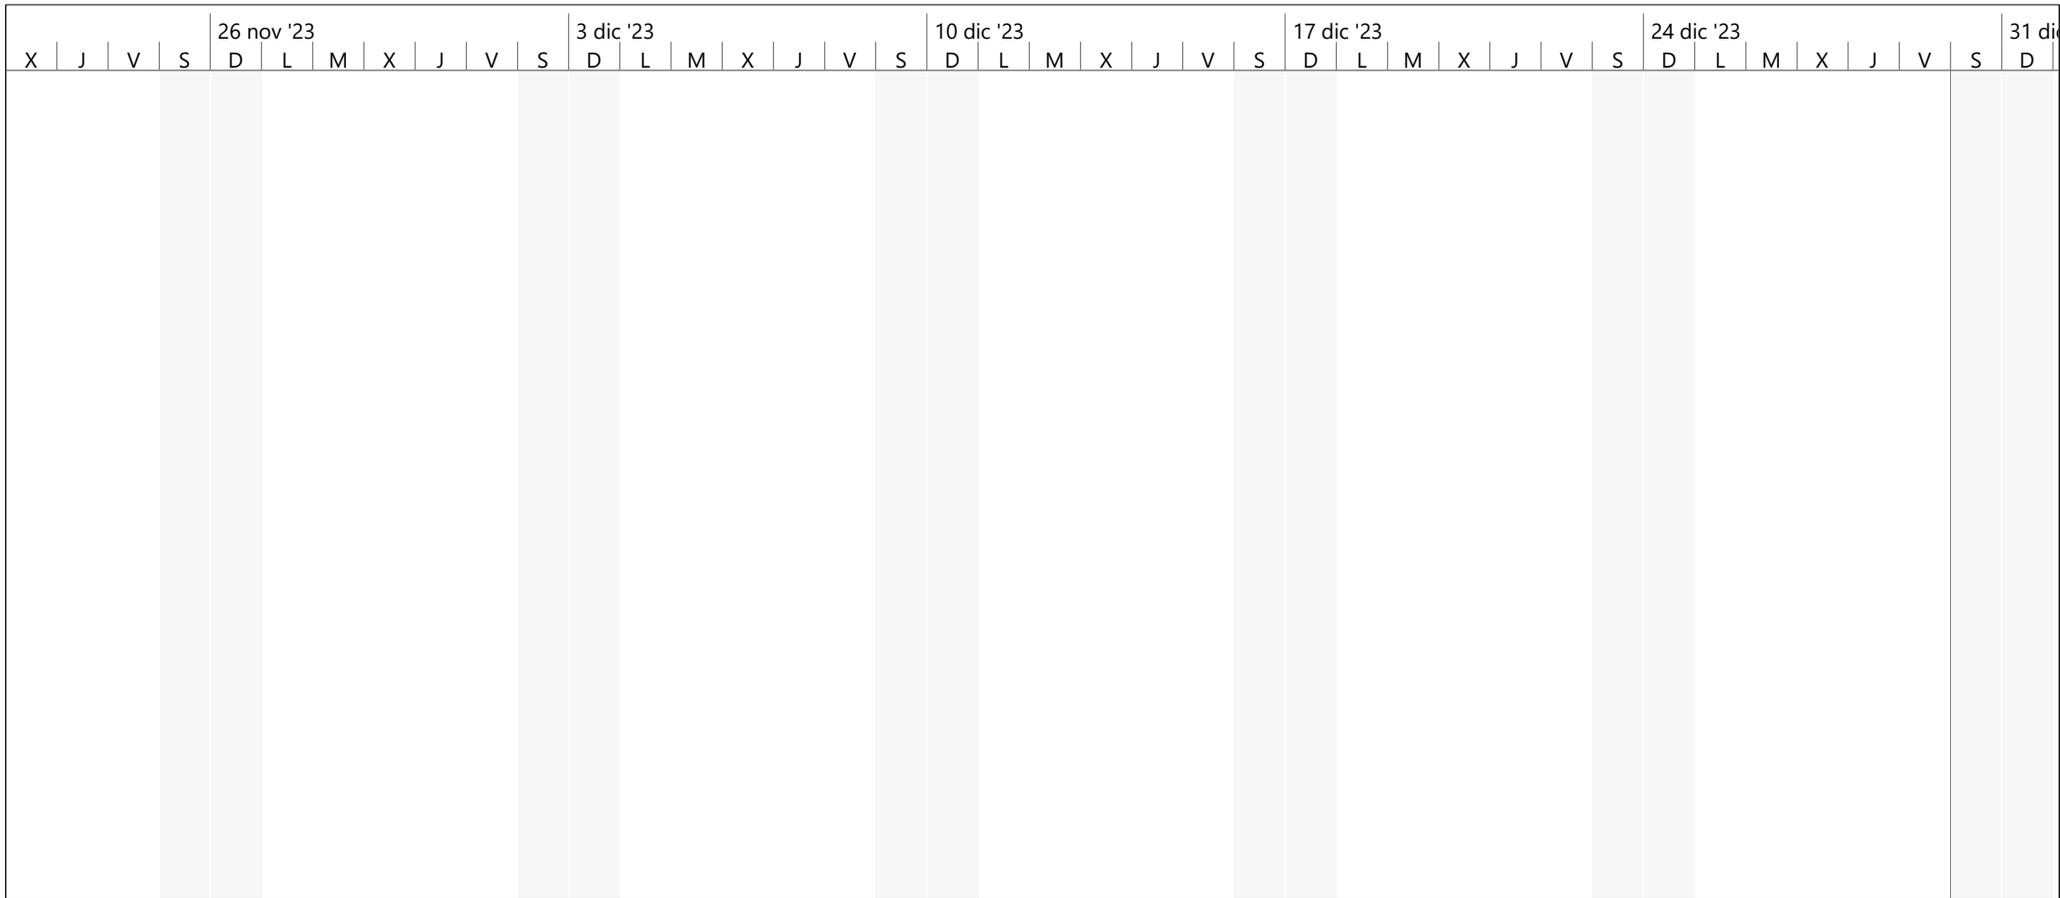


Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

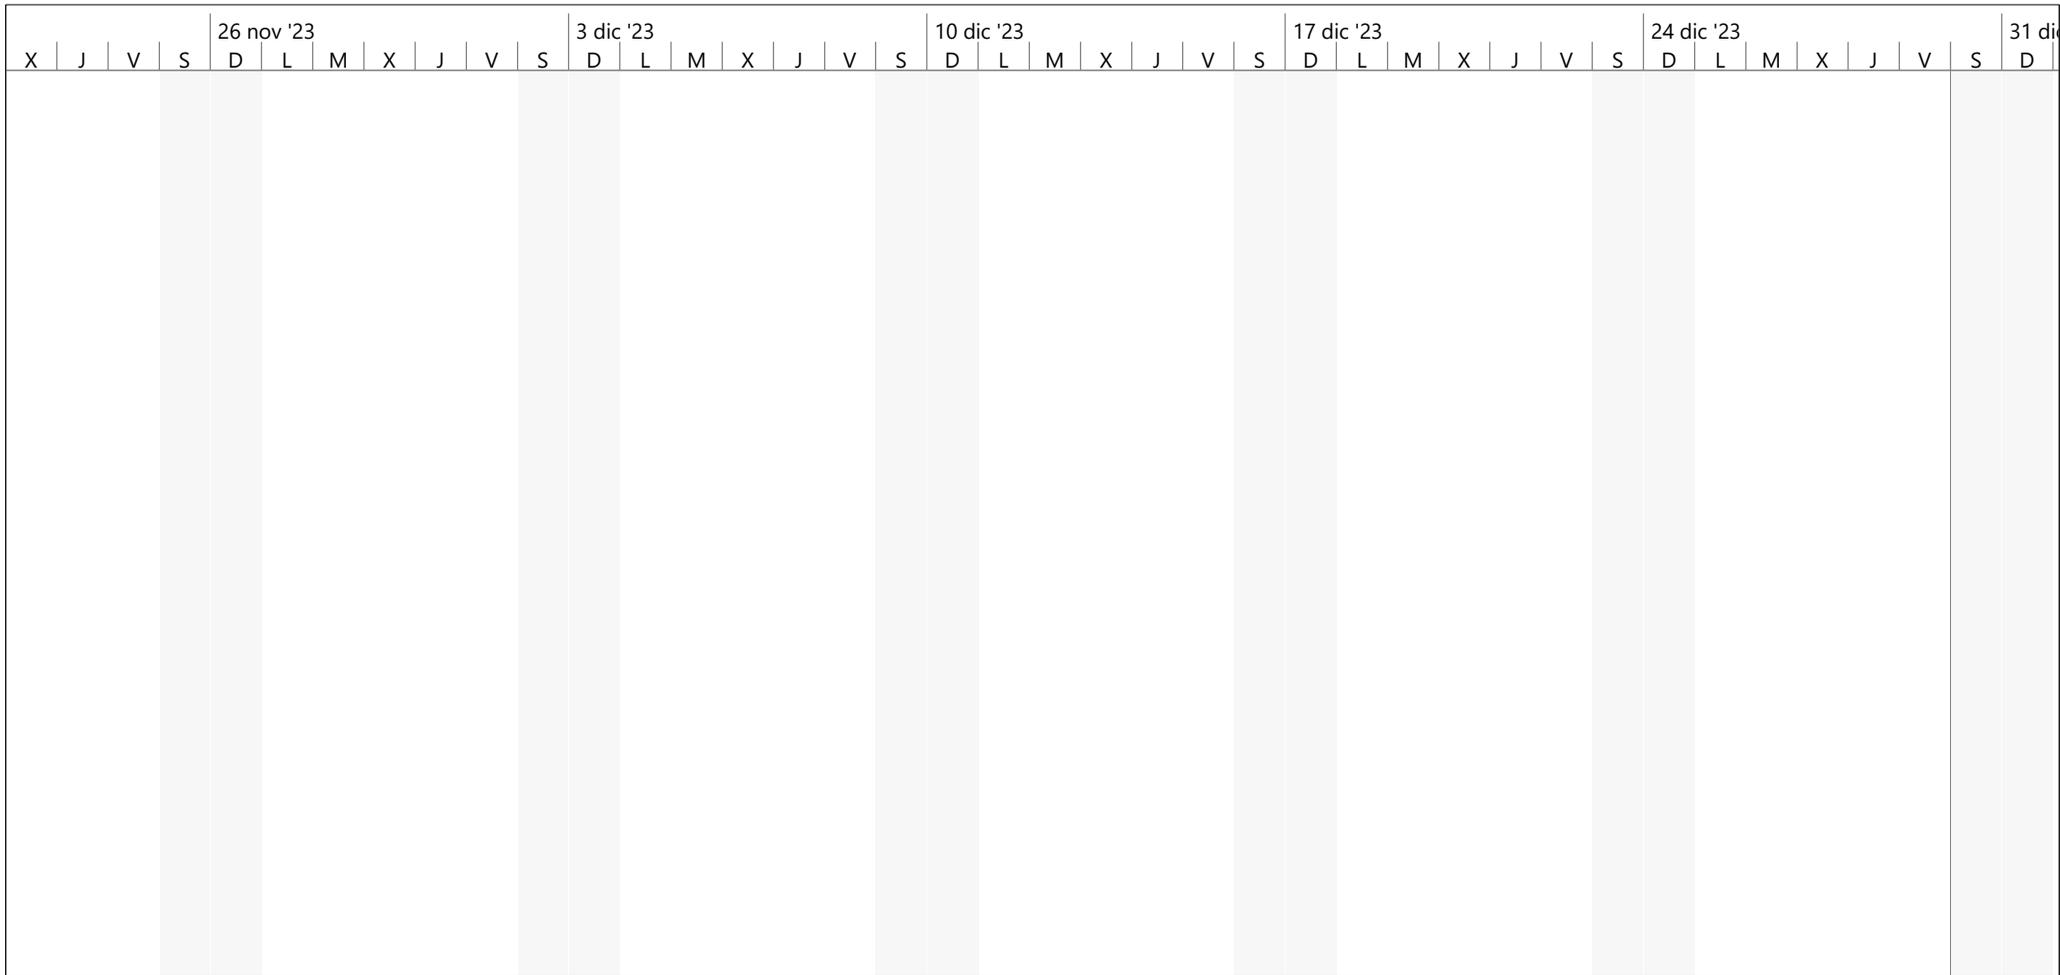

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

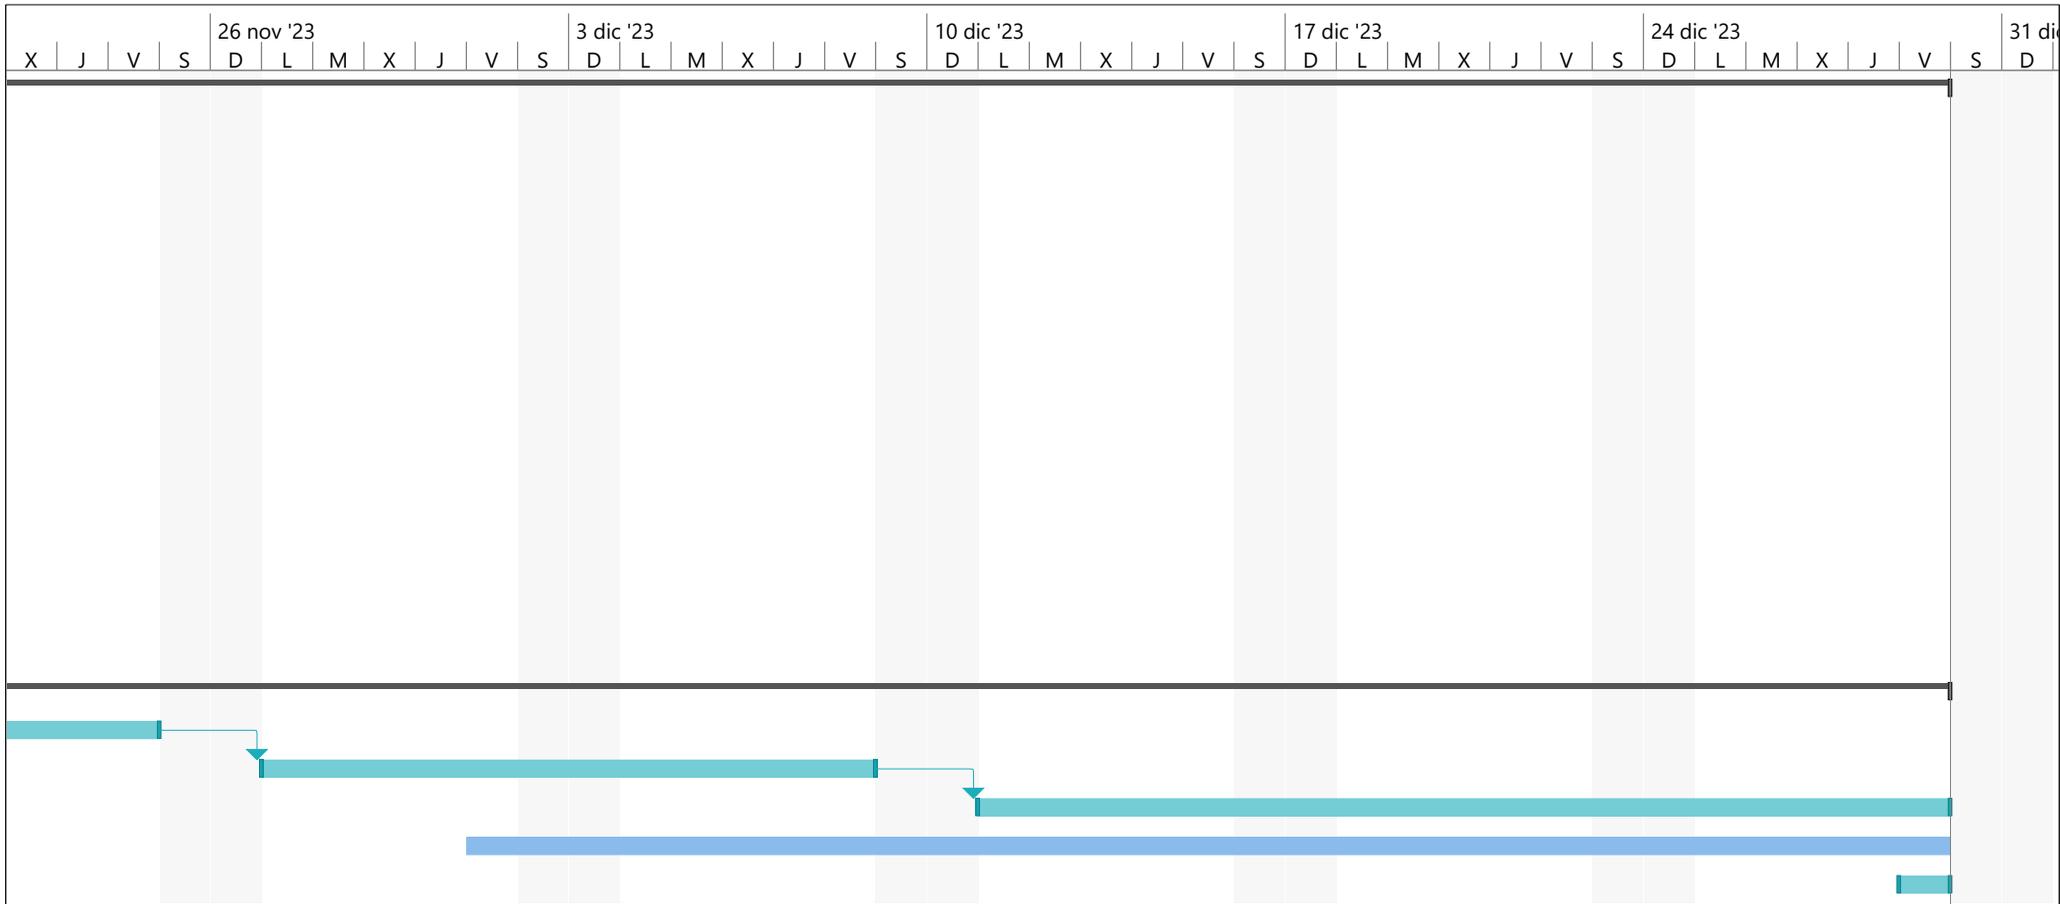

Proyecto: Plan de Trabajo - PMI R  
 Fecha: mié 26/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			
